Lộ trình một công trình từ đầu đến bàn giao

Thủ Thiêm Workflow · Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho nhân sự công trình · 16/10/2026 · Bổ sung xuất tám biểu mẫu BMGS

Bản này giữ hướng dẫn quy trình và ảnh tham chiếu của bản 25/09/2026, bổ sung thao tác xuất báo cáo ngay tại hồ sơ đang làm. Bản cũ được giữ riêng. Ảnh bổ sung là ảnh đã nghiệm thu trên môi trường Development ngày 12-13/10/2026; không phải ảnh chụp mới hoặc hồ sơ công trường thật.

Mục lục

Cấp	Tiêu đề	Trang
Tiêu đề	**Lộ trình một công trình từ đầu đến bàn giao**	1
Chính	**1. Cách dùng tài liệu**	4
Phụ	1.1. Tra cứu nhanh tám biểu mẫu và nguyên tắc xuất	5
Chính	**2. Đăng nhập và đổi mật khẩu lần đầu**	6
Chính	**3. Tạo công trình mới - ba bước**	9
Chính	**4. Đọc Quy trình trong chi tiết công trình**	12
Phụ	4.1. Ma trận điều phối theo Giai đoạn	14
Chính	**5. Trao đổi là bàn điều phối hằng ngày**	15
Phụ	5.1. Ví dụ đã ghi nhận trên công trình Rev9 tại màn Trao đổi	18
Phụ	5.2. Nội dung trao đổi khi phát sinh việc ở các Giai đoạn tiếp theo	46
Chính	**6. Xử lý việc ưu tiên và lặp cho đến hết nhánh Quy trình**	46
Phụ	6.1. Các Gói công việc trong mẫu bản 9	50
Phụ	6.2. Khảo sát/đo hiện trạng: xuất BM-GS-01	51
Phụ	6.3. Rủi ro khảo sát/thi công: xuất BM-GS-05	54
Phụ	6.4. Minh chứng của Đầu việc: xuất BM-GS-07	57
Phụ	6.5. BOQ có thiết kế: bản vẽ, khối lượng và giá	59
Phụ	6.6. Hợp đồng chủ đầu tư và hợp đồng đầu vào	66
Phụ	6.7. Mua sắm: từ BOQ, báo giá tới hàng đã nhận	79
Phụ	6.8. Lấy vật tư: kiểm kho trước, mua phần còn thiếu	88
Chính	**7. Rà soát lại và phê duyệt: nói đúng tầng quyết định**	92
Chính	**8. Thi công: Nhật ký › Kiểm tra › Cần xử lý**	93
Phụ	8.1. Báo cáo ngày: xuất BM-GS-02 từ hồ sơ đang làm	98
Phụ	8.2. Báo cáo đã gửi: xuất đúng lần gửi cũ của BM-GS-02	104
Phụ	8.3. Cần xử lý: xuất BM-GS-04 từ danh sách và chi tiết	107

Cấp	Tiêu đề	Trang
Phụ	8.4. Kế hoạch/chỉ dẫn hiện trường: xuất BM-GS-06	111
Chính	**9. Nghiệm thu: từ kết quả hiện trường đến biên bản**	114
Phụ	9.1. Gói nghiệm thu thầu phụ: xuất BM-GS-03	117
Chính	**10. Bàn giao: xác nhận công trình đã đủ điều kiện**	120
Phụ	10.1. Hồ sơ bàn giao: xuất BM-GS-08	123
Chính	**11. Bàn giao kế toán: chuyển hồ sơ nguồn và xác nhận tiếp nhận**	126
Chính	**12. Câu hỏi thường gặp**	129

Số trang trong mục lục tương ứng với bản PDF in kèm tài liệu.

1. Cách dùng tài liệu

Tài liệu giúp từng nhân sự xác định ở mỗi chặng: **ai đang làm**, **cần hoàn thành hồ sơ nào**, và **ai xác nhận để chuyển tiếp**. Công trình tham chiếu được tạo trên giao diện là DEMO-R9-20260925 - **[DEMO] Lộ trình công trình bản 9**; người phụ trách là Nguyễn Minh PM. Mẫu đã chọn là **[Client] Workflow hoàn thiện công trình chính thức · revision 9**. Ảnh màn hình được chụp trực tiếp từ phần mềm. Riêng ảnh hiện trạng và PDF biên bản đưa vào công trình là **tài liệu mô phỏng có nhãn [DEMO]**, không phải hồ sơ hiện trường thật. Ảnh có giao dịch hoàn tất thuộc công trình mẫu khác được ghi rõ.

Tên vai trò dùng trong bảng: PM là Quản lý dự án; QS là Kỹ sư khối lượng; QA/QC là người phụ trách chất lượng; Bộ phận HĐ là Bộ phận Hợp đồng. Khi giao việc hoặc ghi ý kiến trên hồ sơ, dùng tên vai trò đầy đủ để tránh nhầm người chịu trách nhiệm.

Điều cần phân biệt	Cách hiểu và áp dụng
Công trình mới	Đã tạo bằng ba bước trên giao diện, chọn **mẫu quy trình bản 9**, lưu 11 thành viên, đủ 8/8 vai trò quy trình, giao Nguyễn Minh PM và chọn **Bắt đầu quy trình**. Đã hoàn tất Giai đoạn 01, 02, 03, 04 và 06; PM chọn **Có thiết kế**, nên Giai đoạn 05 được bỏ qua. Tiến độ **7/20 Gói công việc**, đang ở **07 Hợp đồng chủ đầu tư**.
Ảnh tạo công trình, Tổng quan, Quy trình, Trao đổi, BOQ và Mua sắm	Chụp đúng công trình DEMO-R9-20260925. Trao đổi có tin PM, Giám đốc, Kế toán, Giám sát, Thiết kế, QS và Bộ phận HĐ xen với cập nhật hồ sơ thật trên phần mềm. BOQ, báo giá và yêu cầu mua là **dữ liệu mô phỏng có nhãn [DEMO]** trong chính công trình này; chưa có vật tư giao hoặc thanh toán thật.
Ảnh rà soát/phê duyệt	Ảnh mới của công trình Rev9 cho thấy **Giám sát Cao Nhất Hiệp duyệt Khảo sát** và **QS Trần Hà duyệt Họp báo cáo khảo sát**, mỗi lần đều có ý kiến ghi rõ điều kiện cần đối chiếu. PM chuyển Giai đoạn bằng thao tác riêng sau khi duyệt. Ảnh vùng quyết định Đầu việc mẫu ở phần sau vẫn thuộc công trình khác.
Ảnh Hợp đồng và các chặng sau	Ảnh Giai đoạn 07, hợp đồng nháp và trao đổi rà soát là của công trình Rev9. Ảnh **Hợp đồng đã ký/đang hiệu lực**, **Thi công**, **Nghiệm thu**, **Bàn giao**, **Bàn giao kế toán** lấy từ công trình mẫu GOLDEN-REAL-001 để giải thích thao tác; **không phải kết quả đã làm trên công trình Rev9**. Hồ sơ hợp đồng cũ trên ảnh vẫn cảnh báo thiếu bản chụp đã ký theo điều kiện hiện hành.
15 Giai đoạn, 21 Gói công việc	21 là số gói được khai báo. Công trình này chọn **Có thiết kế**; Giai đoạn 05 BOQ không thiết kế và một gói tương ứng được bỏ qua, nên mẫu đang hiển thị **20 gói trong nhánh đã chọn**.
"Nhật ký"	Lịch sử thao tác được ghi từ hành động của người dùng. Không cần lập một nhật ký duyệt riêng cho Nghiệm thu, Bàn giao hay Bàn giao kế toán. Nhật ký thi công là hồ sơ hiện trường riêng.

Trước khi thao tác: mở đúng công trình; chuẩn bị hồ sơ, ảnh và tài khoản cá nhân theo vai trò PM, Giám sát, QS, Thiết kế, Mua hàng, Bộ phận HĐ, QA/QC, Kế toán và người duyệt. Trên công trình tham chiếu DEMO-R9-20260925, PM đã chọn nhánh **Có thiết kế** trong biên bản họp. Việc tạo công trình dùng tài khoản Admin; các việc nghiệp vụ và phê duyệt phải thực hiện bằng đúng tài khoản được giao. Không chia sẻ mật khẩu hoặc ghi mật khẩu vào hồ sơ công trình.

Thứ tự sử dụng: (1) đăng nhập và tạo công trình; (2) xem Quy trình; (3) dùng Trao đổi để điều phối và xử lý việc; (4) lặp lại với mỗi Gói công việc, gắn câu hỏi vào đúng hồ sơ; (5) đối chiếu Hợp đồng, vật tư, Thi công, Nghiệm thu, Bàn giao và Bàn giao kế toán. Công trình tham chiếu hiện ở **Giai đoạn 07 Hợp đồng chủ đầu tư, 7/20 Gói công việc hoàn tất**. Các chặng sau Giai đoạn 07 là hướng dẫn và ảnh tham chiếu từ công trình mẫu, **chưa phải kết quả đã hoàn tất trên công trình Rev9**.

1.1. Tra cứu nhanh tám biểu mẫu và nguyên tắc xuất

Mục đích chính: tìm đúng nút xuất cho hồ sơ đang xử lý. Mở hồ sơ tại tính năng gốc, lưu nội dung rồi chọn nút tương ứng. Hệ thống xác định mẫu và tự lấy dữ liệu, ảnh đã liên kết; không cần chọn lại mẫu, nguồn hoặc tải lại ảnh khi xuất.

Mẫu	Mở hồ sơ và chọn nút	Kết quả cần đối chiếu
BM-GS-01	Đầu việc khảo sát/đo hiện trạng: **Xuất báo cáo**. Xem mục 6.2.	Hiện trạng, vị trí, kích thước, MEP và ghi chú đúng phiếu đã lưu.
BM-GS-02	Nhật ký/Báo cáo: **Xuất báo cáo**; chi tiết ngày/phiếu thi công: **Xuất báo cáo ngày**. Xem mục 8.1-8.2.	Đúng ngày, phạm vi bộ lọc hoặc lần gửi; nội dung, nhân lực, vật tư và ảnh đúng nguồn.
BM-GS-03	Đầu việc checklist/gói nghiệm thu thầu phụ: **Xuất báo cáo**. Xem mục 9.1.	Số biên bản, từng tiêu chí, khối lượng thiết kế/đo và kết luận nghiệm thu.
BM-GS-04	Thi công > Cần xử lý, danh sách hoặc chi tiết: **Xuất báo cáo**. Xem mục 8.3.	Đúng phạm vi, vị trí, tổng số lỗi và trạng thái.
BM-GS-05	Phiếu đánh giá rủi ro: **Xuất báo cáo**; phiếu khảo sát/thi công hoặc chi tiết ngày: **Xuất báo cáo rủi ro**. Xem mục 6.3.	Rủi ro, nguyên nhân, ảnh hưởng, hướng xử lý, người phụ trách, hạn và tình trạng.
BM-GS-06	Phiếu thi công hoặc chi tiết ngày: **Xuất báo cáo hiện trường**. Xem mục 8.4.	Danh sách công việc/chỉ dẫn, vị trí, người nhận, hạn, tiến độ và trạng thái đã ghi.
BM-GS-07	Đầu việc > Minh chứng > Sổ minh chứng: **Xuất báo cáo**. Xem mục 6.4.	Đúng các ảnh gắn với Đầu việc; ảnh nằm trong ô, giữ tỷ lệ và không che nội dung.
BM-GS-08	Bàn giao > mở hồ sơ: **Xuất báo cáo**. Xem mục 10.1.	Đúng hồ sơ bàn giao, ngày bàn giao đã lưu, danh mục, đánh giá và kết luận.

Người thao tác: dùng tài khoản cá nhân được giao việc và có quyền truy cập hồ sơ. Vai trò công trình không tự cấp quyền xuất mọi nguồn. Tại Thi công cần quyền xem Thi công; tại Báo cáo cần quyền xuất báo cáo và quyền xem hồ sơ/lần gửi; tại Bàn giao cần quyền xem Bàn giao. Nếu thiếu quyền, liên hệ PM hoặc người quản trị để kiểm tra phân công và quyền của chính tài khoản đó.

1. Kiểm tra công trình, Đầu việc và hồ sơ đang mở. Nếu đang sửa phiếu, **Lưu nháp** hoặc lưu theo thao tác của hồ sơ trước khi xuất. Có thay đổi chưa lưu thì nút xuất của phiếu bị khóa. Xuất phiếu nháp đã lưu không có nghĩa phiếu đã Chốt hồ sơ.
2. Với danh sách, chọn bộ lọc rồi **Áp dụng** trước khi xuất. Với Báo cáo đã gửi, chọn đúng **Lần gửi** trước khi xuất. Không thay bộ lọc hoặc quay về bản hiện tại khi mục tiêu là đối chiếu một lần gửi cũ.
3. Chọn nút xuất một lần, chờ tải file **.xlsx**, mở bằng ứng dụng bảng tính; có thể nhập file tải về vào Google Sheets để xem. Đối chiếu dữ liệu và ảnh trước khi gửi cho người nhận.


Cách đọc file: mỗi lần xuất tạo báo cáo theo loại hồ sơ, không xuất đồng loạt cả tám mẫu. BM02 có một sheet cho mỗi báo cáo ngày; nhiều báo cáo có thể nằm trong cùng workbook. BM01/BM05 không có ô ảnh trong mẫu gốc. BM07 đặt ảnh vào ô của từng dòng; một số mẫu khác có sheet phụ **Hình ảnh**, vì mẫu chính không có vùng ảnh tương ứng. Giữ file tải ban đầu để đối chiếu; không chèn lại ảnh vào file để làm bằng chứng xuất đúng.

Dữ liệu thiếu: không tự điền số 0, Đạt hoặc thời điểm chụp thay cho dữ kiện chưa ghi. BM02 có thể hiển thị **Chưa đánh giá** dù đã có công việc trong ngày; ghi nhận công việc không thay cho kết luận đánh giá. Xuất báo cáo không tự duyệt hồ sơ, nghiệm thu, hoàn tất bàn giao hoặc chuyển Giai đoạn.

Xuất xứ ảnh bổ sung: tất cả là dữ liệu thử Development. BM01/BM05/BM06 dùng công trình DEV-BM-REUSE-20261009; BM04/BM07 dùng DEV-BM04-REUSE-20261009; BM02 dùng DEV-BM02-WORKFLOW-20261012; BM03/BM08 dùng công trình thử BM03-REV10-20261013 theo Rev10. Nhiều ảnh chụp bằng tài khoản Admin; không dùng ảnh này để kết luận đã kiểm mọi vai trò hoặc công trình thật. Các ảnh cũ của Rev9 và GOLDEN-REAL-001 giữ nguyên nguồn đã nêu tại mục 1.

2. Đăng nhập và đổi mật khẩu lần đầu

1. Mỗi nhân sự nhận **tài khoản của chính mình** và mật khẩu ban đầu qua kênh cấp phát riêng. Tại màn hình Đăng nhập, nhập email và mật khẩu ban đầu, rồi chọn **Đăng nhập**.
2. Nếu hệ thống yêu cầu **Đổi mật khẩu ban đầu**, nhập mật khẩu đang dùng, mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới. Mỗi người tự thao tác và giữ kín mật khẩu.
3. Chọn **Đổi mật khẩu và đăng nhập lại**; đăng nhập lại bằng mật khẩu mới. Nếu tài khoản đã qua lần đổi đầu, vào **Hồ sơ cá nhân › Bảo mật › Đổi mật khẩu**. Việc đổi mật khẩu đăng xuất các phiên hiện có.
4. Kiểm tra tên người đang đăng nhập trước khi làm hoặc duyệt việc. Khi chuyển vai trò, đăng xuất rồi đăng nhập đúng tài khoản nhân sự tiếp theo.

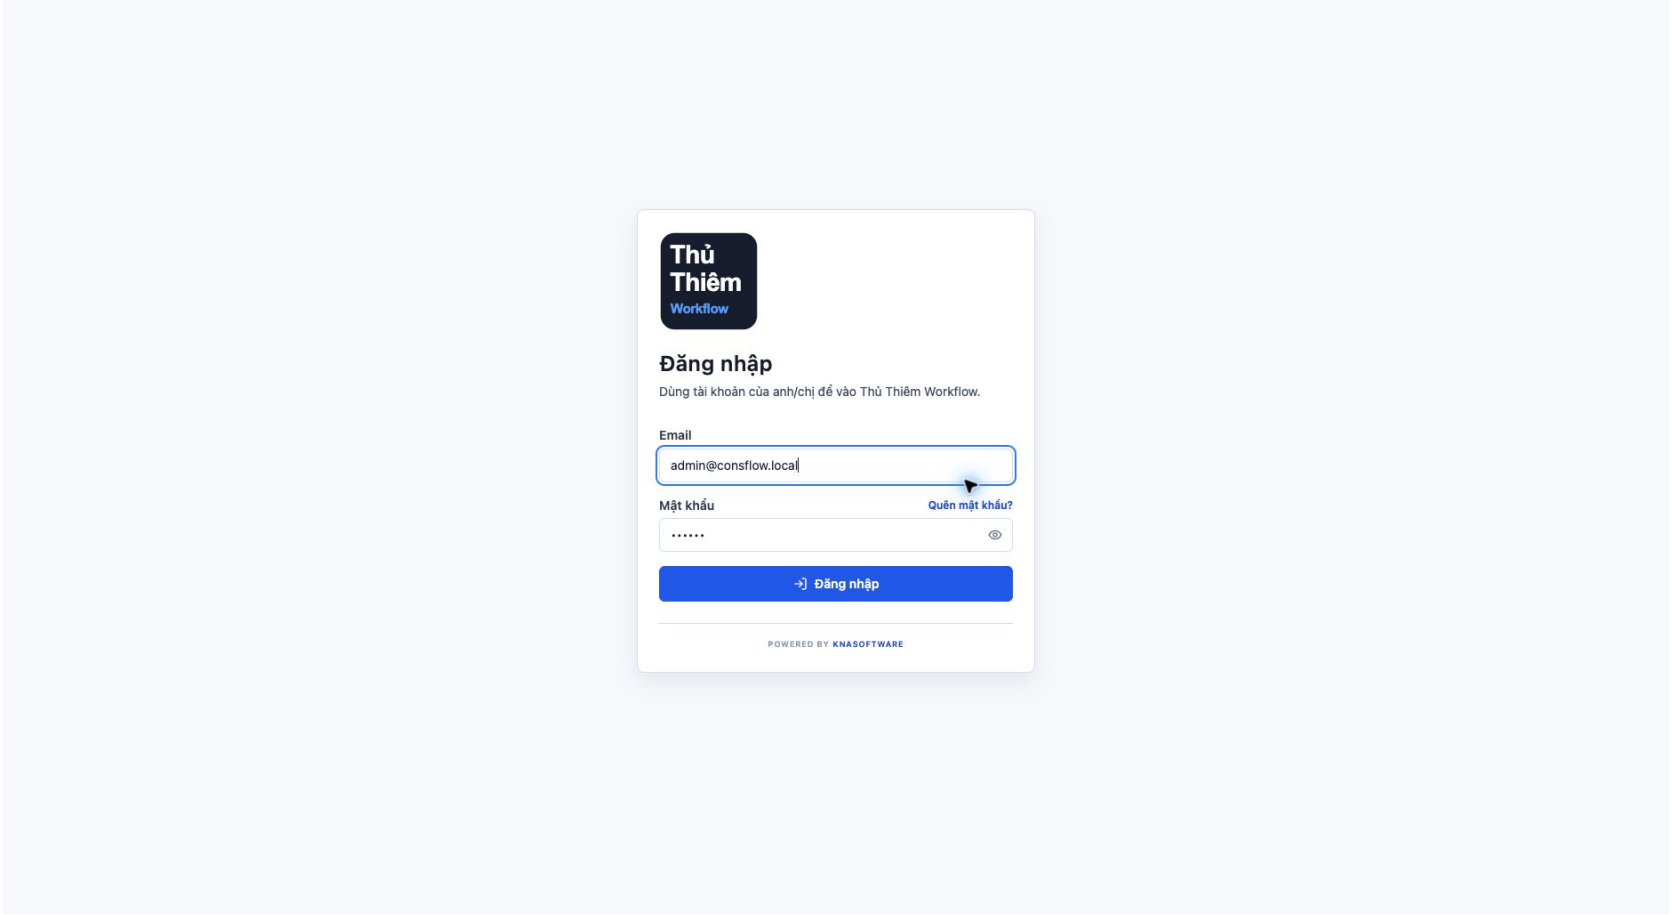


Ảnh 1 · Màn hình Đăng nhập. Ảnh không chứa mật khẩu.




Ảnh 2 · Cửa sổ Đổi mật khẩu trong Hồ sơ cá nhân; khi đăng nhập lần đầu, màn hình bắt buộc đổi có cùng ba nội dung cần nhập.

3. Tạo công trình mới - ba bước


Bước	Mục đích	Người thực hiện thao tác	Điều cần kiểm tra trước khi đi tiếp
1. Thông tin	Xác định đúng công trình và mẫu quy trình	Vào **Công trình › Tạo công trình**; nhập tên, mã, chủ đầu tư, địa chỉ, thời gian và giá trị dự kiến; chọn mẫu quy trình bản 9; chọn **Tạo công trình & tiếp tục**.	Mã không trùng; tên chủ đầu tư đúng; giá trị là dự kiến; mẫu quy trình đã chọn đúng.
2. Chọn nhân sự	Giao đúng người thực hiện	Tìm, chọn thành viên; gán vai trò vận hành và quyền tham gia công trình; chọn **Lưu nhân sự & tiếp tục**.	Có ít nhất một người đủ điều kiện PM; các vai trò của Gói công việc cần xử lý có người phụ trách.
3. Thiết lập	Chốt người chịu trách nhiệm và điểm bắt đầu	Xem đội ngũ, độ phủ vai trò, người đủ vai trò cho bước đầu; chỉ định **PM phụ trách**; xử lý các điều kiện còn thiếu; chọn **Bắt đầu quy trình**.	Hệ thống báo sẵn sàng. Chính nút Bắt đầu mới tạo Đầu việc thực tế. Sau đó kiểm tra riêng ô người phụ trách của từng Đầu việc.

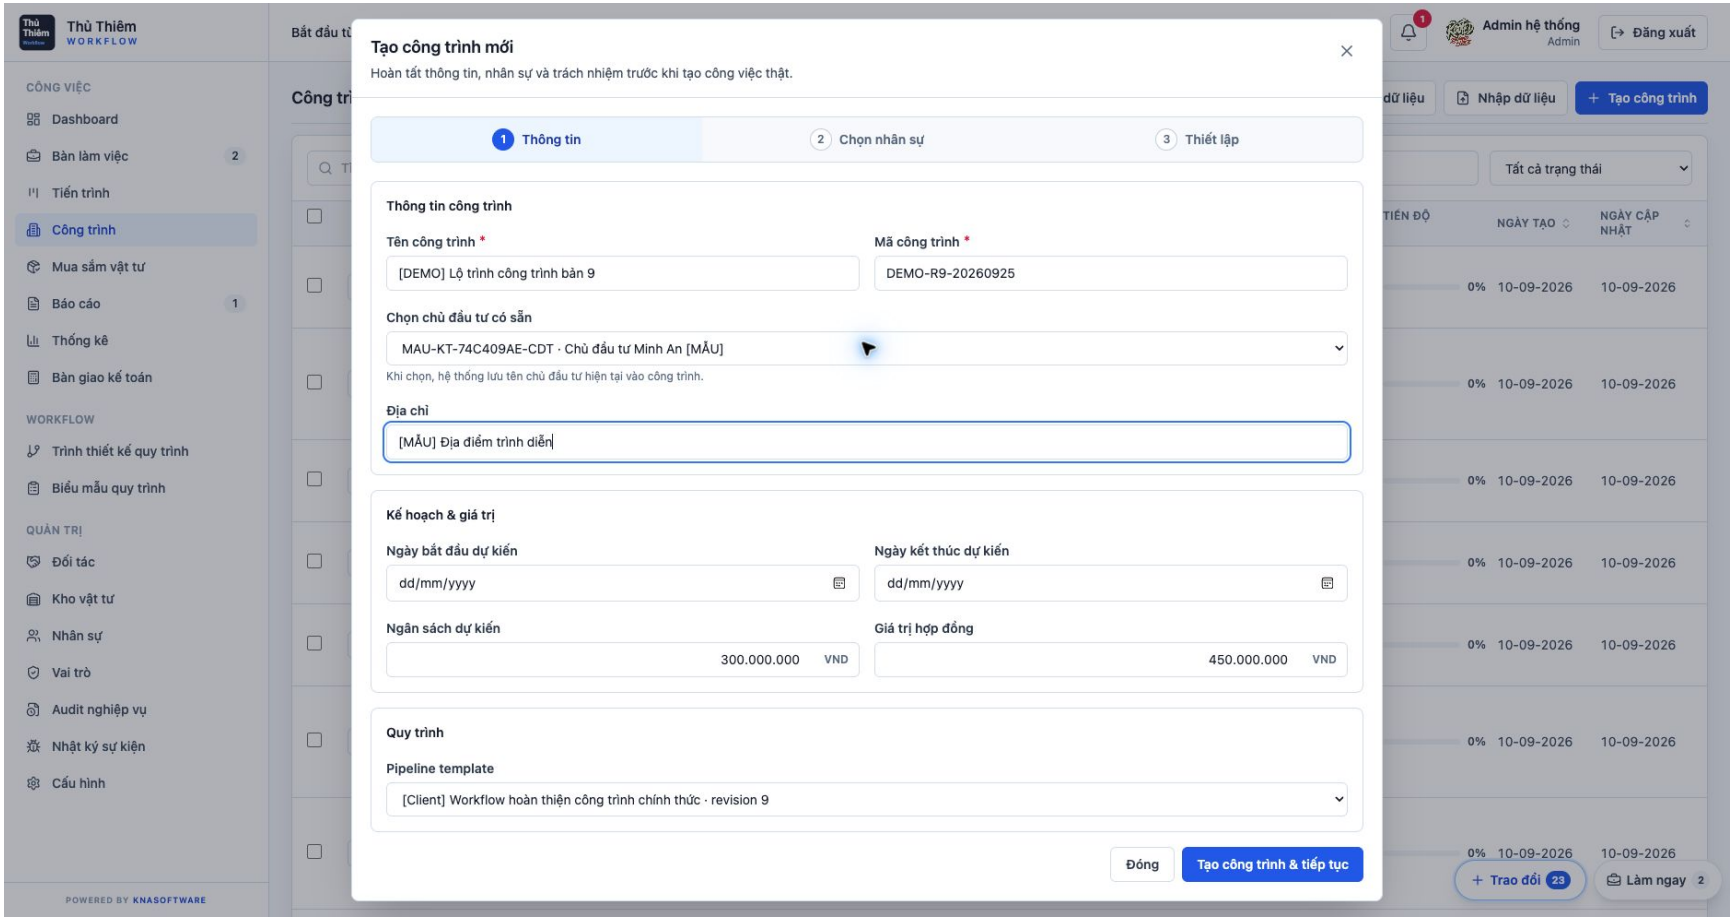

Ảnh 3 · Bước 1 của chính công trình DEMO-R9-20260925: tên, mã, chủ đầu tư mẫu và mẫu quy trình revision 9. Các giá trị ngân sách/hợp đồng là số minh họa, chưa phải hợp đồng đã ký.

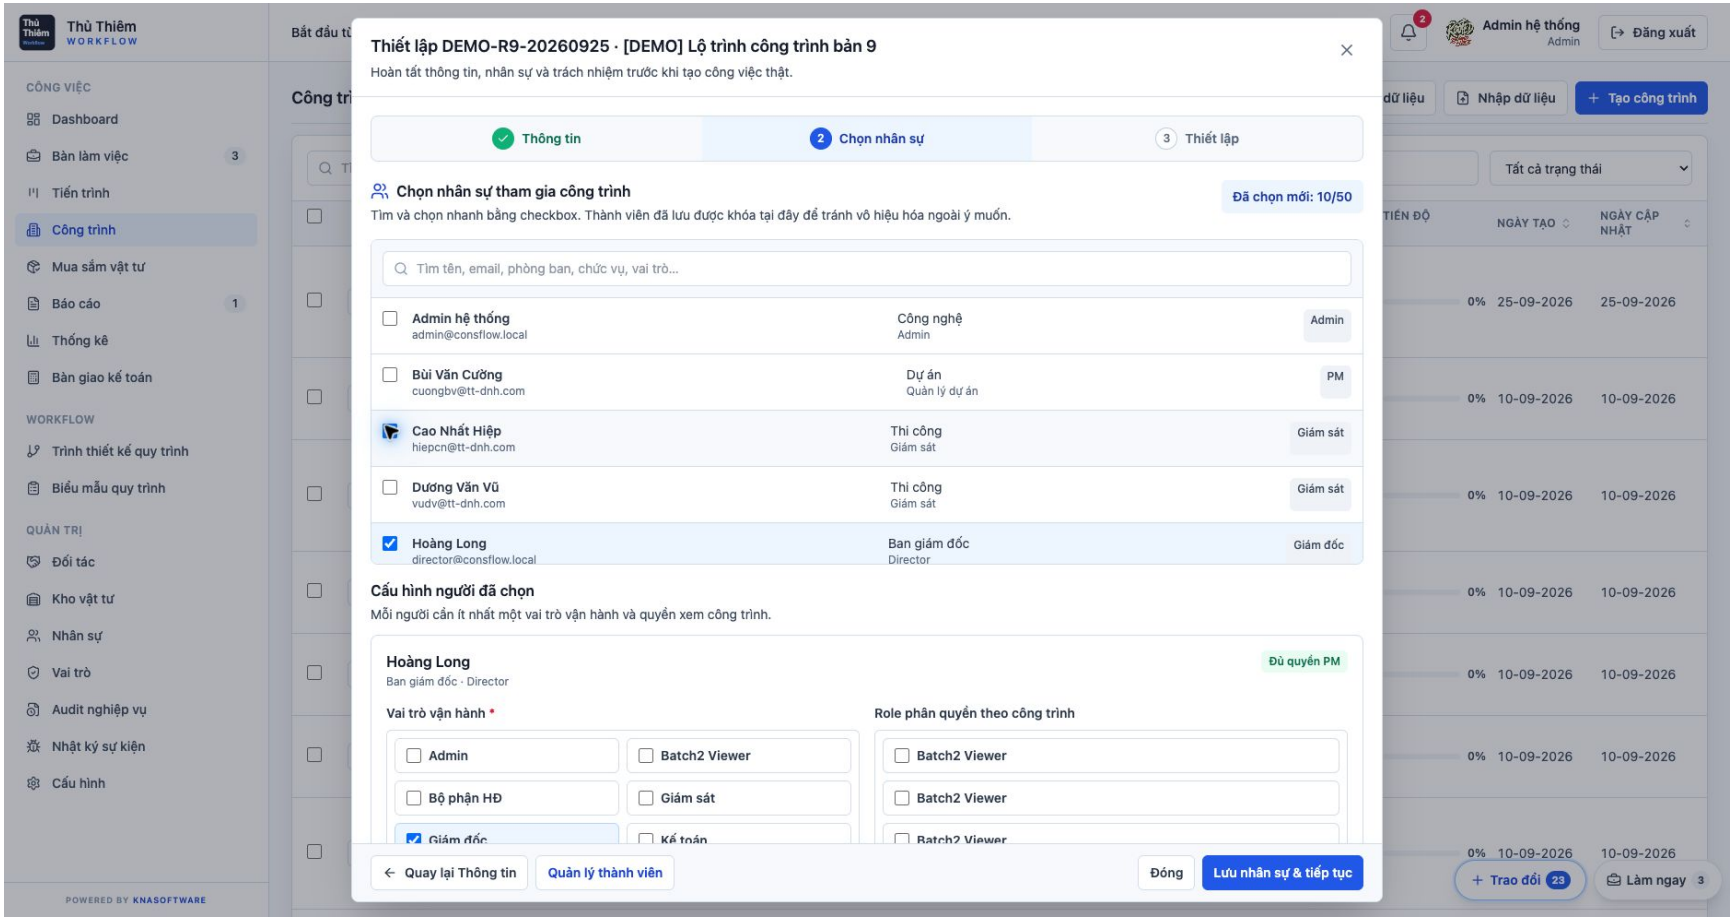

Ảnh 4 · Bước 2 của cùng công trình: 10 nhân sự được chọn trong lượt đầu, sau đó bổ sung một người Thiết kế. Tổng cộng đã lưu 11 người.

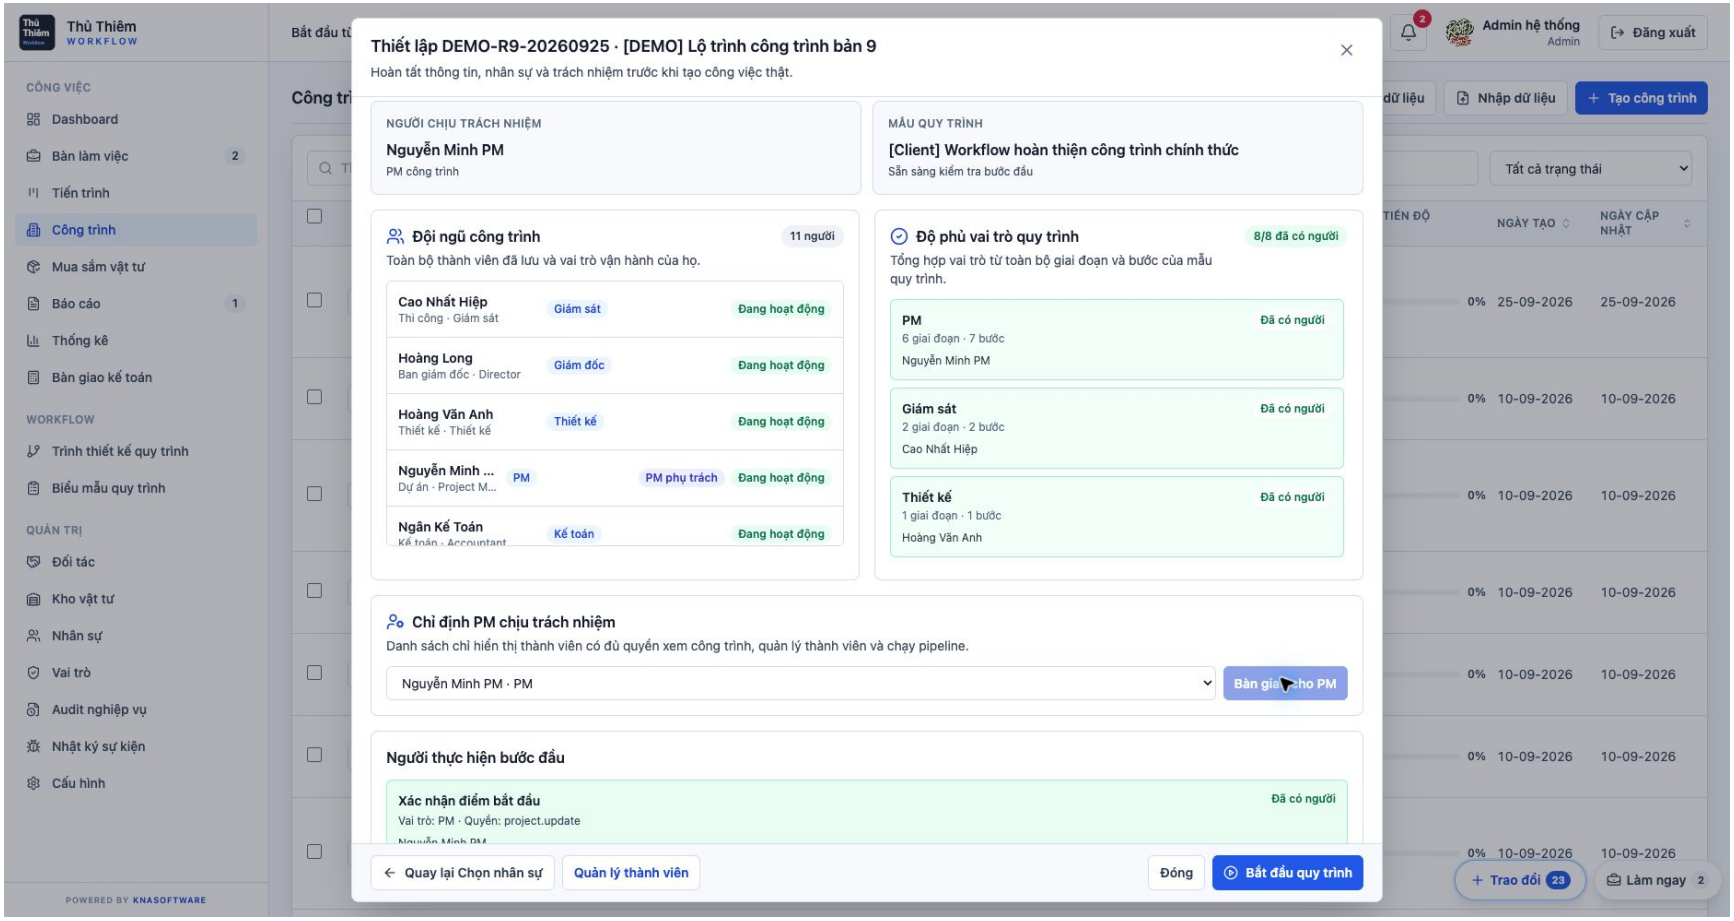


Ảnh 5 · Bước 3 sau khi giao Nguyễn Minh PM: đội ngũ 11 người, đủ 8/8 vai trò, bước đầu có người đủ vai trò và nút Bắt đầu quy trình. Sau khi chọn nút, phần mềm tạo 21 Đầu việc theo mẫu bản 9; người đủ vai trò chưa đồng nghĩa Đầu việc đã được giao đích danh.

Nguyên tắc: tạo hồ sơ công trình, chọn đúng người và trách nhiệm trước. Khi đủ người cho bước đầu, PM bắt đầu Quy trình. Sau đó kiểm tra người phụ trách cụ thể ở từng Đầu việc.

4. Đọc Quy trình trong chi tiết công trình

Vào công trình vừa tạo, chọn **Quy trình**. Cột trái liệt kê các **Giai đoạn**; giữa màn hình là **Gói công việc** của Giai đoạn đang xem; trên cùng là việc tiếp theo, tiến độ, việc cần xử lý, chờ duyệt và bị chặn. Chọn một Giai đoạn để xem việc của chặng đó; chọn **Mở** để vào nơi xử lý của từng Đầu việc. Số đếm chỉ là tình trạng hiện tại, không thay cho việc kiểm tra hồ sơ nguồn.

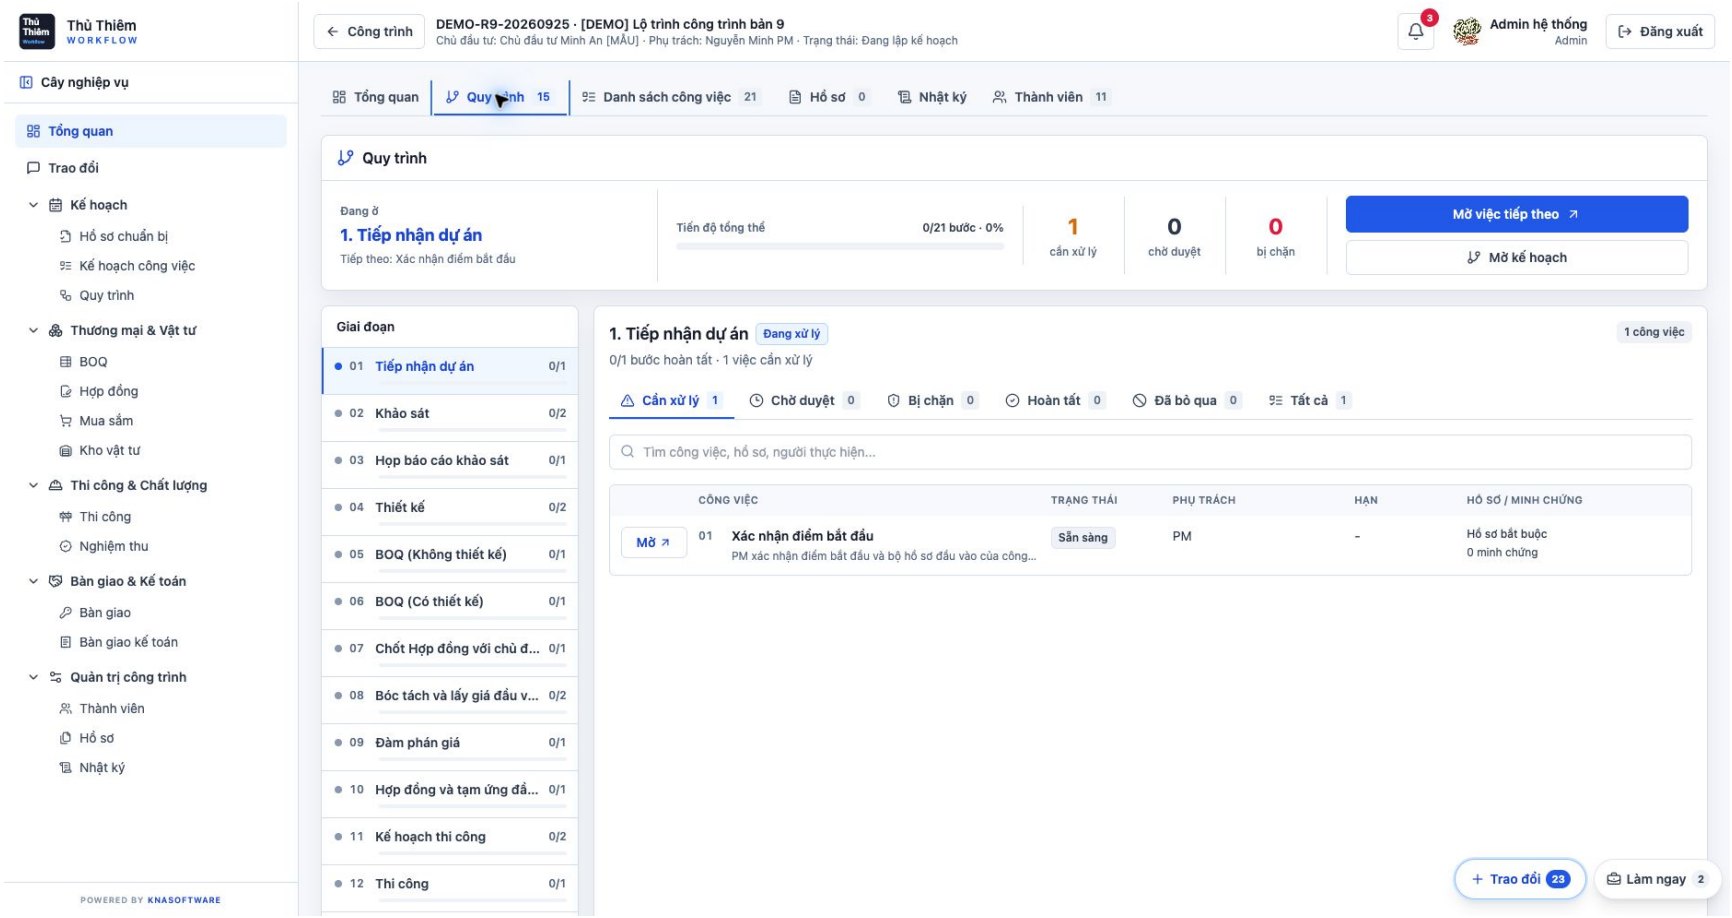

Ảnh 6 · Ảnh chụp lúc công trình mới bắt đầu: 15 Giai đoạn, 21 Gói công việc được khai báo, 0/21 gói hoàn tất. Ảnh sau ở mục 5 cho thấy nhánh Có thiết kế được chọn, còn 20 gói trong nhánh thực hiện.

4.1. Ma trận điều phối theo Giai đoạn


Giai đoạn	Mục đích và kết quả cần thấy	Vai trò làm chính	Vai trò cùng kiểm tra hoặc quyết định
01 Tiếp nhận dự án	Chốt điểm bắt đầu, hồ sơ và nhân sự đầu vào	PM	Người tạo công trình, QS và Giám sát đối chiếu thông tin liên quan
02 Khảo sát	Ghi hiện trạng, ảnh, yêu cầu và biên bản khảo sát	Giám sát; PM chốt biên bản	QS tham gia khối lượng sơ bộ; PM kiểm tra hồ sơ
03 Họp báo cáo khảo sát	Chọn nhánh Có thiết kế hoặc Không thiết kế	PM	Người có quyền duyệt Giai đoạn: PM, QS hoặc Giám sát, **khác người gửi yêu cầu duyệt**
04 Thiết kế	Phát hành gói thiết kế và bàn giao đúng bản cho QS	Thiết kế; PM bàn giao	PM rà bản phát hành; QS tiếp nhận căn cứ lập BOQ
05 BOQ không thiết kế	Phát hành khối lượng/báo giá theo nhánh không thiết kế	QS	Người duyệt BOQ tại hồ sơ BOQ, chủ đầu tư xác nhận qua hồ sơ
06 BOQ có thiết kế	Phát hành BOQ theo bản thiết kế đã chốt	QS	Thiết kế/PM đối chiếu bản vẽ; người duyệt BOQ tại hồ sơ BOQ
07 Hợp đồng chủ đầu tư	Hoàn tất phiên bản, ký và hồ sơ gửi nhận	Bộ phận HĐ	Người được phân quyền rà soát, duyệt và ký phiên bản; PM theo dõi hồ sơ với chủ đầu tư
08 Bóc tách và lấy giá đầu vào	Chốt khối lượng mua và báo giá nhà cung cấp	QS; Mua hàng	PM kiểm tra phù hợp kế hoạch và hồ sơ nguồn
09 Đàm phán giá	Chọn báo giá đầu vào sau đàm phán	Mua hàng	QS/PM đối chiếu giá và điều kiện lựa chọn
10 Hợp đồng và tạm ứng đầu vào	Hoàn tất yêu cầu mua đã duyệt và hợp đồng đầu vào đủ điều kiện	Mua hàng	Bộ phận HĐ chuẩn bị hợp đồng; người có quyền duyệt/ký; Kế toán xem căn cứ tạm ứng
11 Kế hoạch thi công	Chốt kế hoạch triển khai và bàn giao ra hiện trường	PM	Giám sát, QA/QC nhận phần việc và tiêu chí kiểm tra
12 Thi công	Cập nhật Nhật ký, Kiểm tra, Cần xử lý	Giám sát	Đội thi công xử lý; PM/QA/QC kiểm tra và xác nhận kết quả phù hợp
13 Nghiệm thu đầu vào	Nghiệm thu thầu phụ/khối lượng và vật tư	QS; QA/QC	Thủ kho nhận vật tư bằng phiếu kho riêng sau khi đạt

Giai đoạn	Mục đích và kết quả cần thấy	Vai trò làm chính	Vai trò cùng kiểm tra hoặc quyết định
14 Nghiệm thu đầu ra	Kết luận hồ sơ nghiệm thu cuối và đối chiếu chủ đầu tư	QA/QC	PM/Giám đốc theo thẩm quyền; đại diện chủ đầu tư xác nhận bằng hồ sơ
15 Bàn giao công trình và hồ sơ kế toán	Hoàn tất bàn giao vật lý, sau đó Kế toán tiếp nhận hồ sơ nguồn	PM; Kế toán	Người có quyền duyệt Giai đoạn: Kế toán, PM hoặc Giám đốc, **khác người gửi yêu cầu duyệt**

Tên Giai đoạn cuối trong mẫu đang hiển thị có thể còn là "Kết thúc: Bàn giao + Tài chính công trình". Khi giải thích nghiệp vụ, dùng "Bàn giao công trình và hồ sơ kế toán"; không hiểu đó là khóa sổ kế toán.

5. Trao đổi là bàn điều phối hằng ngày

Mục đích chính: nhìn thấy việc kế tiếp, giao tiếp quanh đúng công trình/Đầu việc và giữ quyết định có căn cứ. Vào **Trao đổi** sau khi bắt đầu Quy trình. Cột **Bước tiếp theo** chỉ việc ưu tiên của công trình; **Việc của tôi** là việc người đang đăng nhập cần làm; vùng giữa là Thảo luận/Quyết định/Nhật ký hệ thống; cột **Cần chú ý** gom chưa đọc, nhắc đến, câu hỏi, điểm chặn và việc đến hạn.

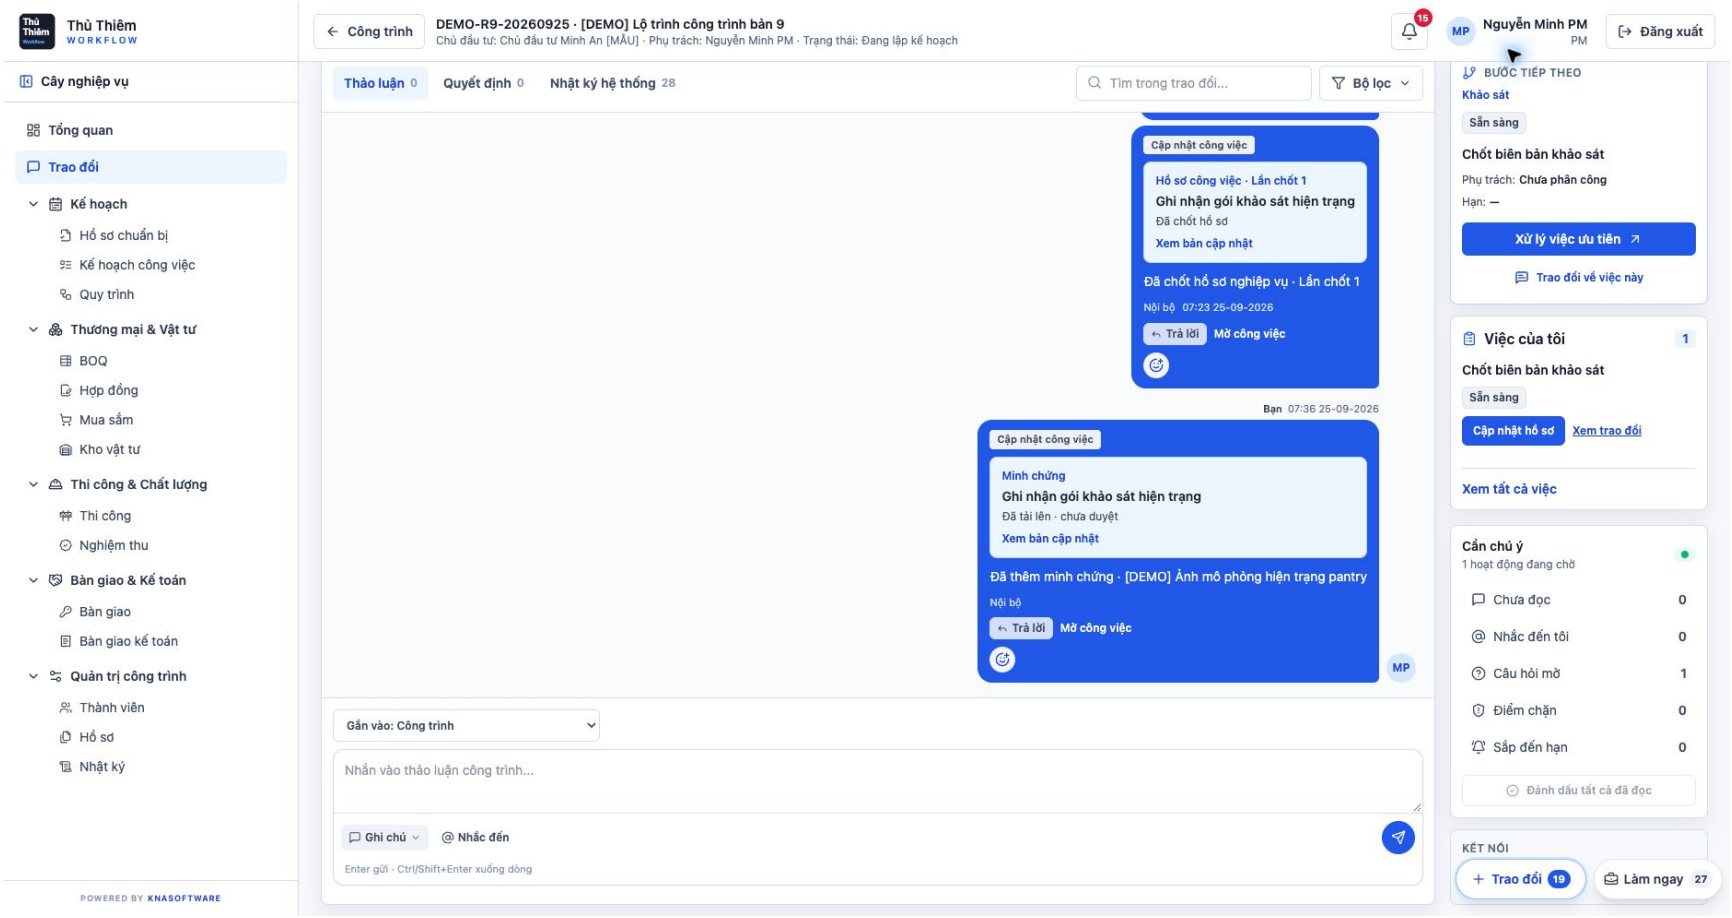

Ảnh 7 · Trao đổi của chính công trình Rev9 sau khi xử lý việc: tin PM nằm cạnh các thẻ chốt hồ sơ và minh chứng khảo sát. Đây là dòng hoạt động thật trên phần mềm, không phải màn trống để minh họa lời thoại dự kiến.

Khi cần	Thao tác	Kết quả cần hiểu
Hỏi chung về công trình	**Gắn vào: Công trình**, nhập nội dung, chọn loại phù hợp, nhắc đúng thành viên rồi gửi	"Thông tin chung ở một nơi; người được nhắc biết việc cần phản hồi."
Trao đổi quanh một việc	**Gắn vào: Đầu việc** hoặc **Trao đổi về việc này** ở thẻ việc ưu tiên	"Câu hỏi và câu trả lời đi cùng đúng việc, không trôi khỏi hồ sơ."


Khi cần	Thao tác	Kết quả cần hiểu
Phản ánh vướng mắc	Chọn loại trao đổi phù hợp và chỉ rõ người xử lý, hạn/căn cứ trong lời nhắn	"Điểm chặn được nêu rõ; phần xử lý chính thức vẫn làm tại Đầu việc hoặc hồ sơ nguồn."
Xem thay đổi	Mở **Nhật ký hệ thống**, lọc theo việc/hồ sơ liên quan	"Hệ thống ghi lịch sử từ các hành động; tin trao đổi không tự biến thành phê duyệt."

5.1. Ví dụ đã ghi nhận trên công trình Rev9 tại màn Trao đổi


Thứ tự đã thực hiện	Vai trò và mục đích	Thao tác tại Trao đổi	Kết quả nhìn thấy
1	**PM** hỏi Giám sát về hồ sơ đầu vào	Gửi Câu hỏi gắn Công trình, nhắc Cao Nhất Hiệp kiểm tra vị trí, kích thước và ảnh hiện trạng	Tin PM xuất hiện trong dòng Trao đổi; câu hỏi được đóng sau khi Giám sát phản hồi ở lượt 10
2	**PM** xác nhận điểm bắt đầu	Chọn **Xử lý việc ưu tiên**, ghi nhánh "Khảo sát trước báo giá", chốt hồ sơ và hoàn tất Đầu việc	Thẻ cập nhật "Xác nhận điểm bắt đầu" xuất hiện, Giai đoạn chuyển sang Khảo sát
3	**PM đã thao tác** trên gói có vai trò Giám sát của công trình mẫu	Mở gói "Ghi nhận gói khảo sát hiện trạng" ngay từ Trao đổi; ghi phạm vi, kích thước minh họa, rủi ro; tải ảnh **[DEMO]**; hoàn tất	Gói 1 của Khảo sát hoàn tất. Lịch sử ghi đúng người thao tác là Nguyễn Minh PM; **Giám sát Cao Nhất Hiệp không phải người lập hồ sơ này**
4	**PM** chốt biên bản	Mở việc ưu tiên kế tiếp, ghi thành phần và kết luận minh họa; chốt hồ sơ, tạo PDF, tải PDF minh chứng **[DEMO]**, hoàn tất	Gói 2 của Khảo sát hoàn tất; thẻ chốt hồ sơ và tải tài liệu hiện trong Trao đổi
5	**PM** điều phối sau khảo sát	Gửi Ghi chú: cần đối chiếu bản vẽ điện nước, đo lại kích thước trước khi chốt BOQ, chưa khoan cắt vùng ống âm tường	Tin nhắn PM nằm xen giữa các cập nhật công việc
6	**PM** gửi yêu cầu rà soát Giai đoạn	Từ Quy trình, chọn **Thao tác giai đoạn › Yêu cầu phê duyệt** cho Khảo sát đã 2/2 gói	Trạng thái **Chờ duyệt**, người đủ vai trò Giám sát cần quyết định; Đầu việc "Chốt nhánh xử lý" ở Trao đổi hiện **Chỉ xem**
7	**Giám đốc** hỏi PM	Đăng nhập tài khoản Giám đốc mẫu; gửi câu hỏi về nội dung biên bản, số liệu còn vướng và căn cứ chọn nhánh	Tin của Hoàng Long xuất hiện trong cùng dòng Trao đổi
8	**Kế toán** nhắc hồ sơ về sau	Đăng nhập tài khoản Kế toán mẫu; gửi danh mục hợp đồng, yêu cầu mua đã duyệt, nghiệm thu, phiếu nhập kho cần đối chiếu khi tới chặng tạm ứng/bàn giao	Tin của Ngân Kế Toán xuất hiện; đây là nhắc chuẩn bị, **chưa xác nhận thanh toán**

Thứ tự đã thực hiện	Vai trò và mục đích	Thao tác tại Trao đổi	Kết quả nhìn thấy
9	**Giám sát Cao Nhất Hiệp** duyệt Khảo sát	Đăng nhập tài khoản của mình, xem yêu cầu chờ duyệt, ghi ý kiến và chọn **Duyệt**	Yêu cầu duyệt biến khỏi hàng chờ của Giám sát. Ý kiến yêu cầu đo lại kích thước và đối chiếu tuyến điện nước; **duyệt chưa tự chuyển Giai đoạn**
10	**Giám sát Cao Nhất Hiệp** trả lời PM	Trả lời trực tiếp câu hỏi đầu dòng, nói rõ hồ sơ mô phỏng đã duyệt nhưng dữ liệu hiện trường còn phải xác nhận; đánh dấu **Đã trả lời**	Câu hỏi hiện **Đã xử lý**, bộ đếm Câu hỏi mở về 0
11	**PM** chuyển Giai đoạn 02 và chốt nhánh	Tại Quy trình, chọn **Chuyển giai đoạn tiếp theo**; mở gói **Chốt nhánh xử lý**, ghi biên bản họp, chọn **Có thiết kế**, chốt hồ sơ, tạo PDF và hoàn tất	Giai đoạn 03 có 1/1 gói hoàn tất; PDF chot-nhanh-xu-ly-rev-1.pdf được tạo từ hồ sơ đã chốt
12	**PM** phản hồi Giám đốc, Kế toán và ghi quyết định	Trả lời đúng hai tin trước; tại Trao đổi gửi tin loại **Quyết định** về nhánh Có thiết kế	Các câu trả lời và quyết định xuất hiện trong dòng Trao đổi; nêu rõ chưa ký hợp đồng, chưa mua vật tư và chưa xác nhận thanh toán
13	**PM gửi, QS Trần Hà duyệt** Giai đoạn 03	PM yêu cầu phê duyệt; QS đăng nhập, ghi ý kiến điều kiện kiểm tra khối lượng rồi chọn **Duyệt**	Hàng chờ QS về 0. PM thực hiện thao tác chuyển Giai đoạn riêng; Giai đoạn 04 Thiết kế mở, nhánh BOQ không thiết kế bị bỏ qua, tiến độ **4/20**
14	**Thiết kế Hoàng Văn Anh** phát hành bản thiết kế	Trong Đầu việc Thiết kế, đưa sơ đồ mô phỏng vào hồ sơ, phát hành DEMO-TK-R01, chốt biểu mẫu, tạo PDF và hoàn tất; báo PM/QS ở Trao đổi	Bản phát hành và tin của người Thiết kế xuất hiện thật. Tệp chỉ là sơ đồ [DEMO], chưa đo đạc và không dùng thi công
15	**PM** bàn giao bản cho QS	Xác nhận bàn giao đúng DEMO-TK-R01, chốt hồ sơ bàn giao, tạo PDF, hoàn tất Đầu việc; trả lời Thiết kế ngay trong Trao đổi	Giai đoạn 04 đạt 2/2, tiến độ 6/20. PM chuyển riêng sang Giai đoạn 06 BOQ có thiết kế
16	**QS Trần Hà** lập BOQ và hỏi PM	Nhập hai dòng BOQ 4 đèn LED và 24 m² tấm thạch cao, gửi duyệt, khóa định mức; gửi Câu hỏi gắn Đầu việc về số đo và nguồn kho	PM trả lời: đo hiện trường trước khi dùng thật; Thủ kho kiểm tồn; Mua hàng chỉ mua phần thiếu. Câu hỏi được đánh dấu đã xử lý


Thứ tự đã thực hiện	Vai trò và mục đích	Thao tác tại Trao đổi	Kết quả nhìn thấy
17	**PM** duyệt BOQ, lập báo giá mô phỏng	Duyệt hai dòng, ghi báo giá DEMO-BG-R9-001 của nhà cung cấp giả lập, đánh giá có điều kiện và khóa giá cuối	Giá minh họa 7,4 triệu đồng. Không coi đây là đo bóc, báo giá hoặc lựa chọn nhà cung cấp có hiệu lực cho công trình thực tế
18	**PM** theo dõi yêu cầu mua	Thao tác tạo yêu cầu mua báo lỗi, nhưng Trao đổi và sổ Mua sắm cho thấy **một** yêu cầu PR-95fd70ab-1790301536-01 đã được ghi. PM mở yêu cầu đó, duyệt, ghi DEMO-PO-R9-001 và nhắn rõ cho Mua hàng, Thủ kho, QA/QC, Kế toán	Yêu cầu chuyển sang **Đang giao / nghiệm thu**; lượng đạt nghiệm thu và đã nhập kho đều bằng 0. Không bấm tạo lại để tránh trùng yêu cầu
19	**QS Trần Hà** chốt Gói BOQ	Trong Trao đổi mở việc ưu tiên, ghi rõ kênh gửi **nội bộ, chưa gửi ra ngoài**, chốt hồ sơ, tạo PDF không chữ ký, tải BOQ [DEMO] làm minh chứng, hoàn tất và báo PM	Giai đoạn 06 đạt 1/1, tiến độ 7/20. PM chuyển riêng sang Giai đoạn 07 Hợp đồng chủ đầu tư
20	**PM và Bộ phận HĐ Vũ An** báo điểm chặn Hợp đồng	PM giao lập bản nháp trong Trao đổi. Bộ phận HĐ mở Đầu việc, thấy bốn điều kiện nguồn còn thiếu; mở Tạo hợp đồng nhưng ô Đối tác chỉ có "Chọn", rồi gửi tin loại **Điểm chặn**	Giai đoạn 07 vẫn 0/1. Tài khoản Bộ phận HĐ chưa tạo được bản nháp; không mô phỏng chữ ký, bản giấy đã ký hoặc kích hoạt
21	**PM** lập bản nháp để tiếp tục hướng dẫn	PM chọn đúng Chủ đầu tư Minh An [MẪU], tạo DEMO-HD-CDT-R9-001, lập V1 giá trị **0 đồng**, ghi rõ phạm vi còn thiếu căn cứ và gửi rà soát nội bộ; trả lời tin Điểm chặn	Hợp đồng **Đang rà soát**, V1 chưa được duyệt. Giá trị 0 đồng thể hiện chưa chốt giá, không phải giá hợp đồng thực tế
22	**Bộ phận HĐ Vũ An** xem V1 và yêu cầu bổ sung	Vũ An mở V1 trong sổ Hợp đồng, nêu thiếu số đo, đơn giá đầu ra và xác nhận chủ đầu tư; trả lời PM trong Trao đổi	Tin nhắn là **ý kiến điều phối**. Màn hình của tài khoản Bộ phận HĐ không có nút kết luận trả lại trên V1; trạng thái V1 vẫn **Đang rà soát**, chưa có quyết định duyệt/ký

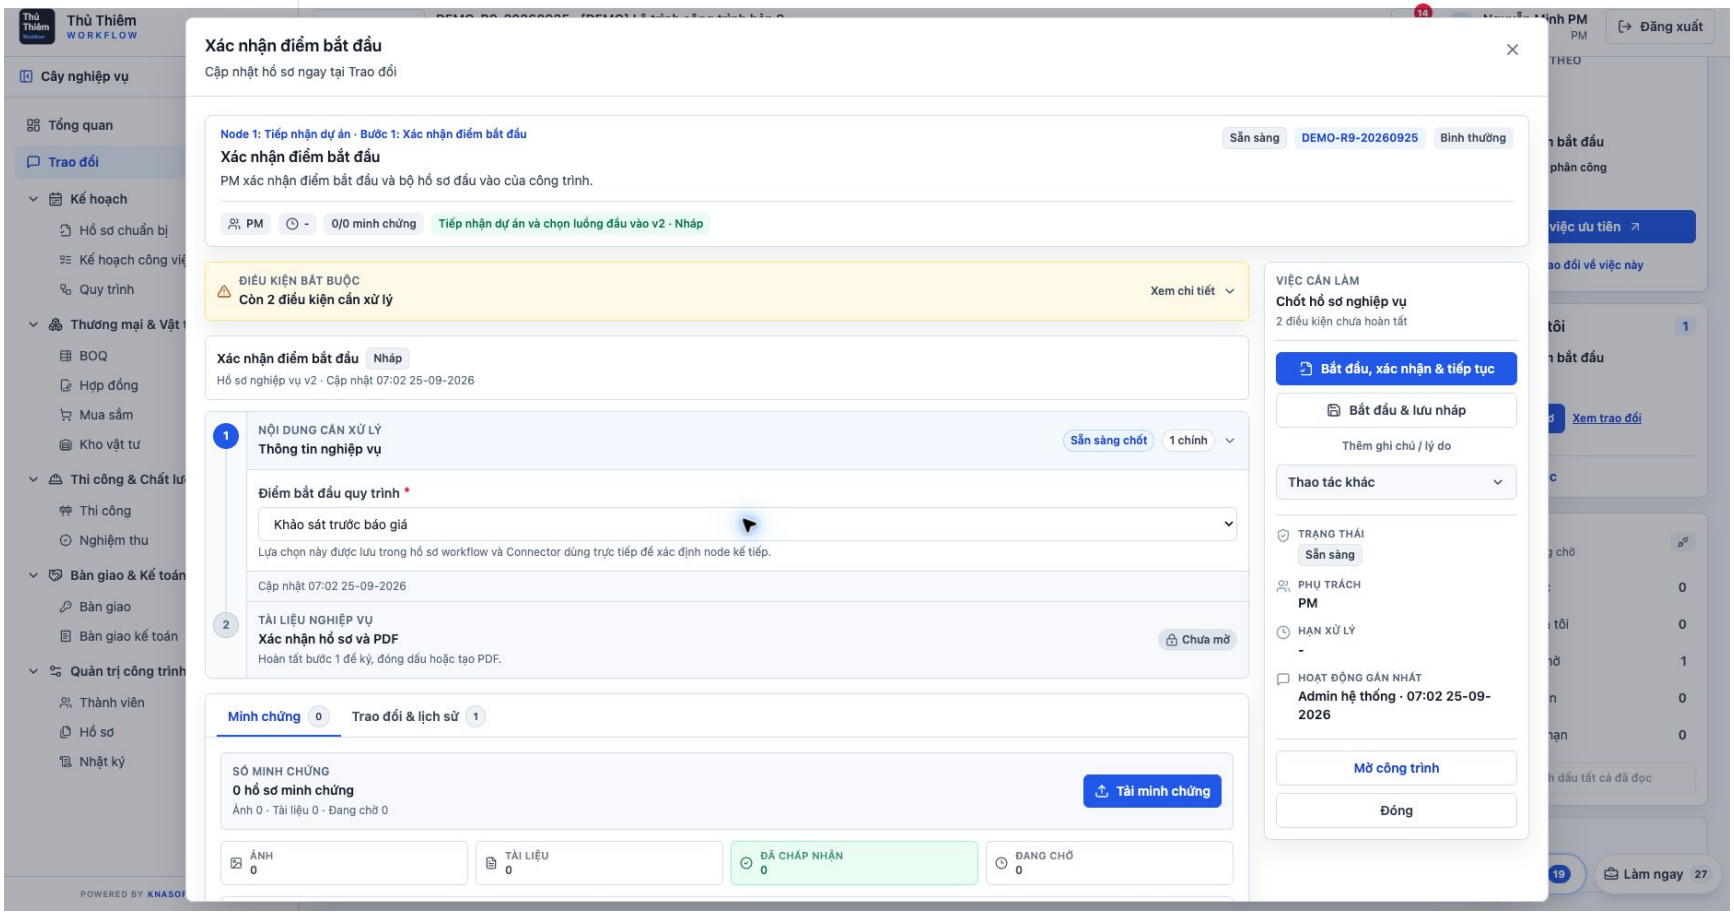


Ảnh 7a · Mở Đầu việc đầu tiên tại Trao đổi, điền lựa chọn nhánh khảo sát và chốt hồ sơ.

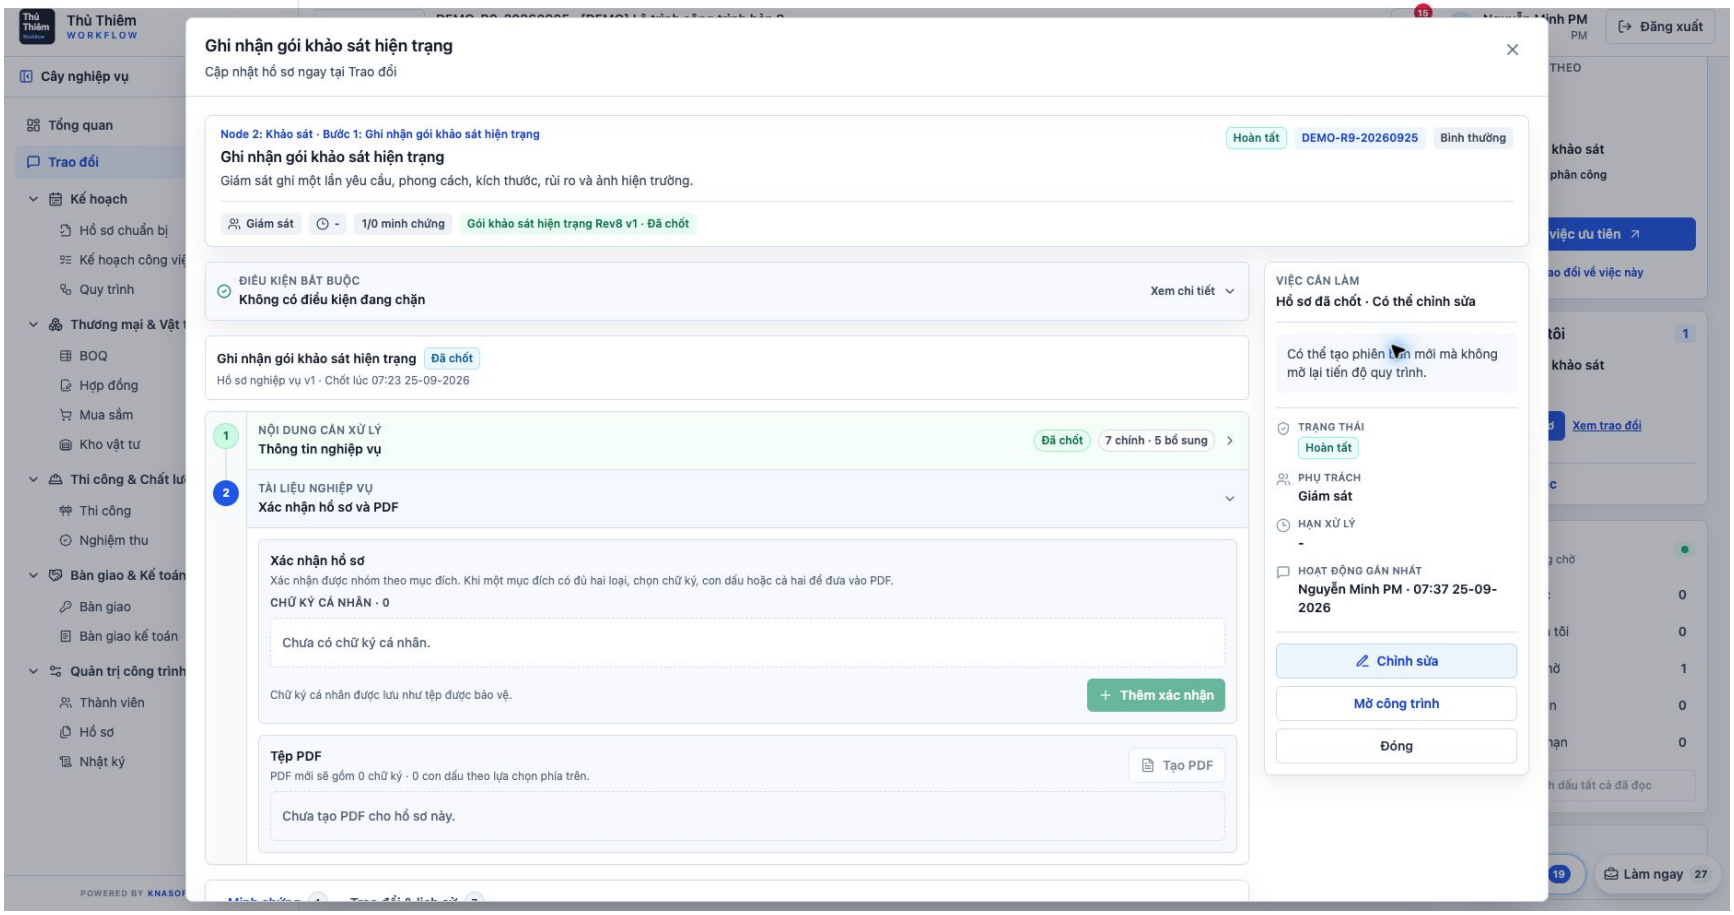


Ảnh 7b · Gói khảo sát có ảnh minh chứng [DEMO] và trạng thái Hoàn tất; phần "Hoạt động gần nhất" ghi PM là người thao tác.

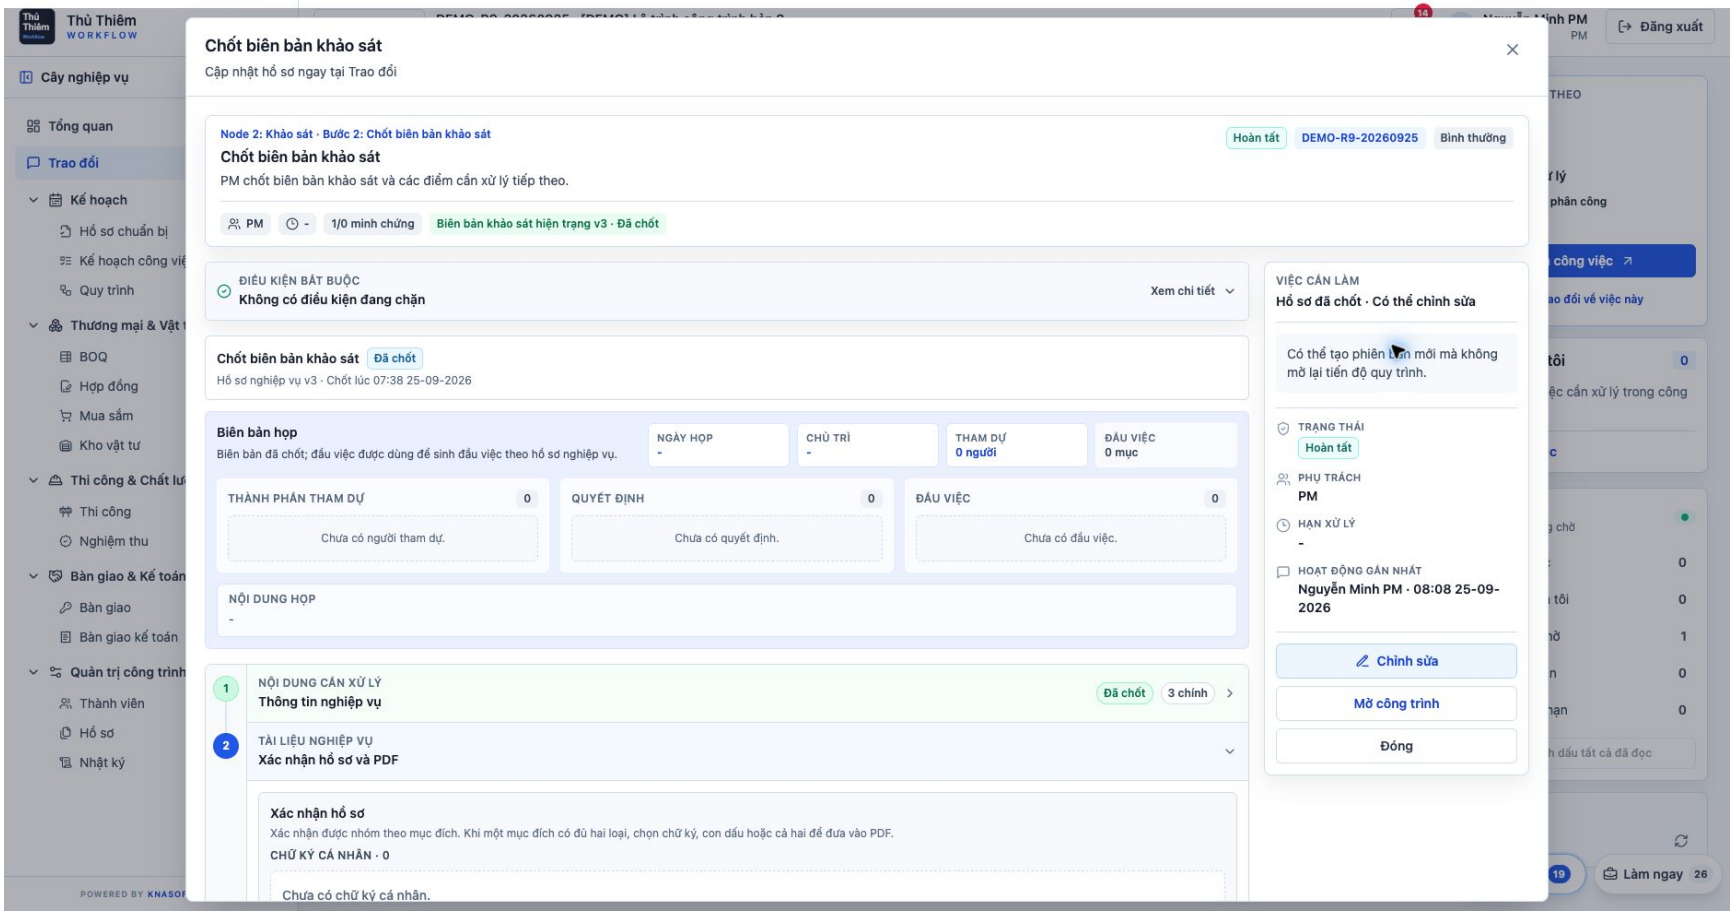


Ảnh 7c · Biên bản khảo sát đã chốt, có PDF minh chứng [DEMO] gắn với đúng Đầu việc.

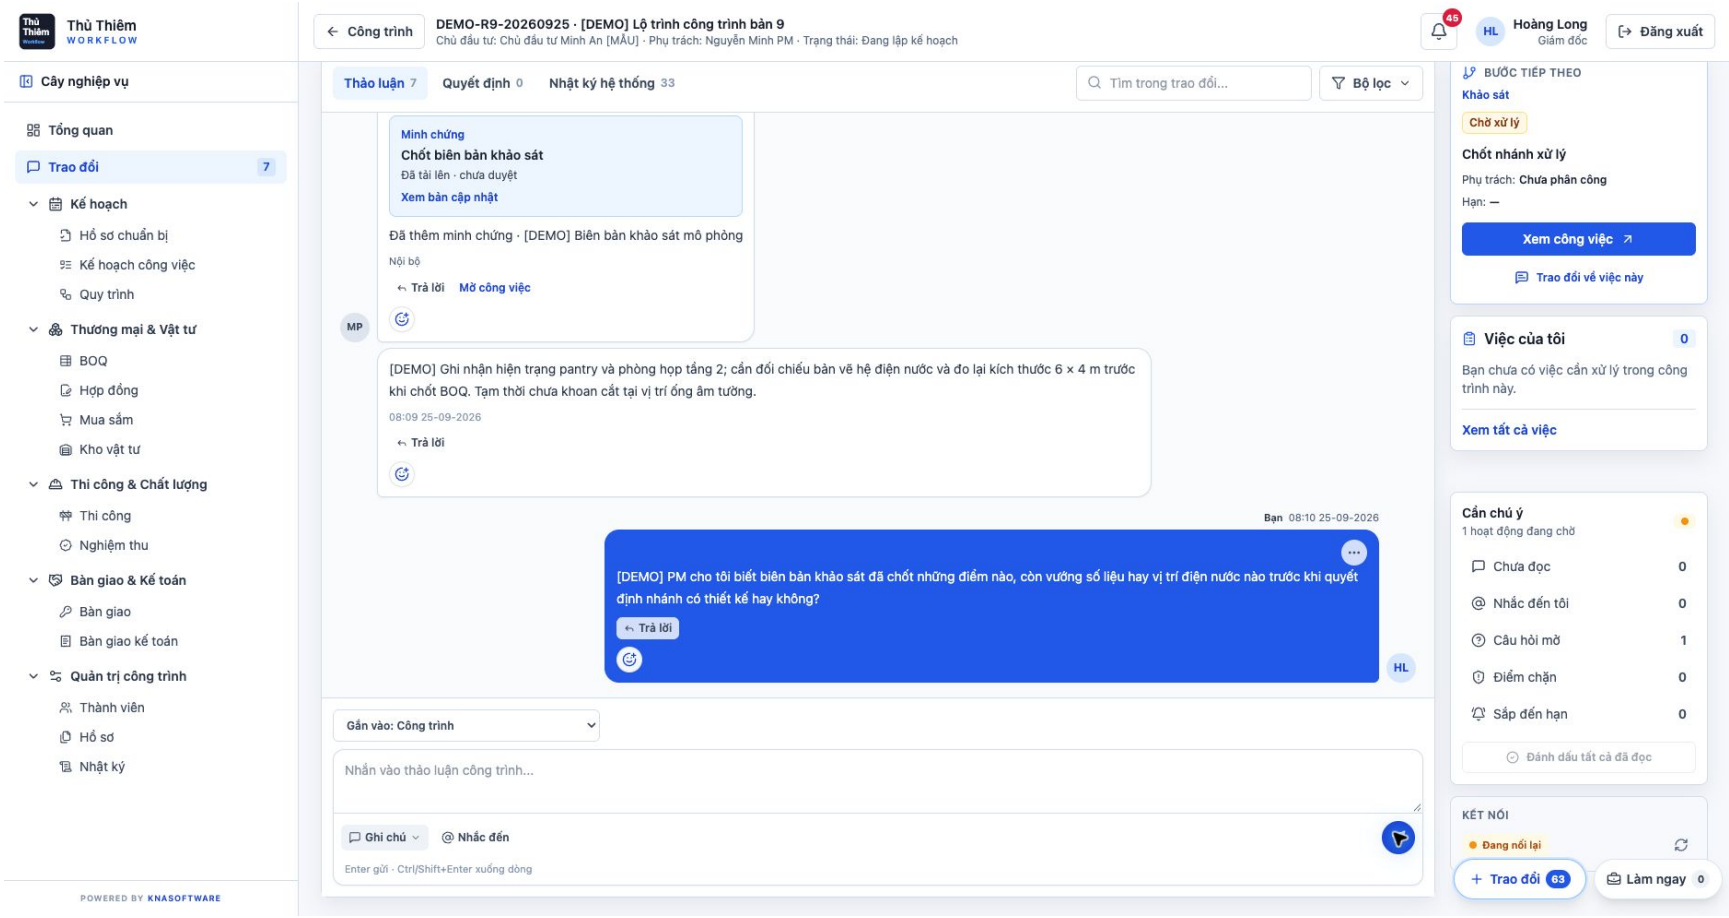


Ảnh 7d · Giám đốc hỏi PM về điểm còn vướng ngay sau Khảo sát. Đây là tin đã gửi bằng tài khoản Giám đốc mẫu.

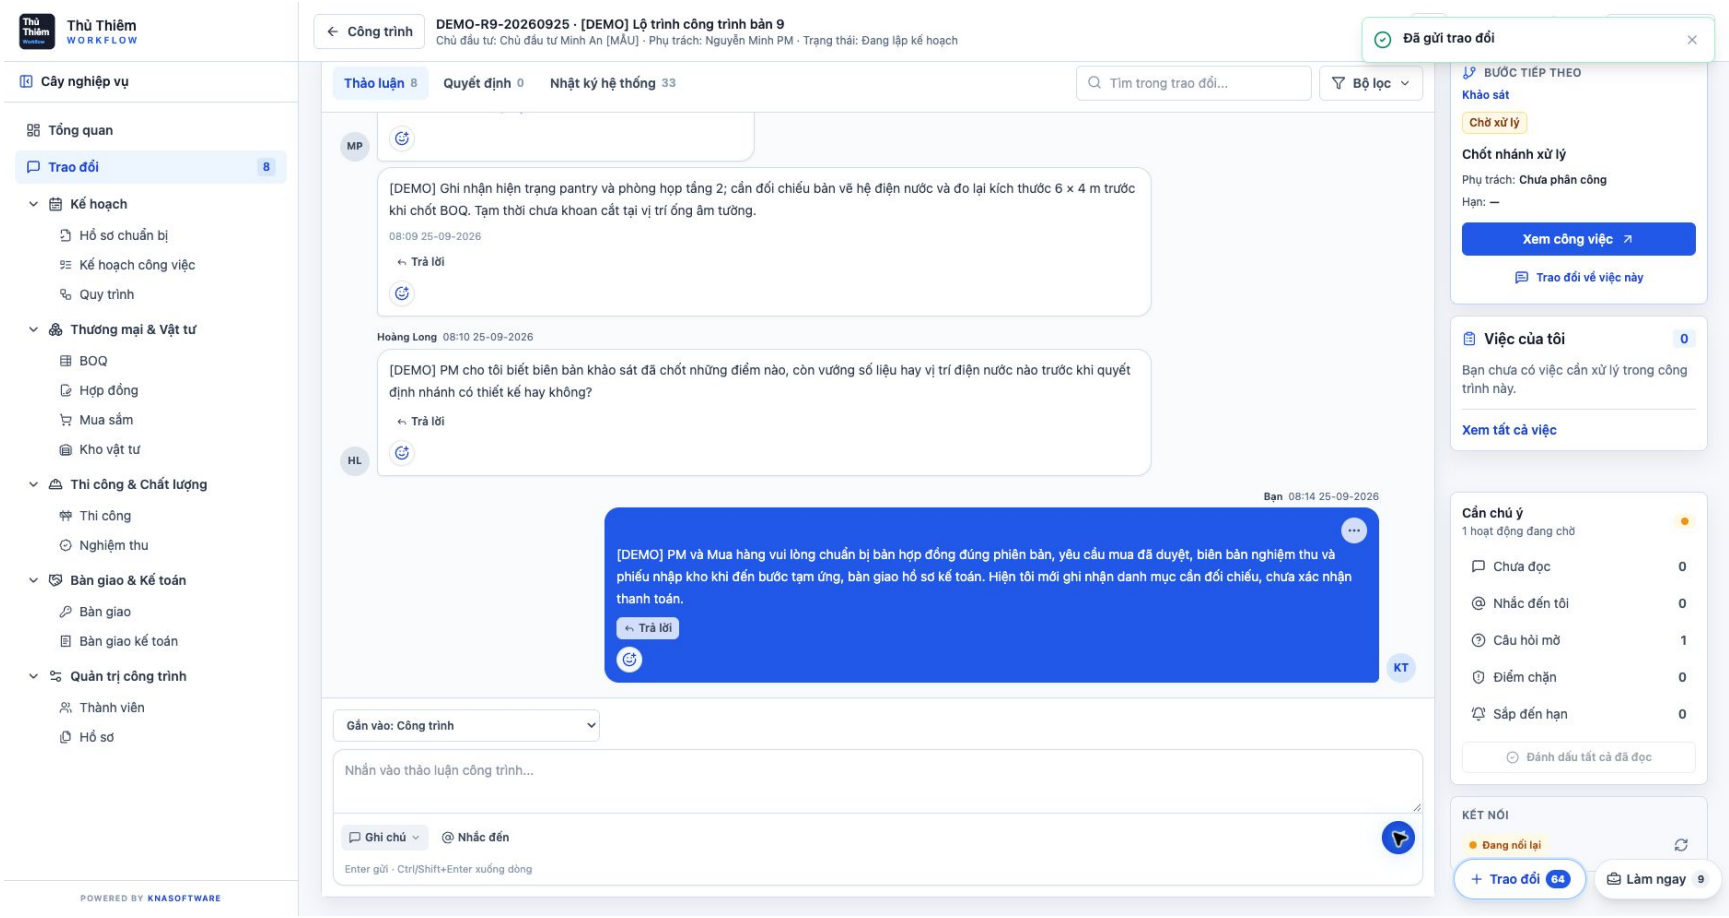


Ảnh 7e · Kế toán nhắc trước các chứng từ phải đối chiếu khi đến tạm ứng và bàn giao hồ sơ kế toán. Tin đã gửi, chưa phát sinh thanh toán hay tiếp nhận hồ sơ.

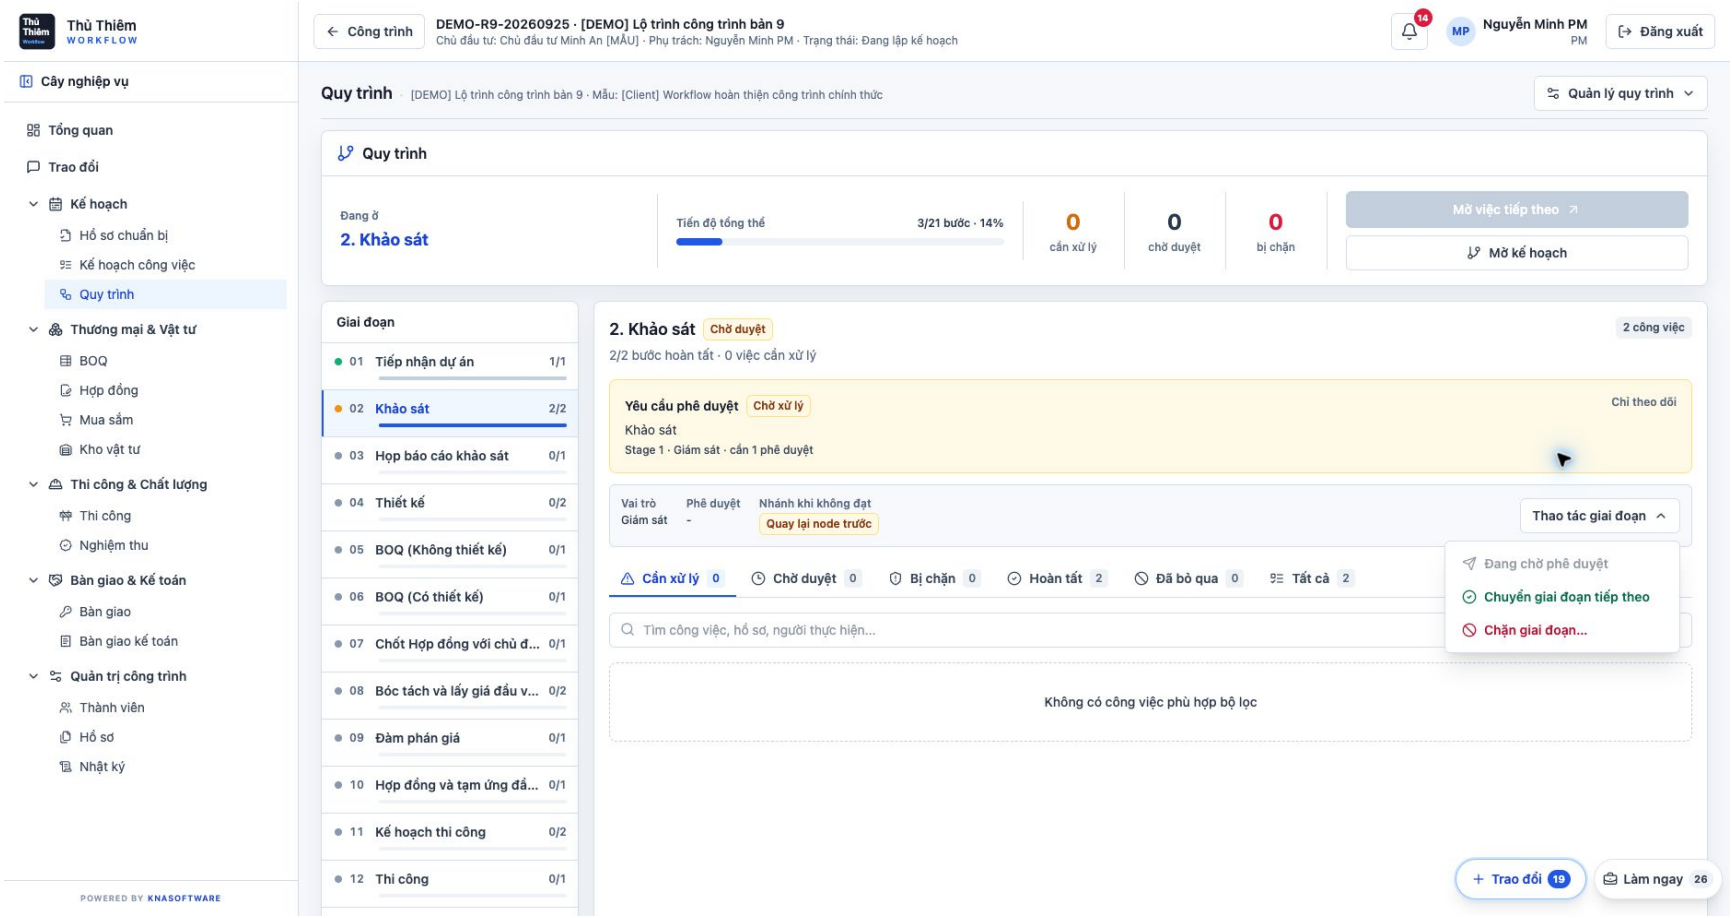


Ảnh 7f · Khảo sát 2/2 gói hoàn tất và đang chờ phê duyệt Giai đoạn. Người đăng nhập Giám đốc và Admin chỉ thấy "Chỉ theo dõi"; quyền duyệt của lượt này thuộc vai trò Giám sát.

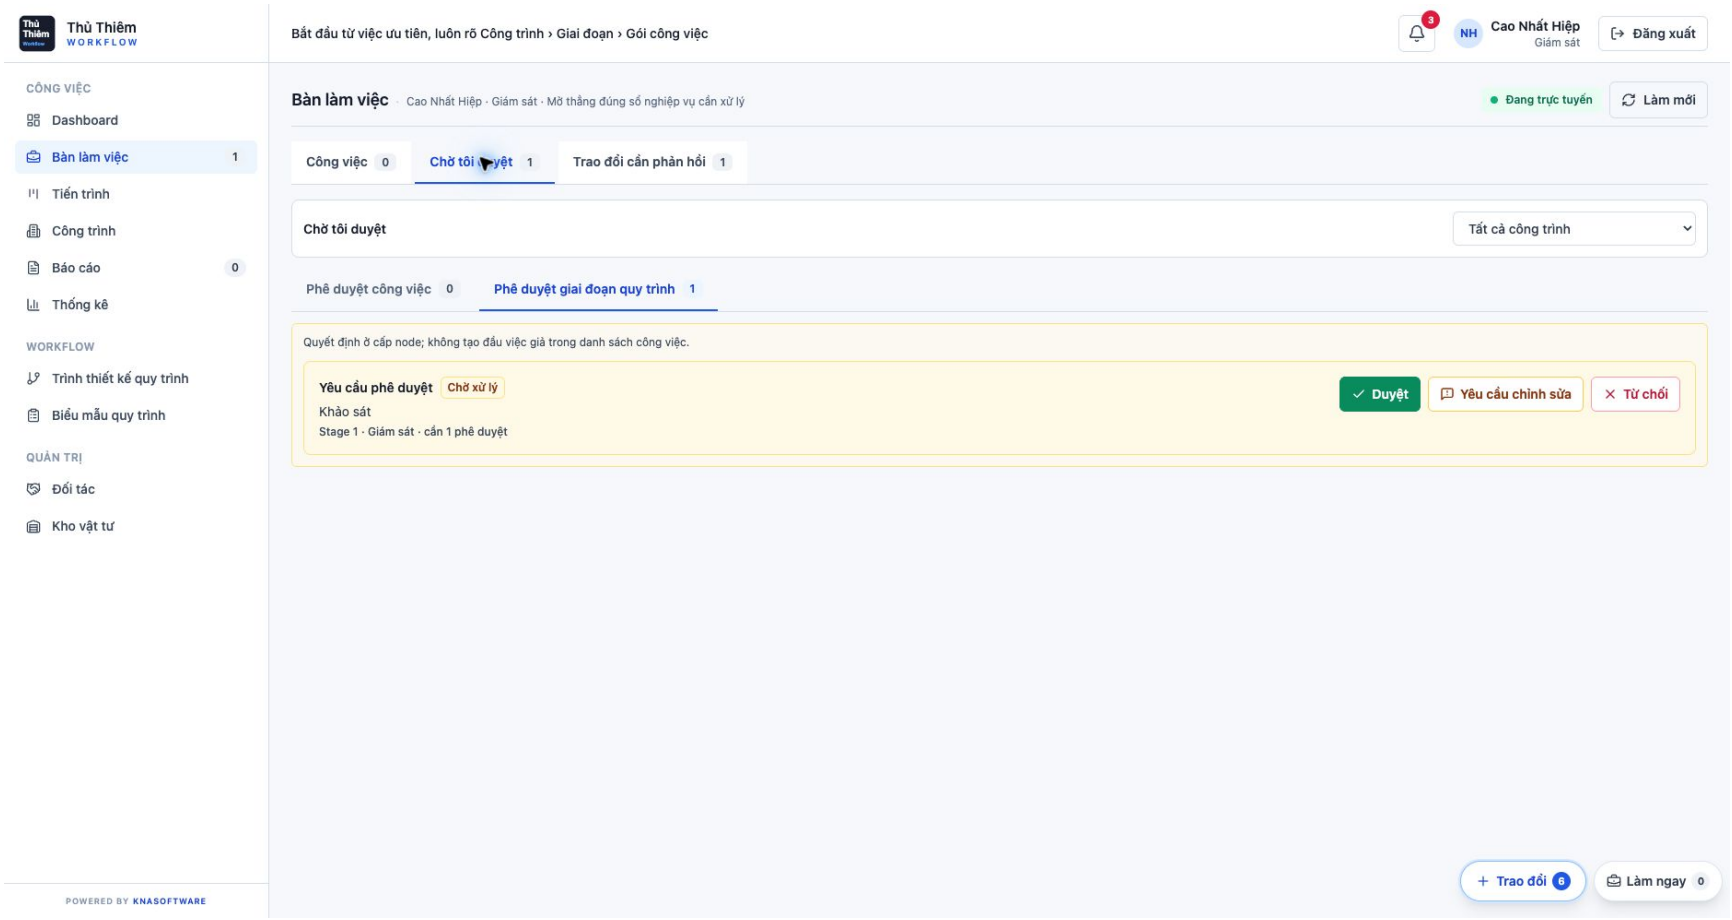


Ảnh 7g · Giám sát Cao Nhất Hiệp nhìn thấy yêu cầu Khảo sát trong hàng Chờ tôi duyệt.

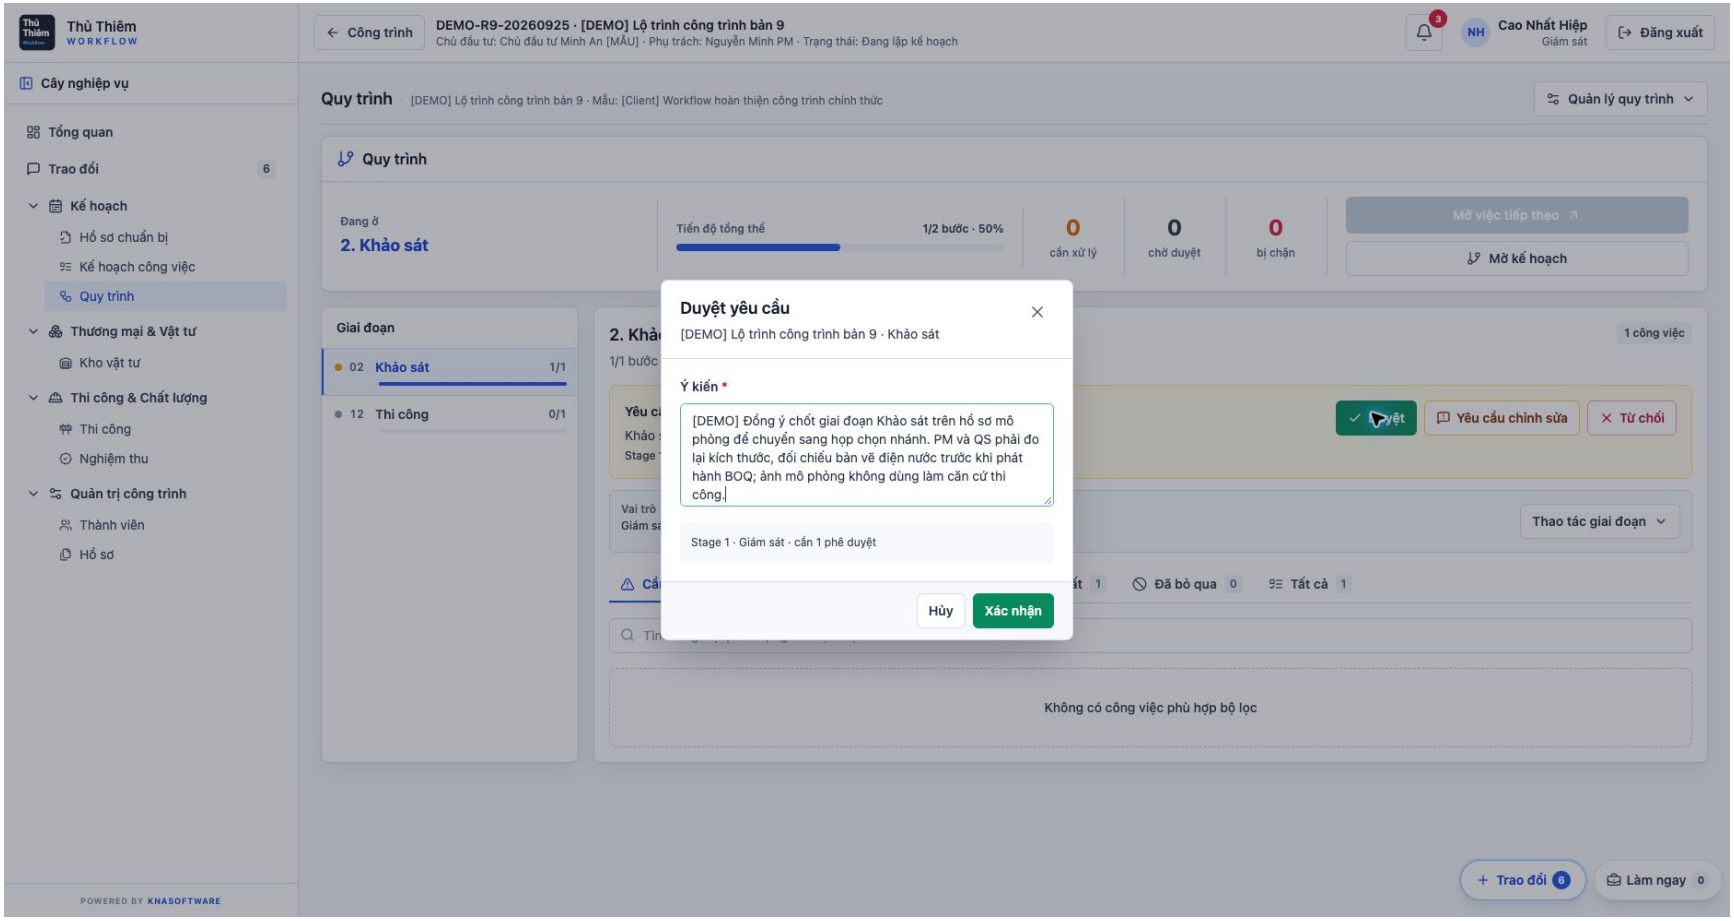


Ảnh 7h · Ý kiến duyệt nêu điều kiện đo lại kích thước, đối chiếu tuyến điện nước; ảnh và hồ sơ khảo sát chỉ là dữ liệu mô phỏng.

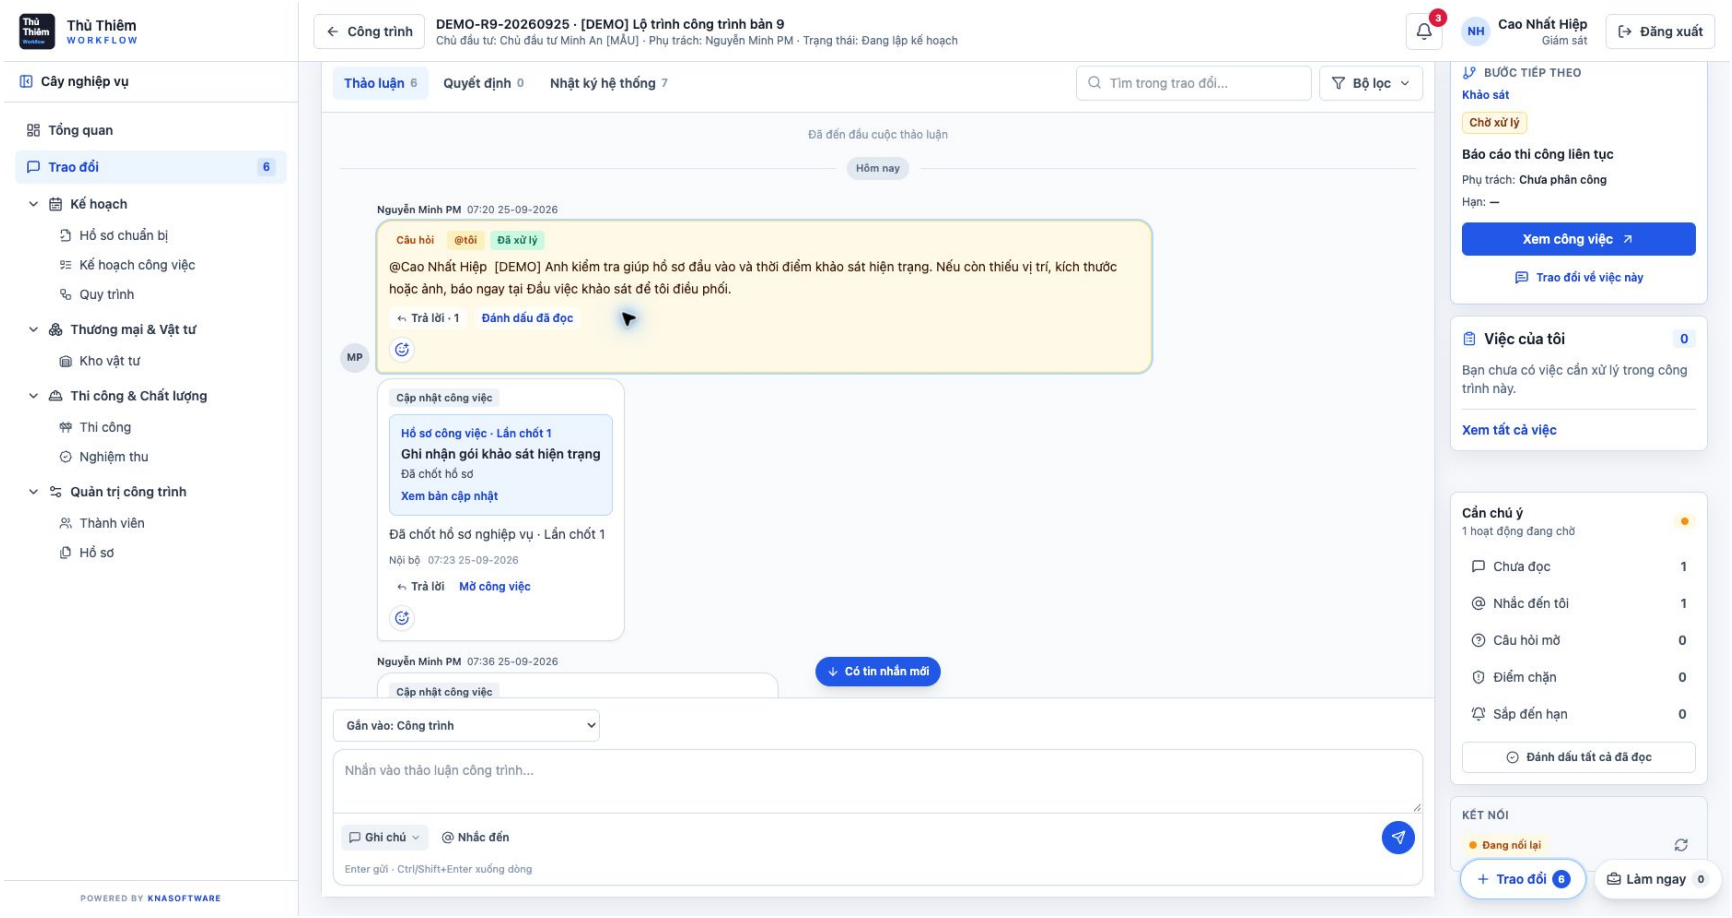


Ảnh 7i · Giám sát trả lời trực tiếp câu hỏi PM và đánh dấu đã xử lý, thay vì để màn Trao đổi trống.

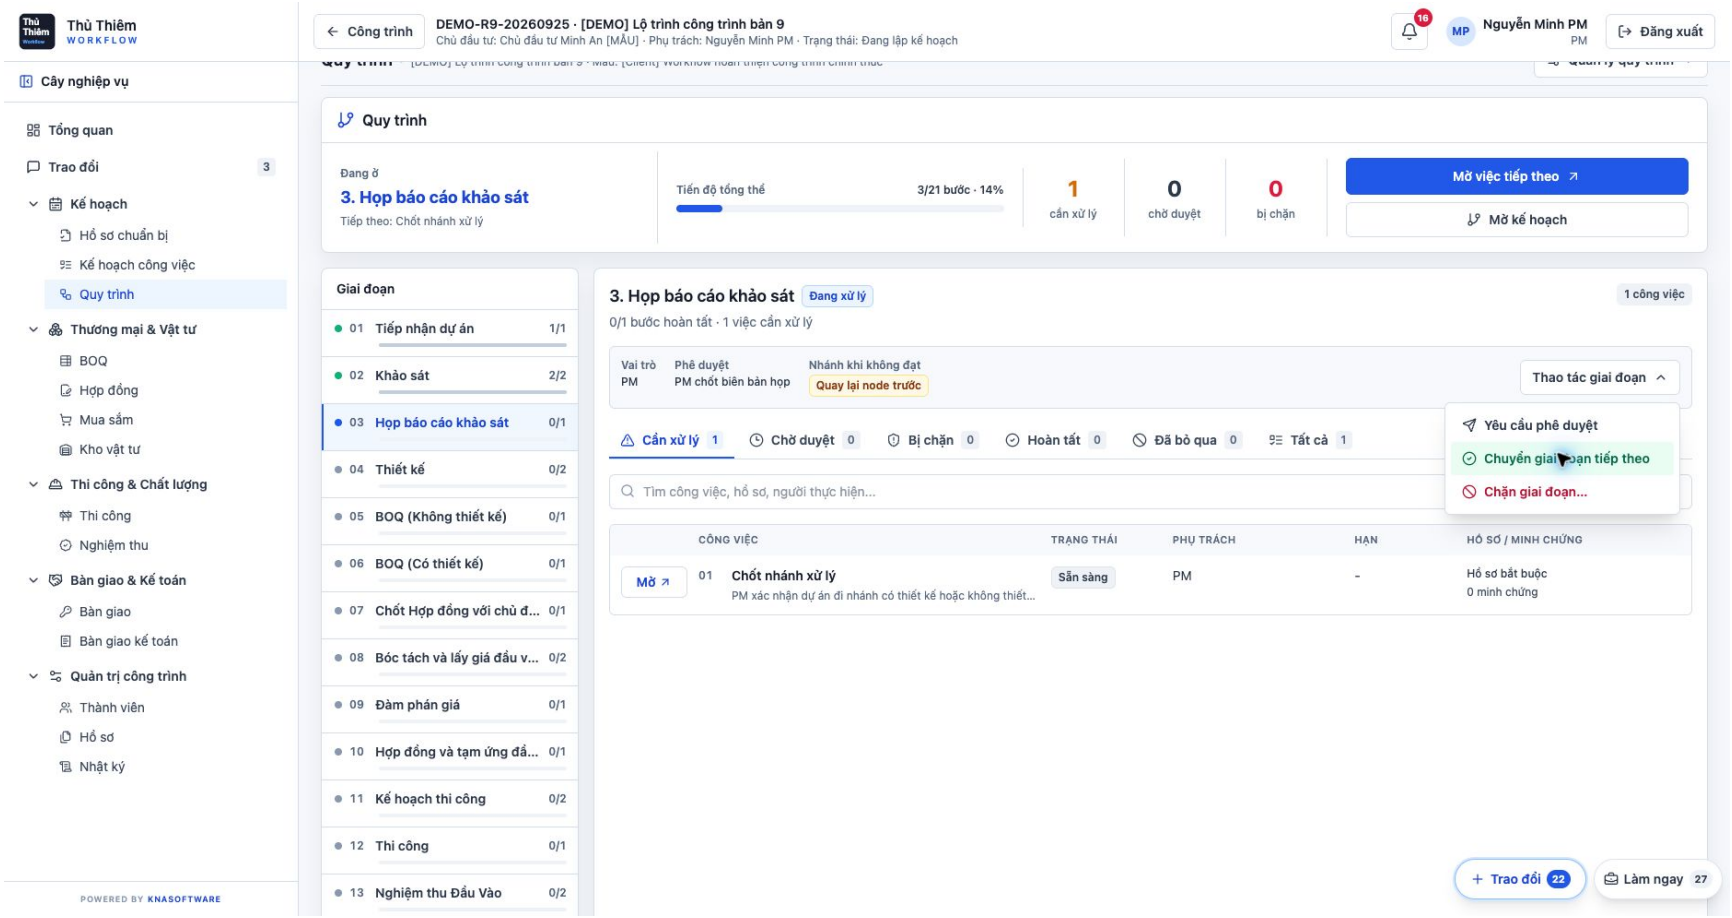


Ảnh 7j · Sau khi Giám sát duyệt, PM chọn chuyển Giai đoạn; việc Chốt nhánh xử lý mở ở Giai đoạn 03.

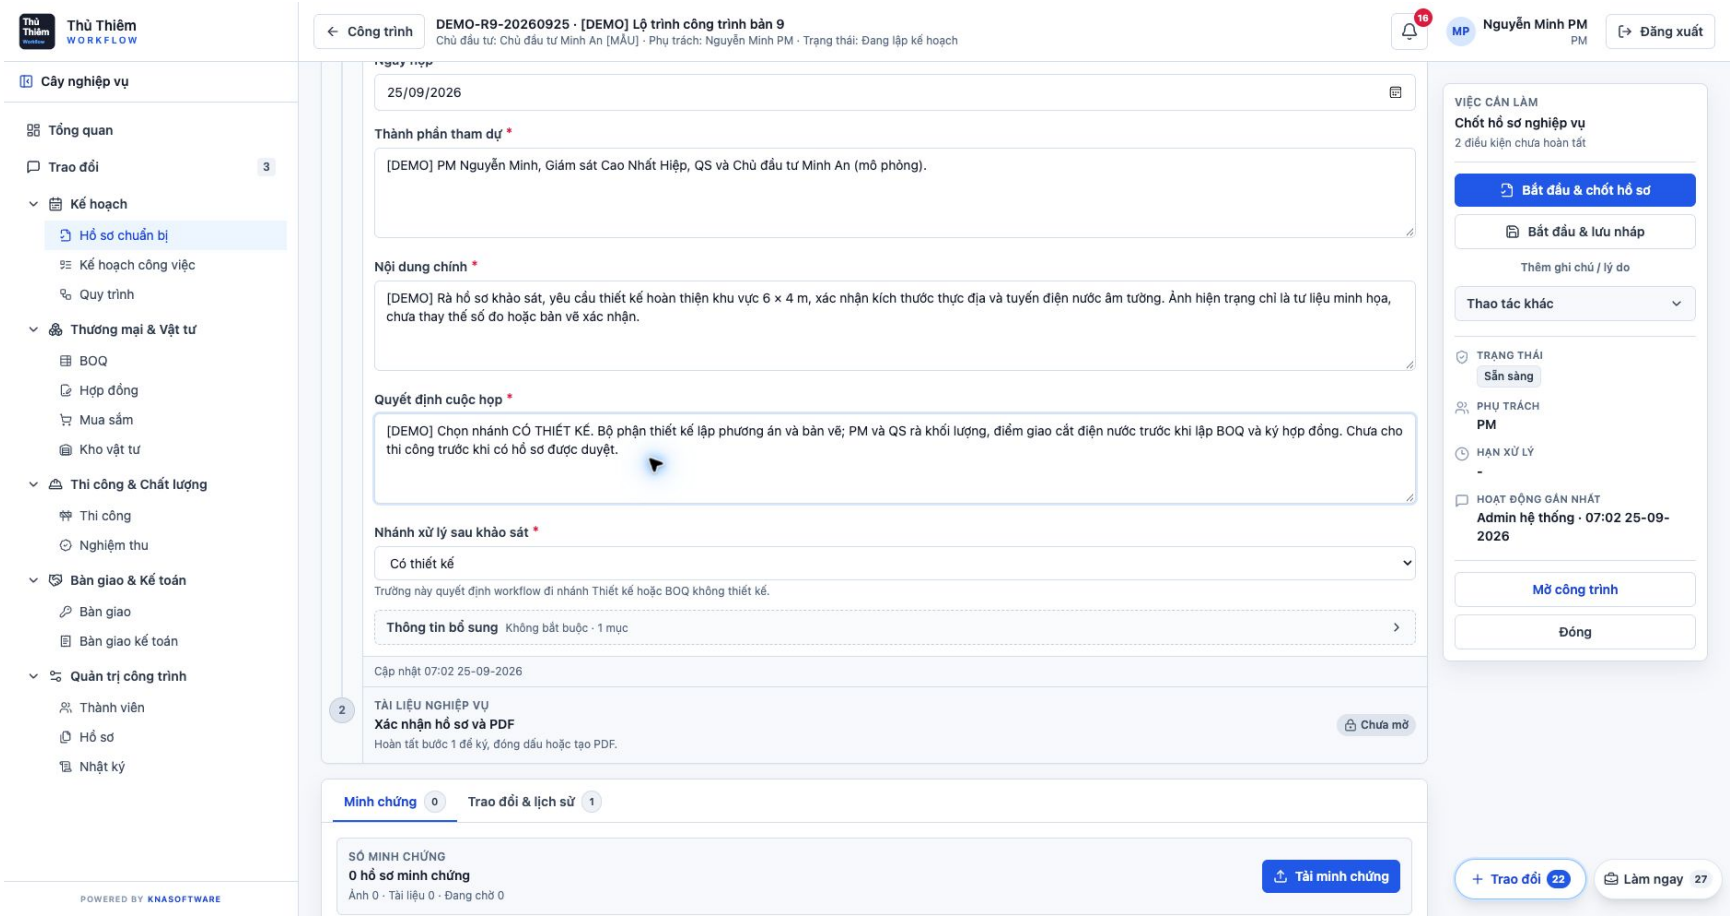


Ảnh 7k · Biên bản họp ghi người tham dự, nội dung, quyết định và nhánh Có thiết kế trước khi chốt hồ sơ.

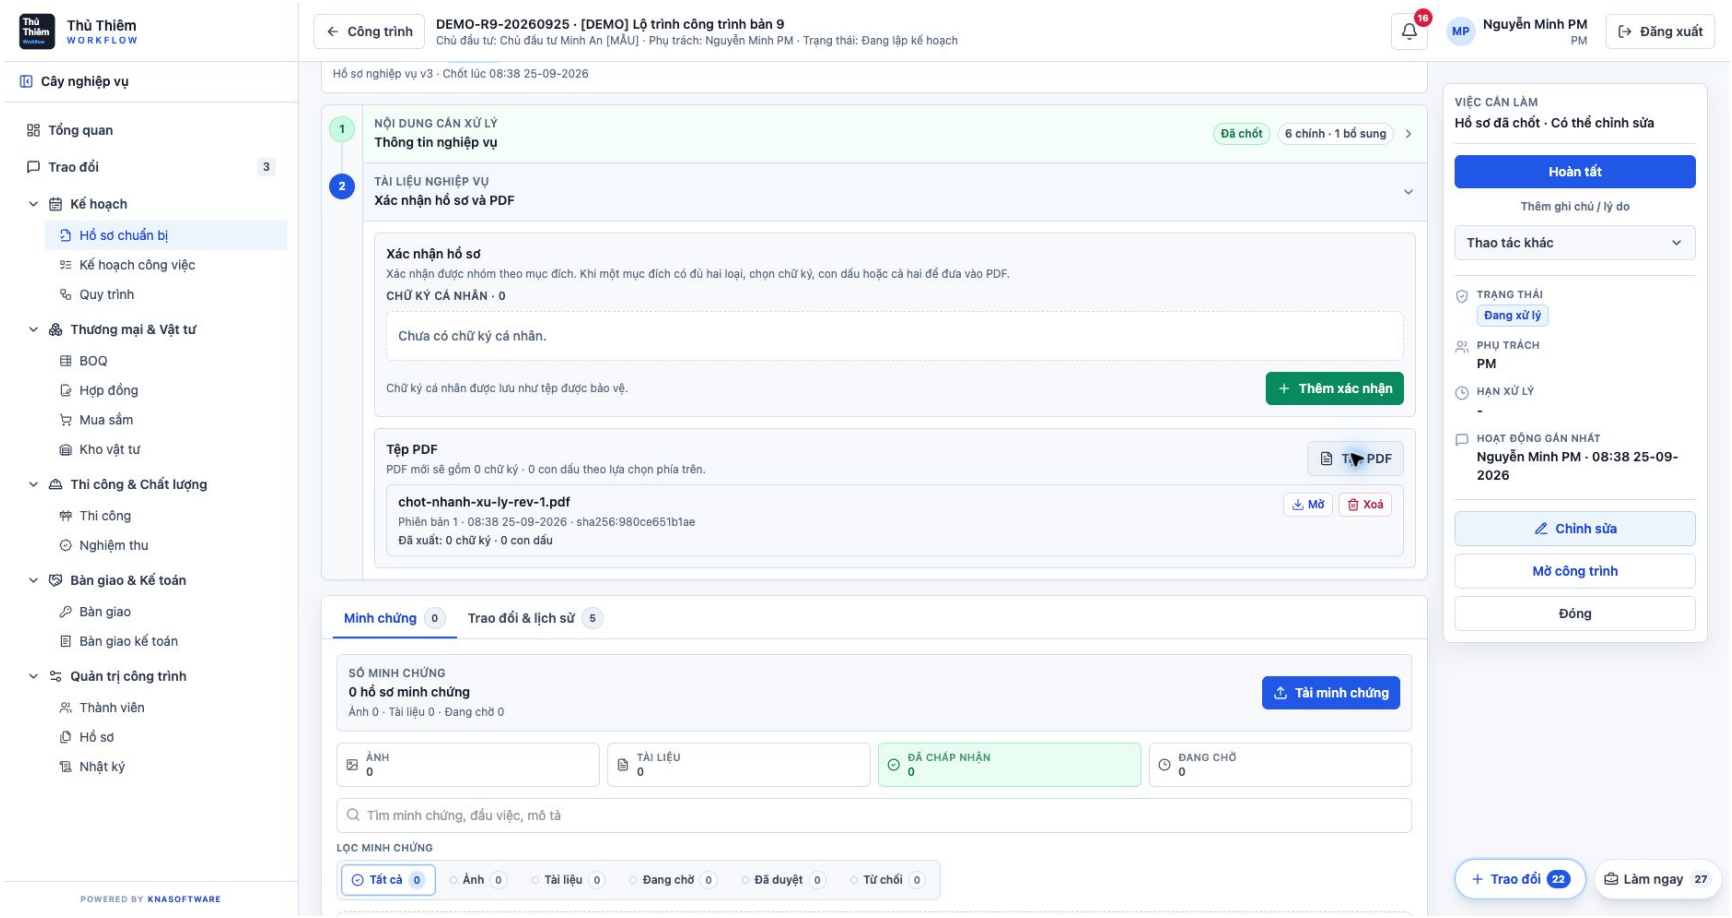


Ảnh 7l · PDF được tạo từ hồ sơ đã chốt; trên ảnh ghi 0 chữ ký, 0 con dấu, vì lượt mô phỏng chưa có xác nhận ký/đóng dấu.

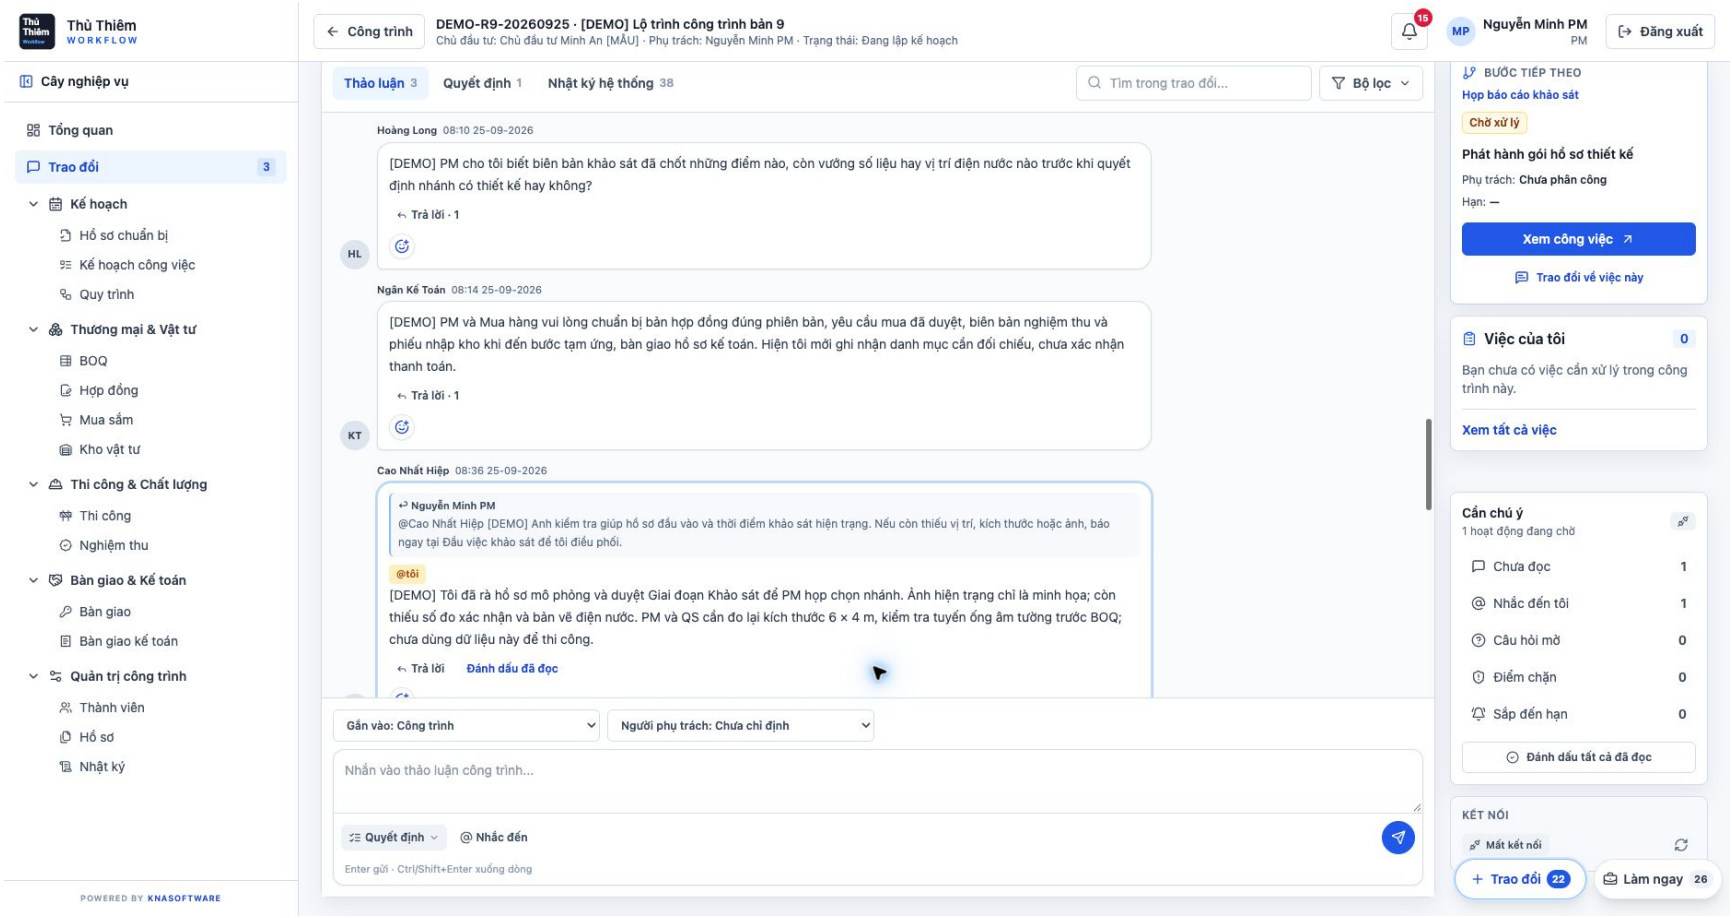


Ảnh 7m · Cùng một dòng Trao đổi có câu hỏi của Giám đốc, yêu cầu hồ sơ của Kế toán và câu trả lời của Giám sát. PM đã trả lời hai câu hỏi và gửi một tin loại Quyết định về nhánh Có thiết kế; ảnh chụp này đang ở đoạn trước của dòng, chưa hiện ô quyết định.

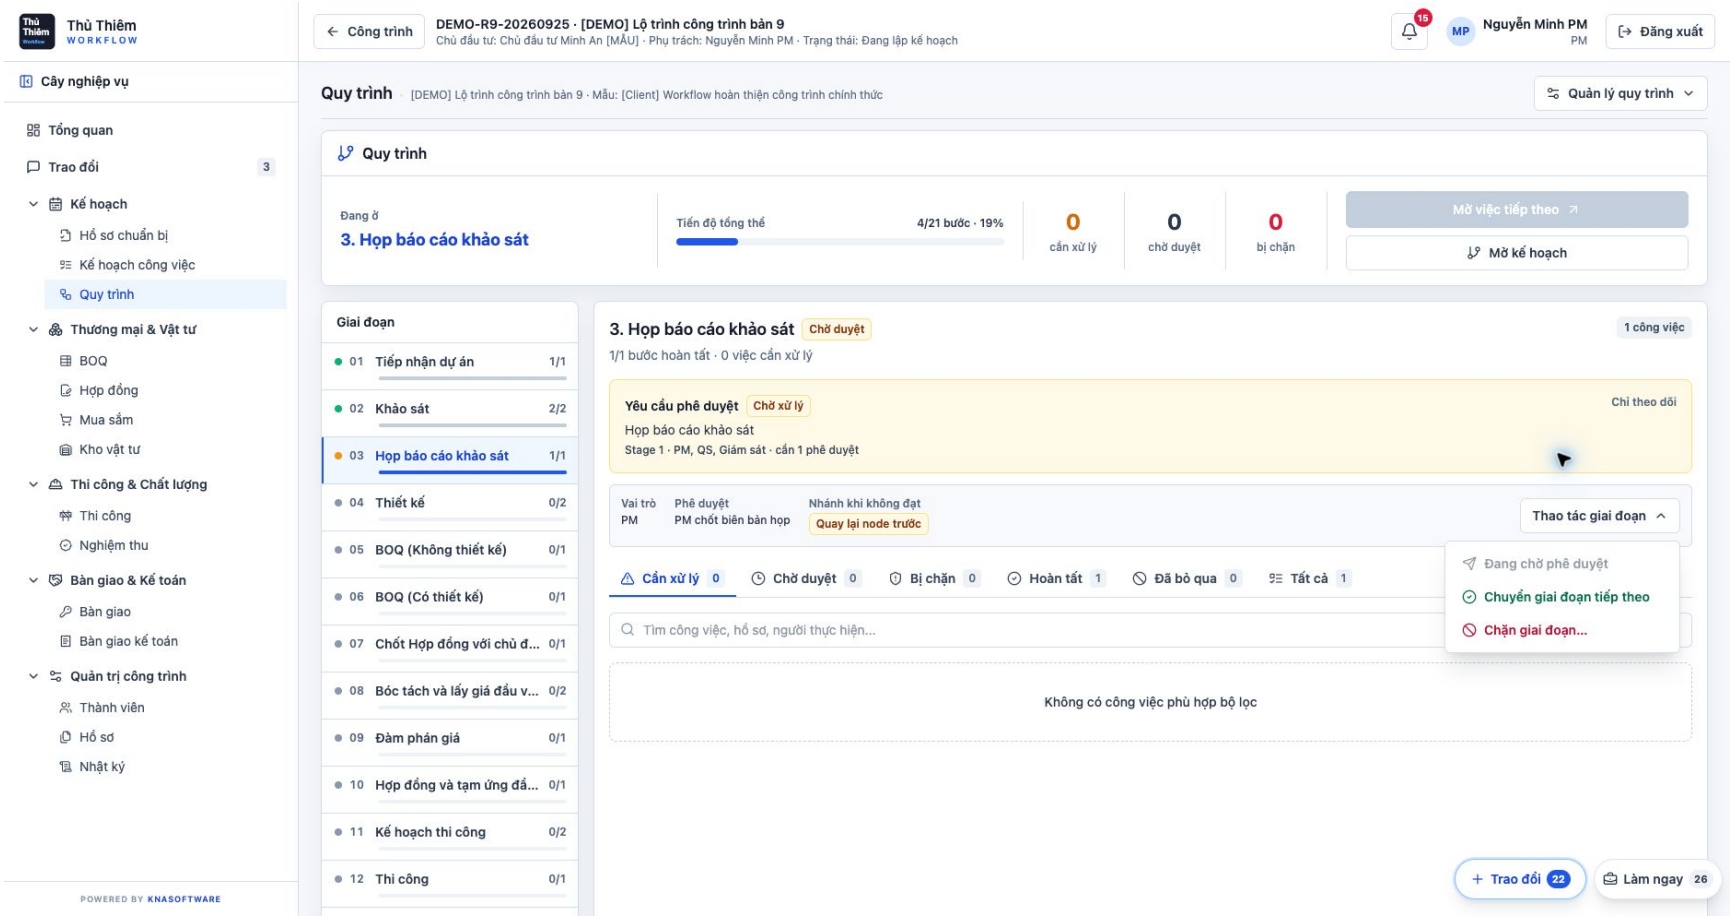


Ảnh 7n · PM gửi yêu cầu phê duyệt sau khi gói họp 1/1 đã hoàn tất; PM nhìn thấy trạng thái Chỉ theo dõi.

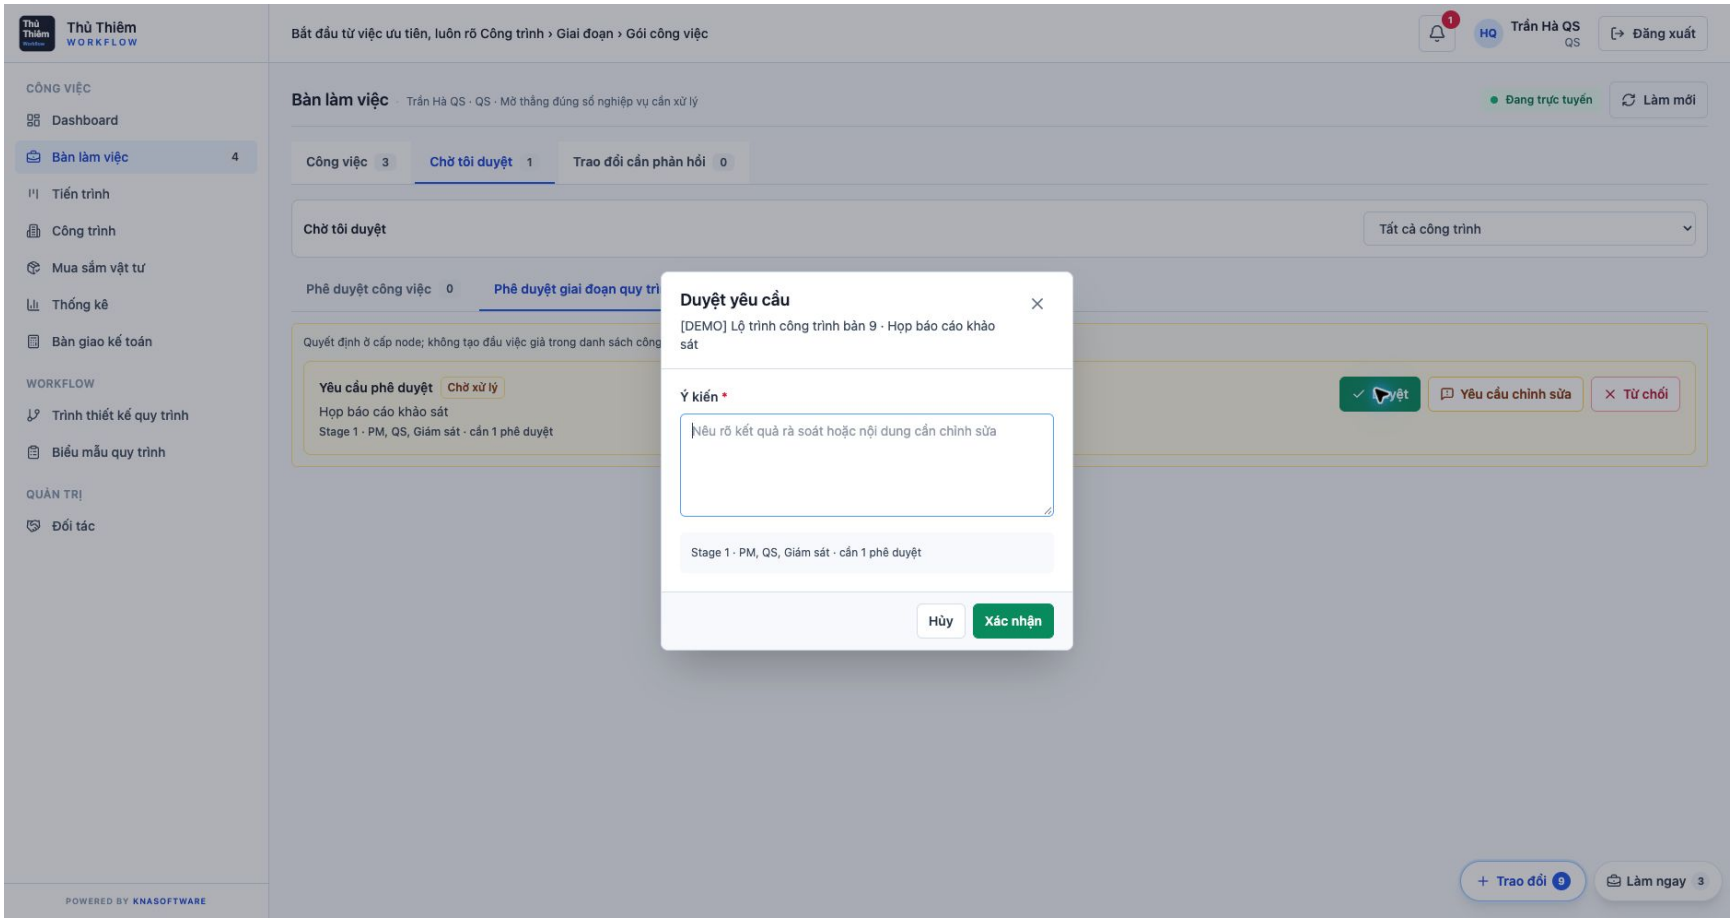


Ảnh 7o · QS mở hộp duyệt biên bản họp từ hàng Chờ tôi duyệt. Sau ảnh này, QS đã ghi ý kiến về điều kiện kiểm tra kích thước và tuyến điện nước trước BOQ rồi xác nhận; hàng chờ về 0.

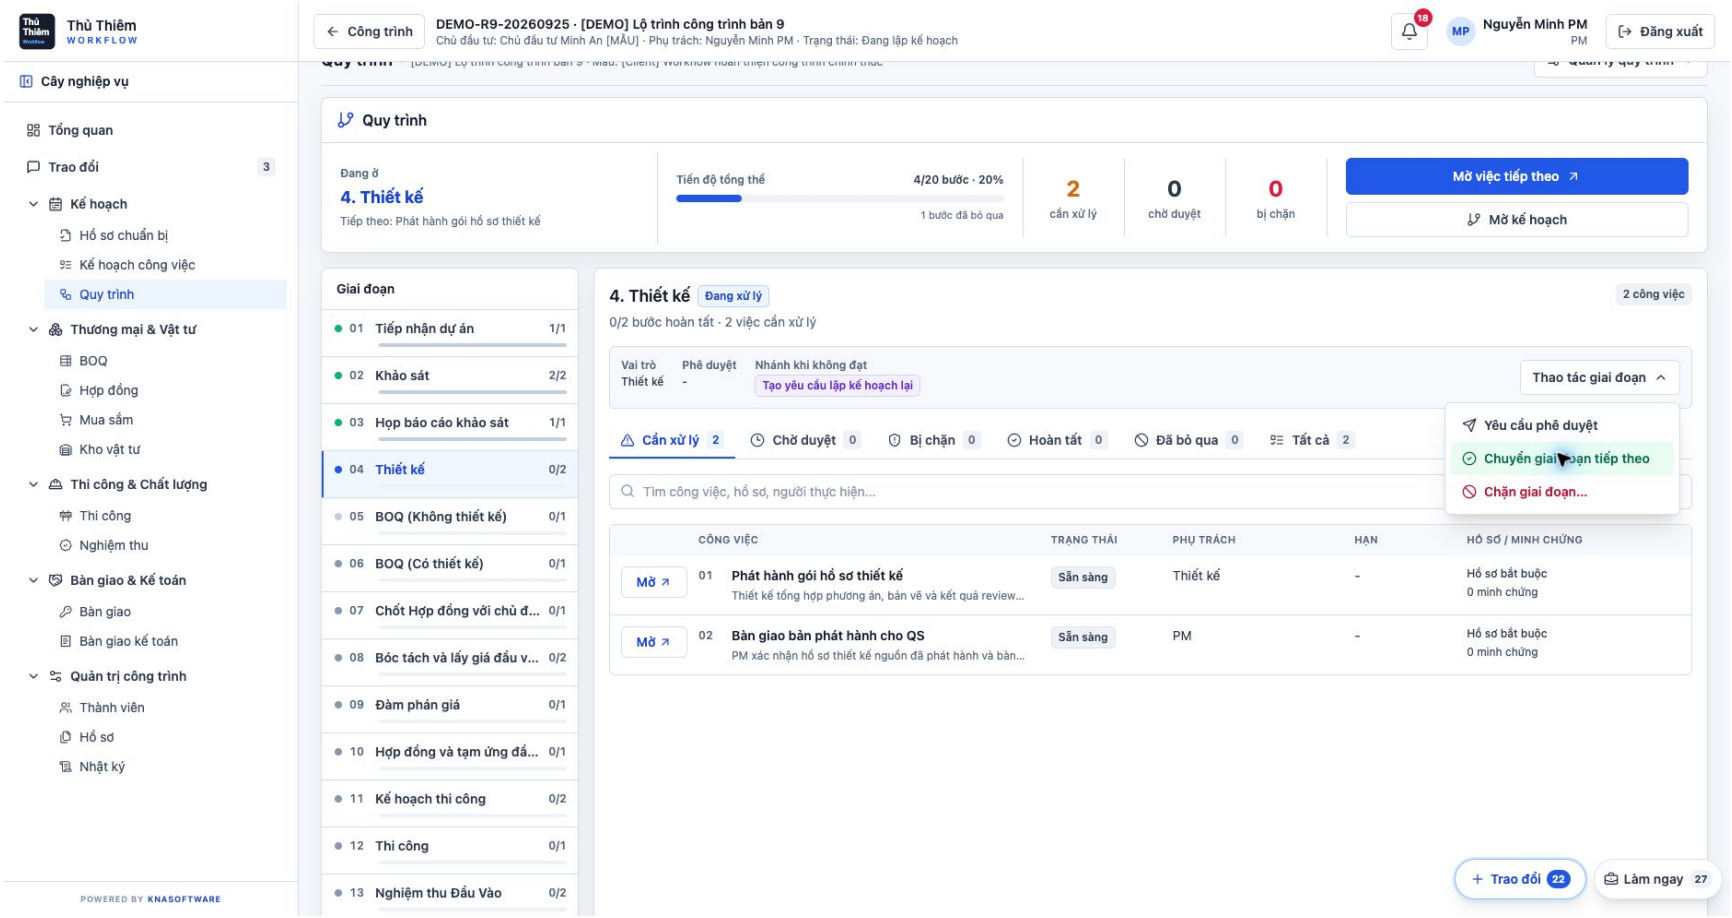


Ảnh 7p · Giai đoạn 04 Thiết kế đang xử lý, BOQ không thiết kế đã bỏ qua; tiến độ hiển thị 4/20 gói trong nhánh đã chọn.

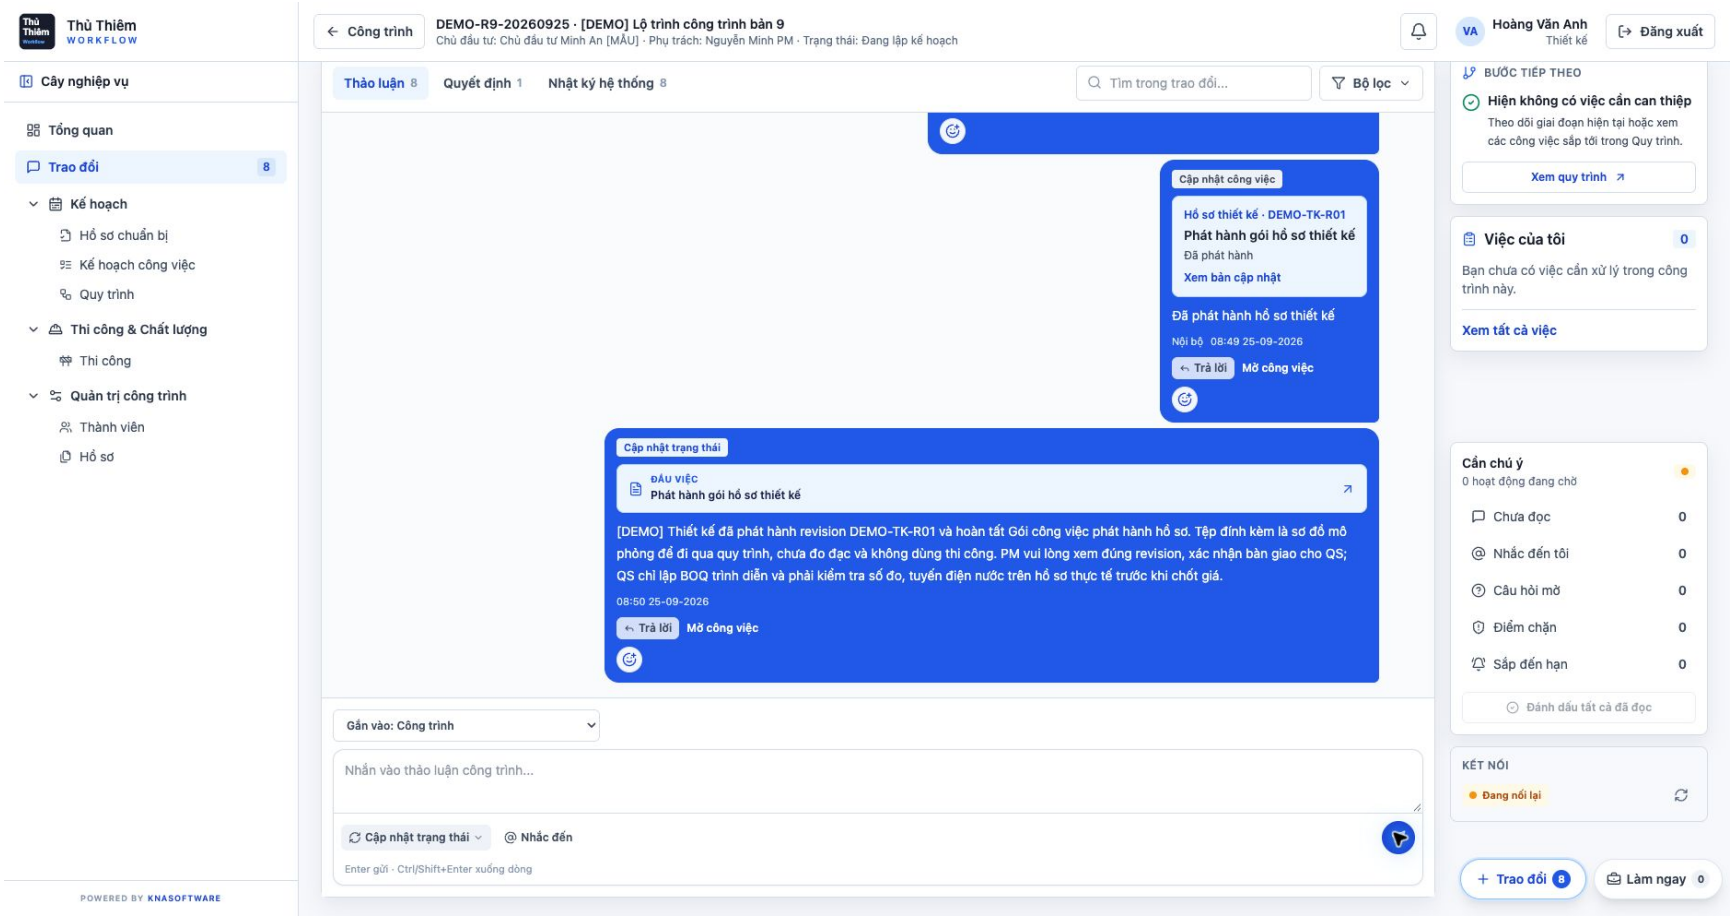


Ảnh 7q · Hoàng Văn Anh dùng đúng tài khoản Thiết kế để báo bản DEMO-TK-R01 đã phát hành, kèm giới hạn của sơ đồ mô phỏng.

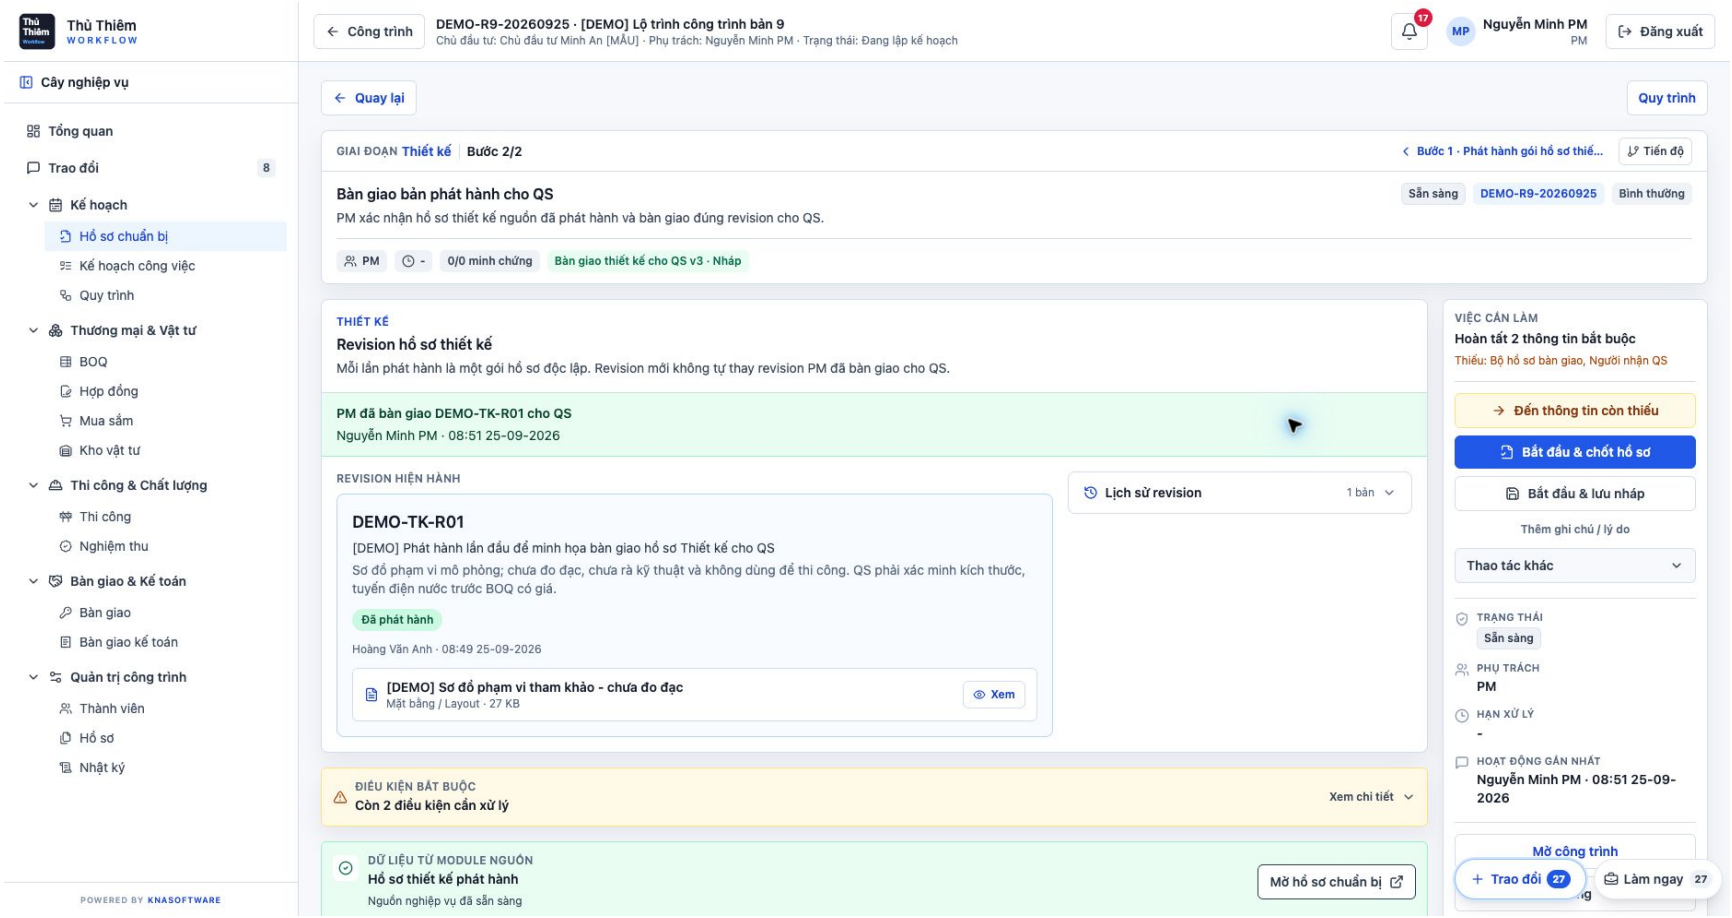


Ảnh 7r · PM xác nhận bàn giao chính revision đã phát hành cho QS; bước này tách khỏi việc Thiết kế tự phát hành.

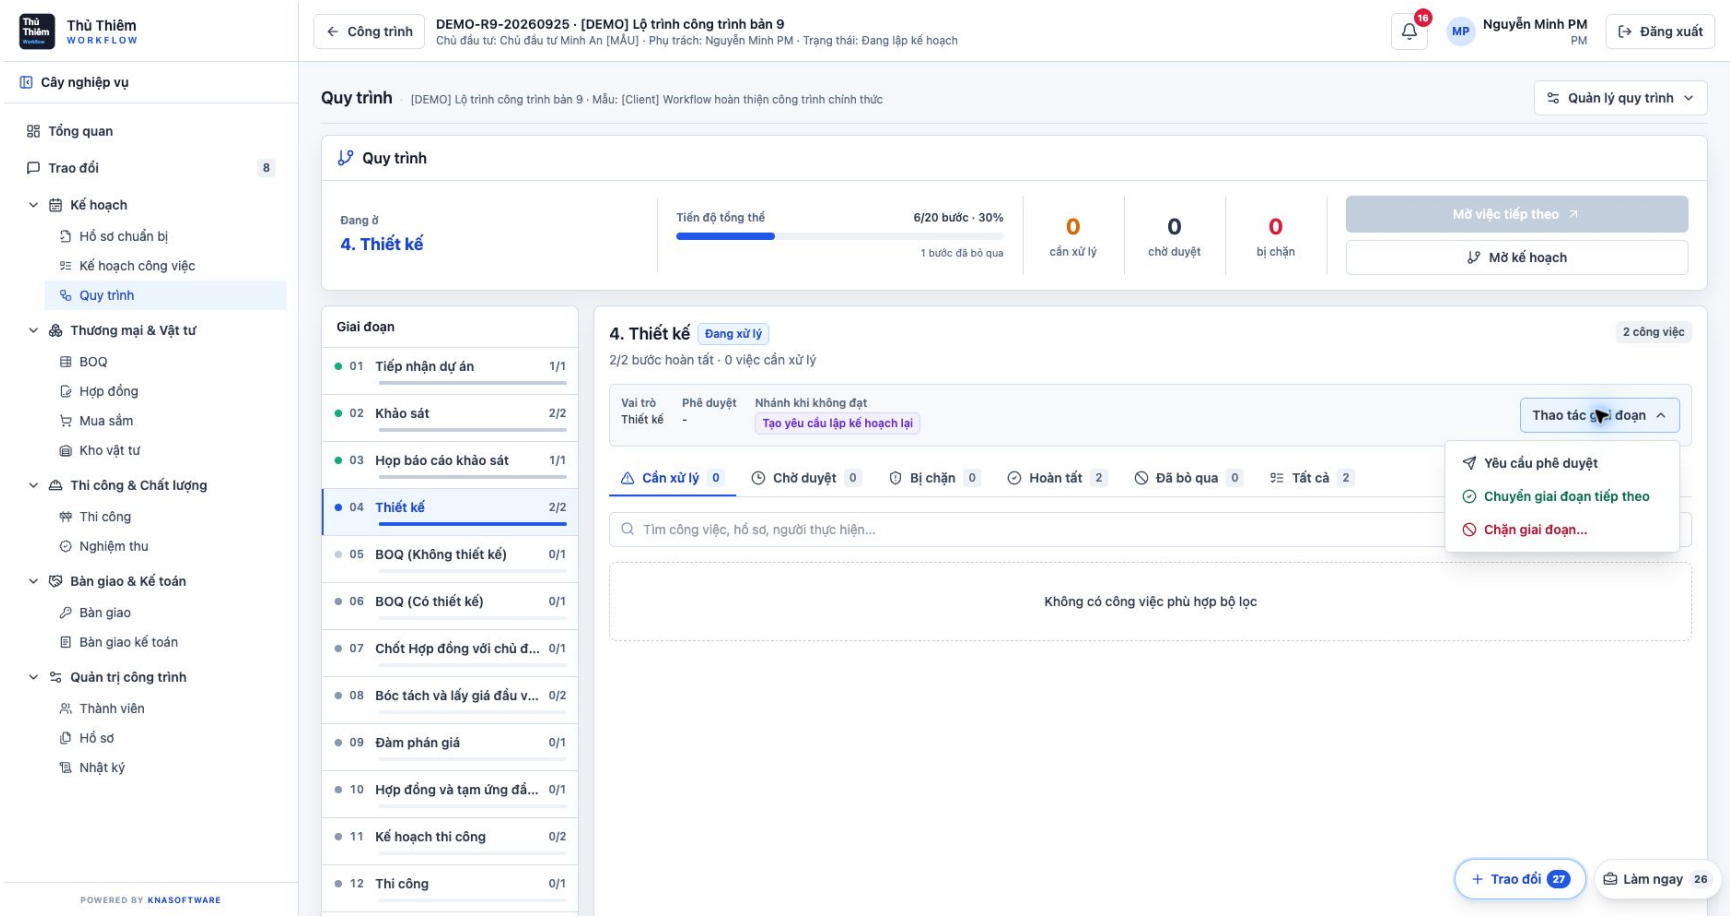


Ảnh 7s · Giai đoạn 04 đạt 2/2, tiến độ 6/20 trước khi PM chuyển sang BOQ có thiết kế.

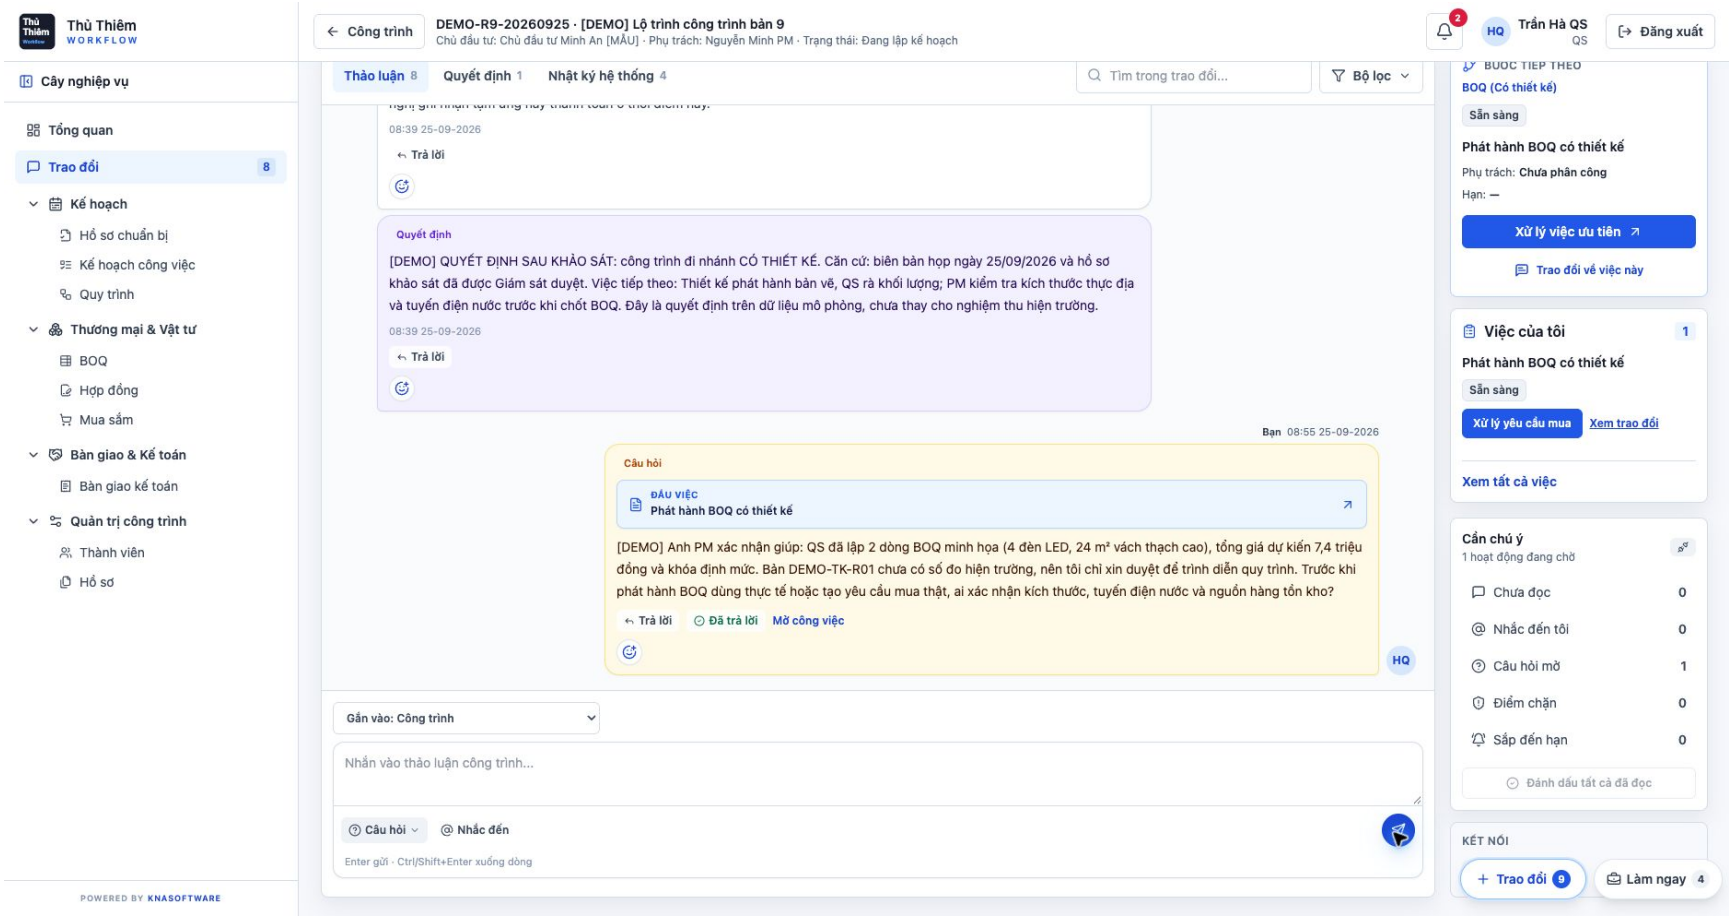


Ảnh 7t · QS đặt câu hỏi gắn Đầu việc BOQ; PM trả lời trách nhiệm đo lại, phát hành thiết kế mới khi cần, kiểm tồn kho và mua phần thiếu.

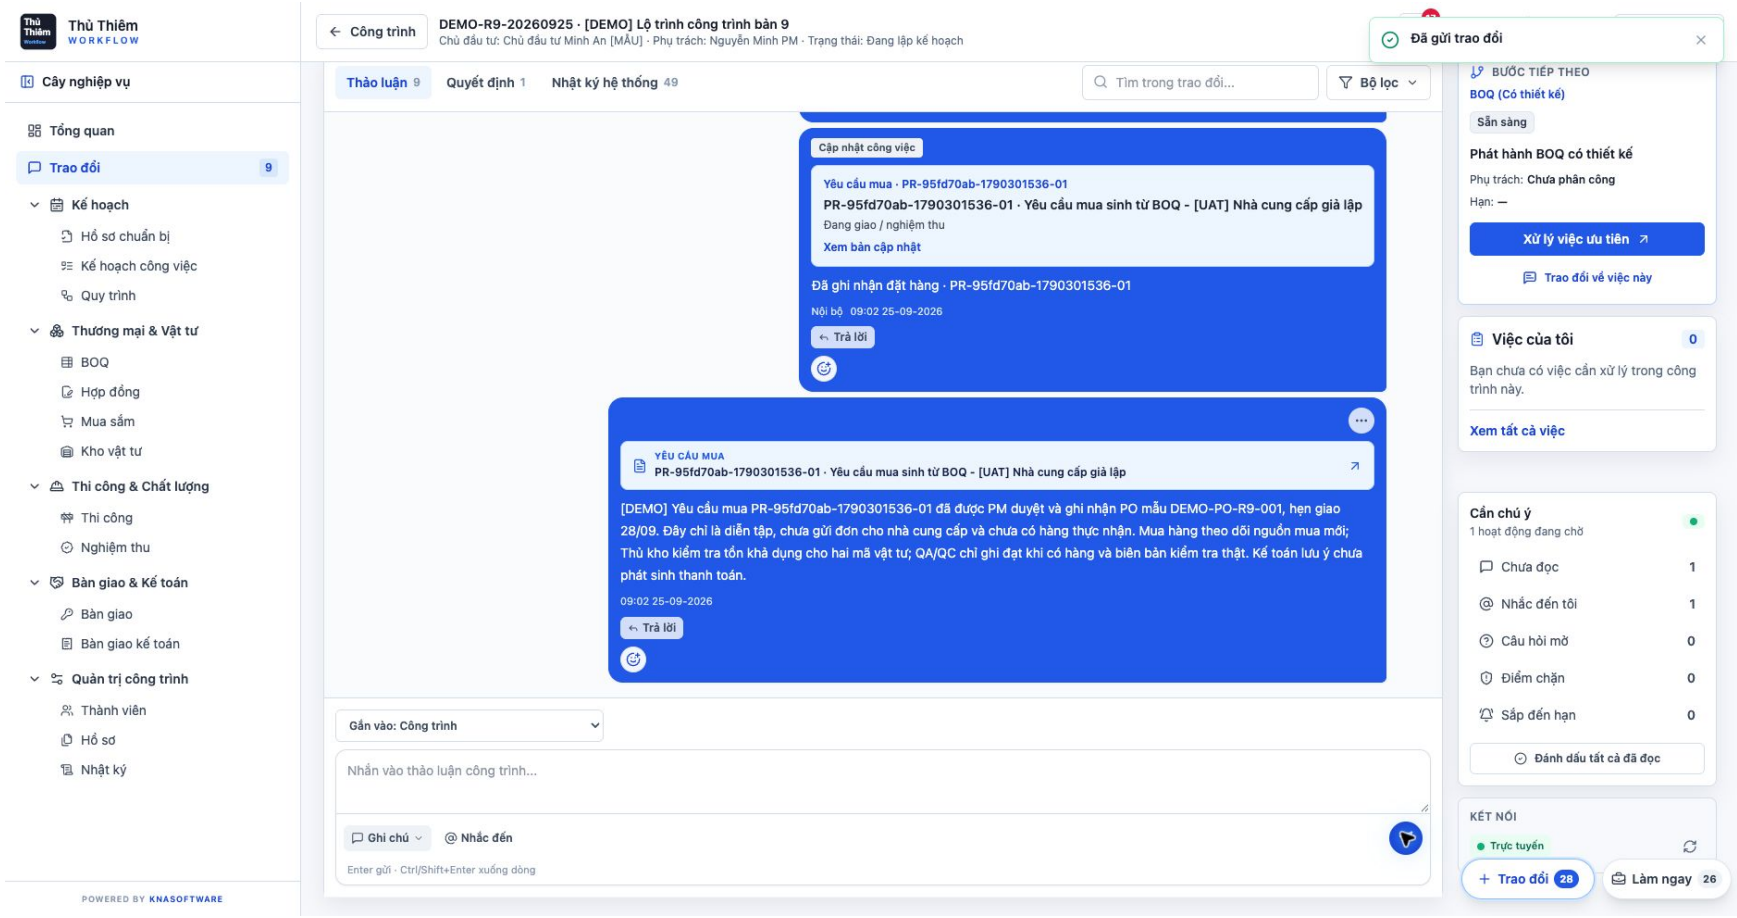


Ảnh 7u · Yêu cầu mua và PO mô phỏng xuất hiện trong Trao đổi, cùng lời PM nêu rõ chưa có hàng thực nhận hoặc thanh toán.

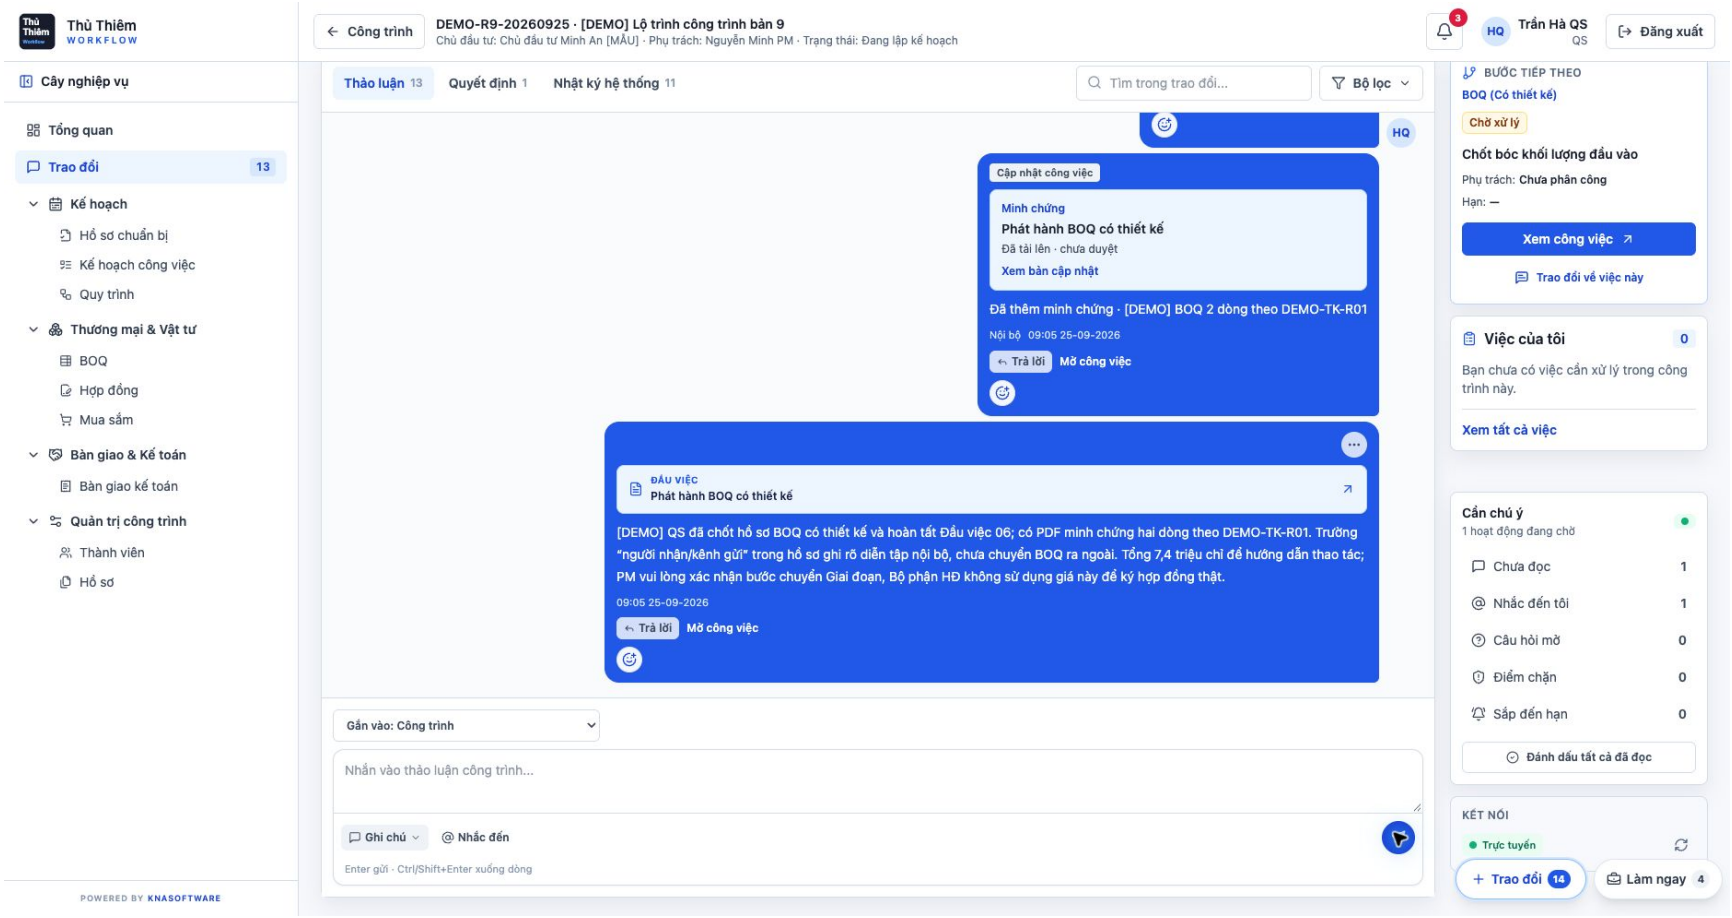


Ảnh 7v · QS chốt Gói BOQ bằng hồ sơ, PDF và minh chứng [DEMO], sau đó báo PM chuyển Giai đoạn.

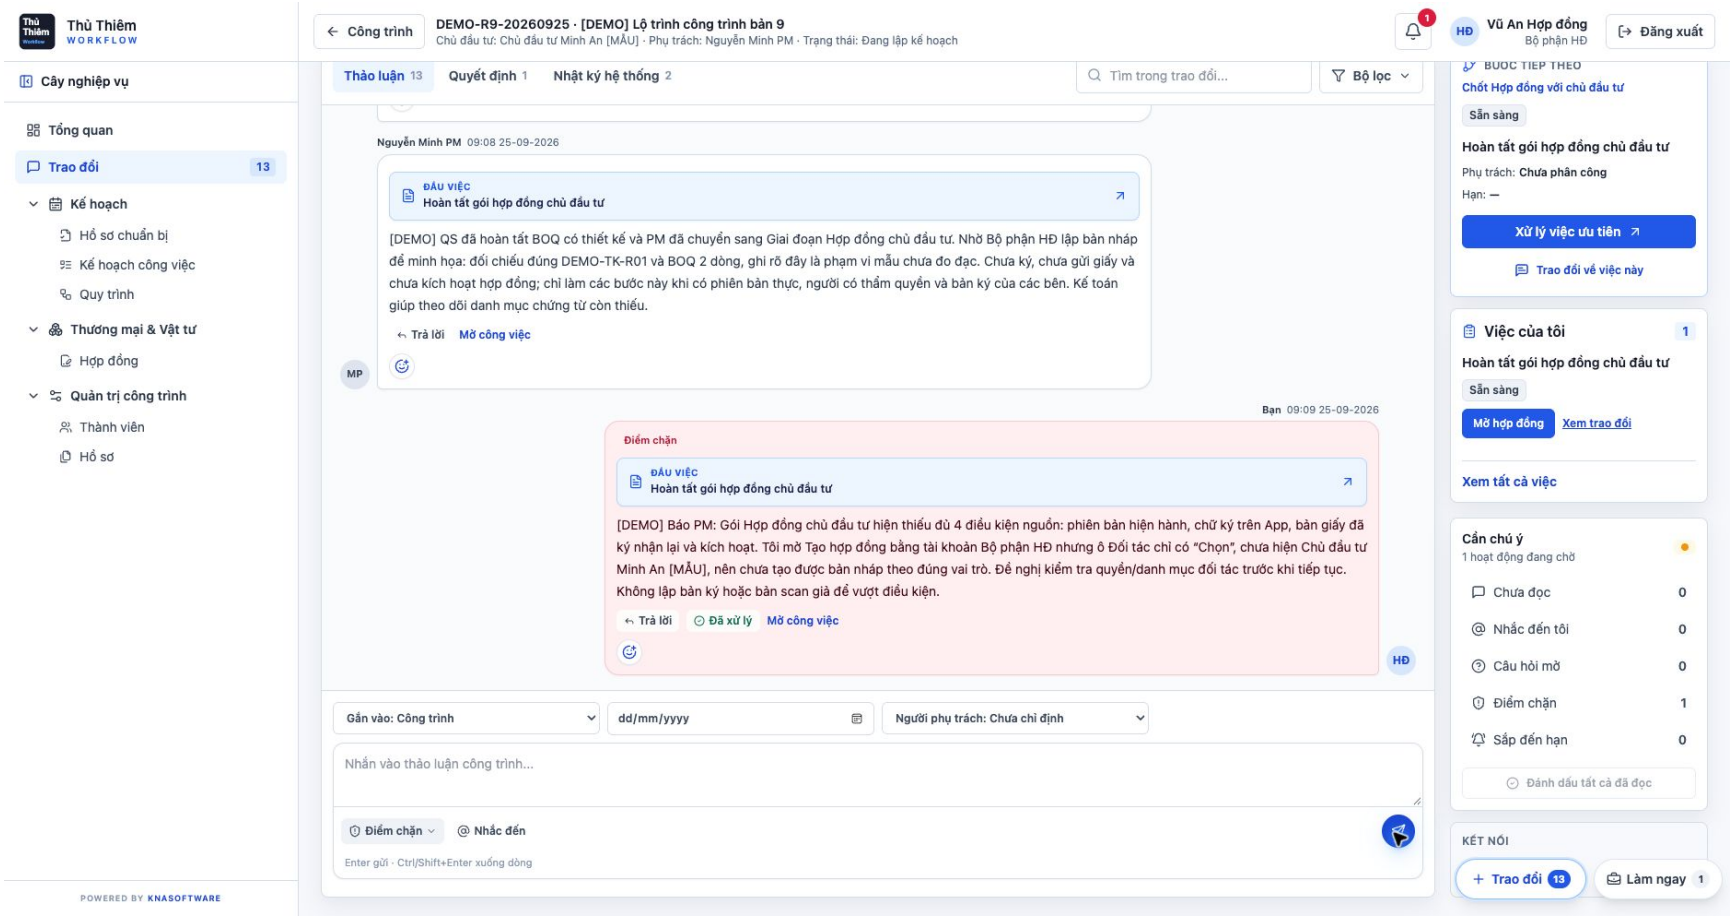

Ảnh 7w · Bộ phận HĐ báo bốn điều kiện hợp đồng còn thiếu và việc biểu mẫu chưa hiển thị đối tác cho tài khoản này. Tin **Điểm chặn** là thông tin điều phối, không thay cho hợp đồng đã ký.

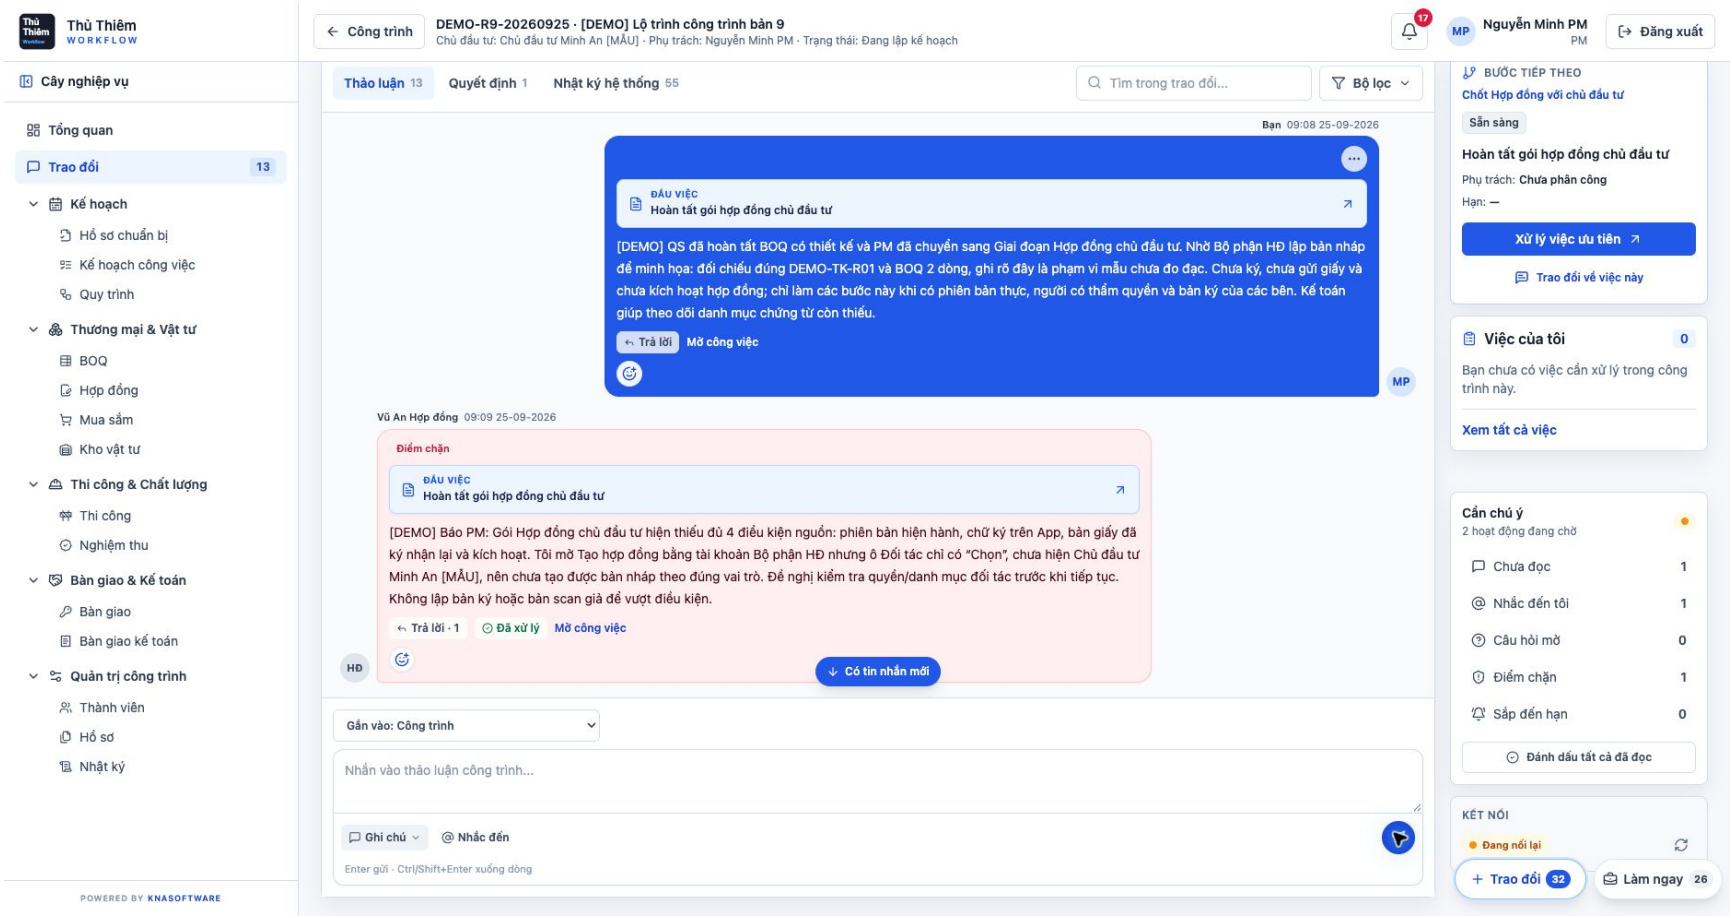

Ảnh 7x · PM giải thích đã tạo bản nháp bằng quyền PM và nhờ Bộ phận HĐ yêu cầu bổ sung hồ sơ; không đề nghị duyệt hoặc ký V1.

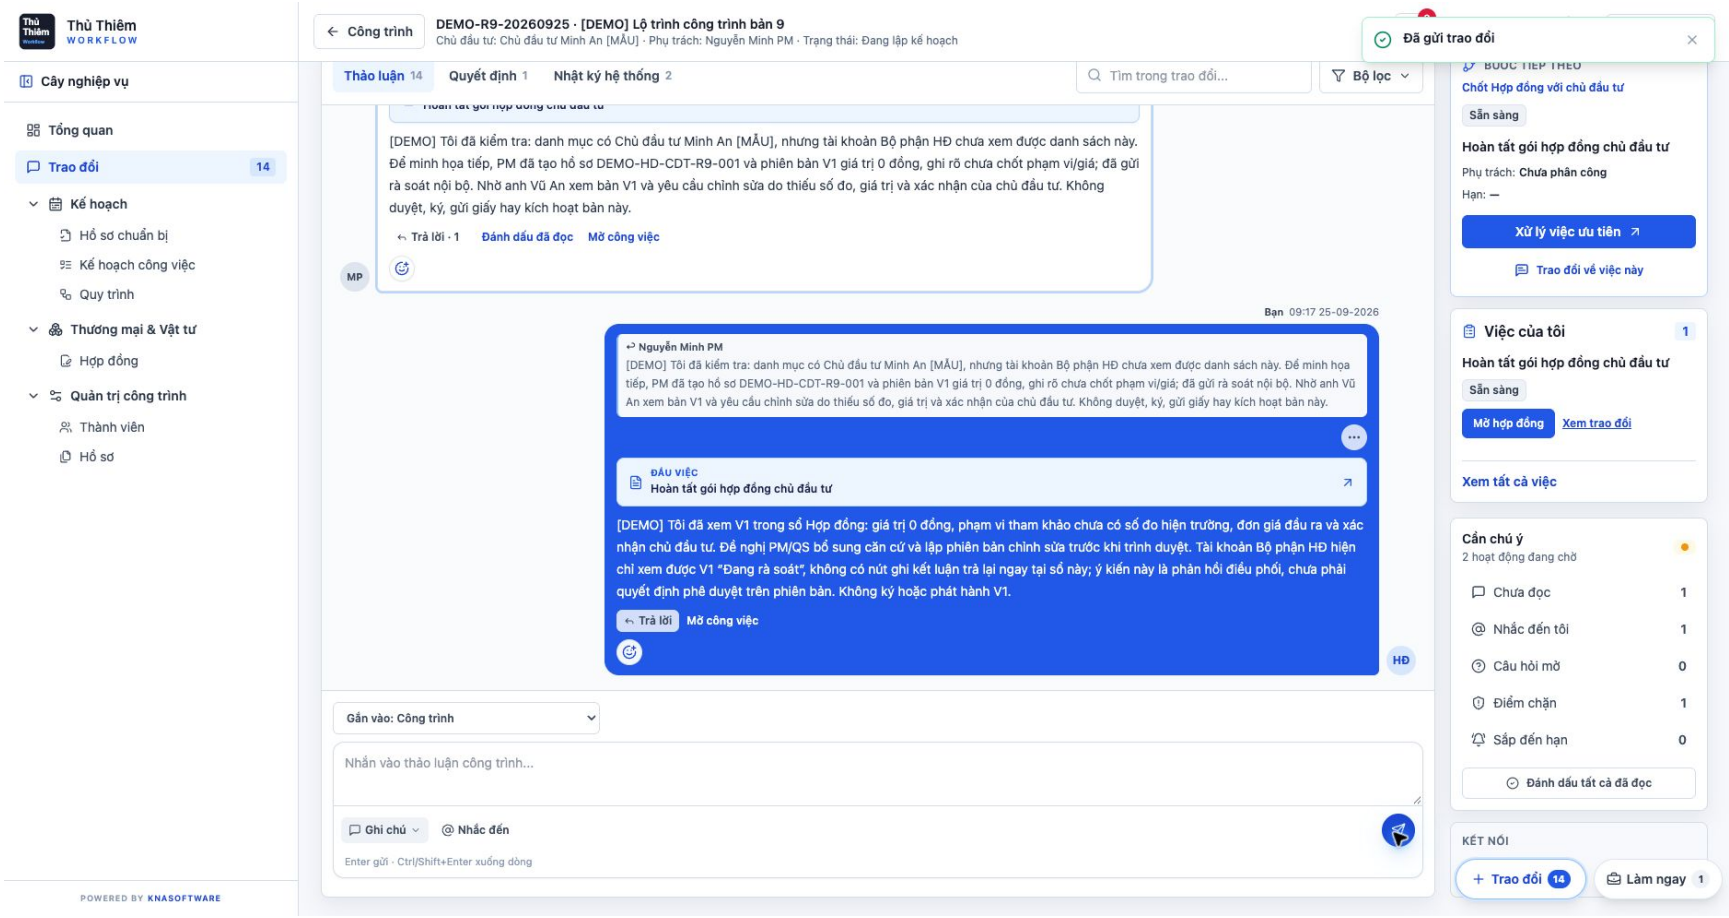

Ảnh 7y · Bộ phận HĐ nêu ba căn cứ còn thiếu ngay trong chuỗi Trao đổi. Đây không phải nút trả lại chính thức trên phiên bản hợp đồng.

Trạng thái đã kiểm chứng: công trình Rev9 hiện **7/20 Gói công việc hoàn tất, Giai đoạn 07 Hợp đồng chủ đầu tư đang xử lý**. V1 là bản nháp **Đang rà soát**, chưa được duyệt hoặc ký. Các Giai đoạn Thi công, Nghiệm thu và Bàn giao chưa phát sinh trên chính công trình này; ảnh thuộc công trình mẫu khác được ghi rõ để người đọc không hiểu là kết quả của DEMO-R9-20260925.


5.2. Nội dung trao đổi khi phát sinh việc ở các Giai đoạn tiếp theo

Sau Hợp đồng, PM quay lại Trao đổi sau mỗi gói, mở việc ưu tiên kế tiếp, gửi lời nhắn gắn đúng Đầu việc, rồi lặp đến cuối nhánh. Các câu sau là **mẫu nội dung chưa gửi**: Mua hàng hỏi báo giá và nguồn vật tư; Giám sát báo Kiểm tra và Cần xử lý; Kế toán hỏi chứng từ còn thiếu lúc bàn giao. QS đã hỏi căn cứ BOQ và Bộ phận HĐ đã báo điểm chặn trên công trình tham chiếu; không ghi các câu mẫu thành lịch sử đã xảy ra.


Quy tắc xử lý: lời nhắn giúp điều phối; việc đổi trạng thái, kết luận đạt/không đạt, phê duyệt và tiếp nhận phải làm tại đúng hồ sơ theo quyền của người đang đăng nhập.

6. Xử lý việc ưu tiên và lặp cho đến hết nhánh Quy trình

Từ **Tổng quan › Xử lý việc ưu tiên**, hoặc từ **Trao đổi › Bước tiếp theo › Xử lý việc ưu tiên**, mở cùng việc hiện tại. Kiểm tra tiêu đề, Giai đoạn/Gói công việc, vai trò phụ trách, hồ sơ bắt buộc, minh chứng, điều kiện cần làm và nút hành động bên phải.

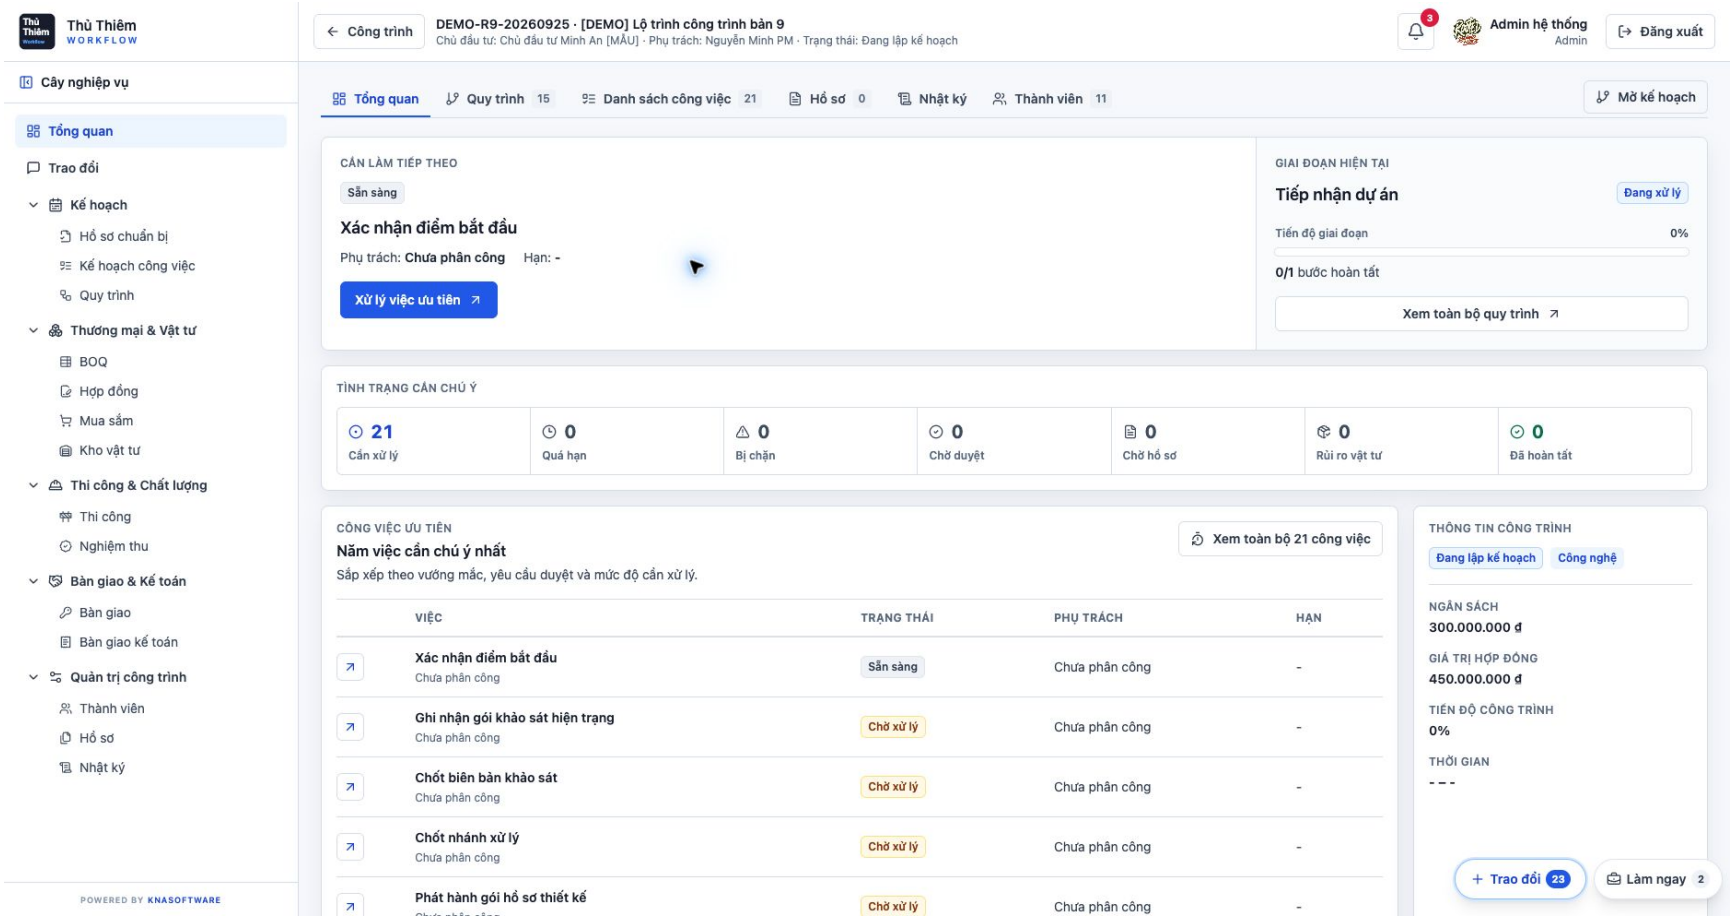

Ảnh 8 · Tổng quan của công trình mới, mở việc tiếp theo bằng Xử lý việc ưu tiên.

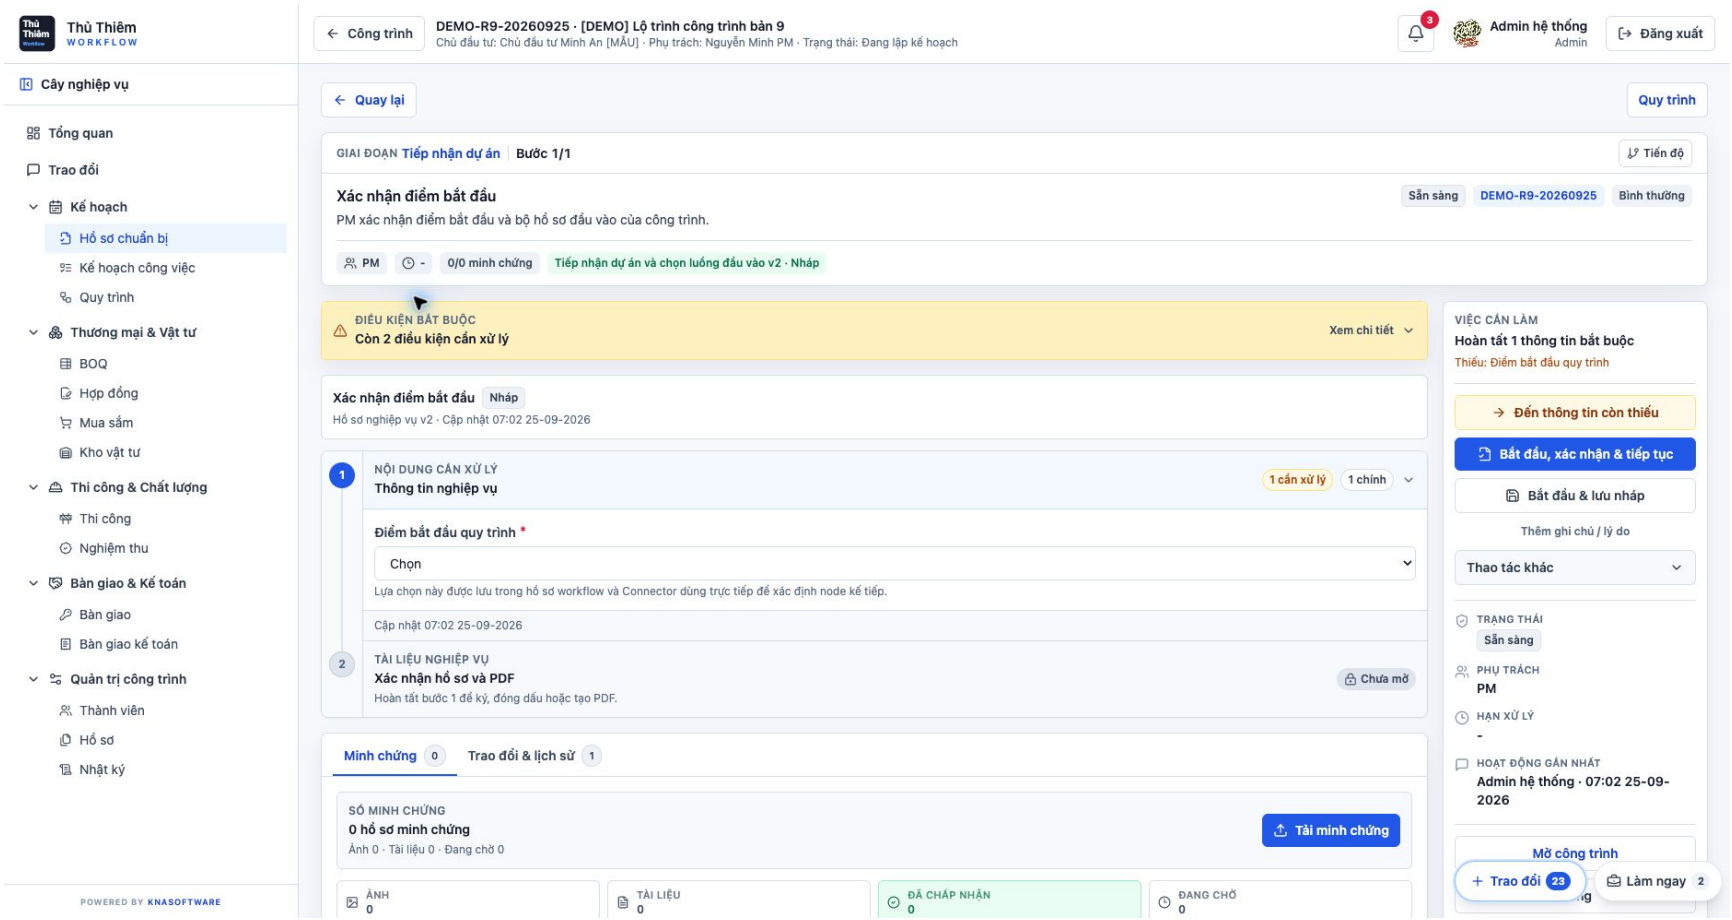

Ảnh 9 · Đầu việc đầu tiên "Xác nhận điểm bắt đầu" còn thiếu lựa chọn bắt buộc; PM cần ghi căn cứ, kiểm tra điều kiện rồi mới xác nhận. Mở xem không tự hoàn tất việc.

Vòng lặp cho mỗi Gói công việc	Người đang làm	Dấu hiệu cần kiểm tra
1. Mở việc ưu tiên hoặc chọn **Mở** ở Quy trình	Vai trò chính của gói	Đúng công trình, Giai đoạn và Đầu việc; việc đang được phép làm
2. Ghi thông tin, ảnh, biên bản hoặc xử lý tại hồ sơ nguồn	Người thực hiện	Hồ sơ được lưu/gửi; số liệu và minh chứng thuộc đúng nguồn

Vòng lặp cho mỗi Gói công việc	Người đang làm	Dấu hiệu cần kiểm tra
3. Trao đổi ngắn, nêu câu hỏi hoặc điểm chặn	PM, Giám sát, QS, Kế toán... theo tình huống	Tin được gắn đúng việc/hồ sơ; không xem lời nhắn là quyết định duyệt
4. Mời rà soát/duyệt Giai đoạn khi phù hợp	Người gửi yêu cầu	Tại công trình Rev9, PM đã gửi yêu cầu ở Khảo sát 2/2 và Họp báo cáo khảo sát 1/1; mỗi yêu cầu được người khác có quyền xét duyệt
5. Người có quyền kết luận hoặc yêu cầu bổ sung	Người duyệt/rà soát khác người gửi khi chính sách yêu cầu	Có ý kiến, trạng thái và lịch sử; nếu cần sửa thì quay lại bước 2
6. **Hoàn tất** Đầu việc; chuyển Giai đoạn khi đã đủ điều kiện	Người có quyền thao tác	Không còn hồ sơ nguồn, ảnh, phê duyệt hoặc việc mở đang chặn; mở **Quy trình › Thao tác giai đoạn › Chuyển giai đoạn tiếp theo** theo quyền, rồi quay về Trao đổi. Hai Đầu việc Khảo sát hoàn tất **không tự chuyển** Giai đoạn.

Trạng thái công trình tham chiếu trong ảnh: 01 Tiếp nhận dự án, 02 Khảo sát, 03 Họp báo cáo khảo sát, 04 Thiết kế và 06 BOQ có thiết kế đã hoàn tất. Nhánh 05 không thiết kế đã bỏ qua, tiến độ **7/20**. Giai đoạn 07 đang xử lý hợp đồng; các ảnh Thi công, Nghiệm thu, Bàn giao, Bàn giao kế toán bên dưới thuộc công trình mẫu khác. Giám sát duyệt Khảo sát, QS duyệt biên bản họp, PM duyệt các dòng BOQ và yêu cầu mua; PM chuyển Giai đoạn bằng thao tác riêng. Người duyệt cần xem cả hồ sơ và minh chứng [DEMO] trước khi quyết định.

6.1. Các Gói công việc trong mẫu bản 9

Giai đoạn	Gói công việc cần thực hiện	Mục đích / chức năng của người làm	Vai trò chính
01	Xác nhận điểm bắt đầu	PM xác nhận hồ sơ đầu vào và điểm bắt đầu	PM
02	Ghi nhận gói khảo sát hiện trạng	Ghi yêu cầu, kích thước, rủi ro, ảnh hiện trường	Giám sát
02	Chốt biên bản khảo sát	Tập hợp kết quả và các điểm cần xử lý tiếp	PM
03	Chốt nhánh xử lý	Chọn Có thiết kế hoặc Không thiết kế từ biên bản	PM
04	Phát hành gói hồ sơ thiết kế	Tổng hợp phương án, bản vẽ, kết quả rà soát	Thiết kế
04	Bàn giao bản phát hành cho QS	Xác nhận đúng bản đã phát hành để QS lập BOQ	PM
05*	Phát hành BOQ không thiết kế	Chốt BOQ và căn cứ gửi chủ đầu tư	QS
06*	Phát hành BOQ có thiết kế	Chốt BOQ theo thiết kế đã bàn giao	QS
07	Hoàn tất gói hợp đồng chủ đầu tư	Điều phối bản hợp đồng, ký và hồ sơ giấy	Bộ phận HĐ
08	Chốt bóc khối lượng đầu vào	Xác nhận BOQ dùng cho mua hàng	QS
08	Hoàn tất lấy giá nhà cung cấp	Tập hợp báo giá đủ điều kiện	Mua hàng
09	Chốt lựa chọn giá đầu vào	Lưu căn cứ đàm phán và chọn giá	Mua hàng
10	Hoàn tất gói hợp đồng đầu vào	Chốt yêu cầu mua được duyệt và hợp đồng liên quan	Mua hàng
11	Lập gói kế hoạch thi công	Biên bản triển khai, danh sách kiểm tra chất lượng	PM
11	Kích hoạt bàn giao thi công	Giao hạng mục, tiêu chí kiểm tra ra hiện trường	PM
12	Báo cáo thi công liên tục	Nhật ký, tiến độ, vấn đề, ảnh và minh chứng	Giám sát
13	Nghiệm thu gói thầu phụ và khối lượng	Đối chiếu danh mục kiểm tra, khối lượng thầu phụ	QS
13	Nghiệm thu vật tư đầu vào	Kết luận chất lượng vật tư trước nhập kho	QA/QC


Giai đoạn	Gói công việc cần thực hiện	Mục đích / chức năng của người làm	Vai trò chính
14	Chốt gói nghiệm thu cuối	Đối chiếu chủ đầu tư và kết luận hồ sơ cuối	QA/QC
15	Hoàn tất bàn giao vật lý	Kiểm tra đủ hồ sơ, xử lý tồn tại và vật tư dư	PM
15	Xác nhận bàn giao hồ sơ kế toán	Kế toán tiếp nhận hồ sơ mua sắm và mốc thu đủ điều kiện	Kế toán

Hai dòng 05 và 06 là hai nhánh thay thế nhau. Trên công trình tham chiếu, Giai đoạn 02 và 03 có lượt duyệt riêng; Giai đoạn 15 cũng yêu cầu xác nhận theo vai trò khi đi đến cuối. Các gói khác vẫn có thể cần duyệt hồ sơ nghiệp vụ tại BOQ, Hợp đồng, Mua sắm, Nghiệm thu hoặc Bàn giao.


6.2. Khảo sát/đo hiện trạng: xuất BM-GS-01

Mục đích chính: chuyển kết quả khảo sát đã lưu thành biểu mẫu hiện trạng của client, không ghi lại dữ liệu ở nơi khác. Giám sát hoặc người được giao lập phiếu thực hiện; PM/QS kiểm tra thông tin theo trách nhiệm đã phân công.

1. Từ **Quy trình**, mở Đầu việc khảo sát/đo hiện trạng. Kiểm tra đúng phiếu có bảng vị trí, kích thước và hiện trạng; biên bản họp khảo sát chỉ ghi người tham dự/kết luận không thay cho phiếu đo.
2. Kiểm tra dữ liệu nguồn và lưu mọi thay đổi. Chọn **Xuất báo cáo** ở đầu phiếu, phía trên phần thông tin nghiệp vụ. Nếu có nút **Xuất báo cáo rủi ro** bên cạnh, đó là BM05 của các dòng rủi ro trên cùng phiếu.
3. Mở file tải về; đối chiếu công trình, ngày đo, vị trí/hạng mục, kích thước, hiện trạng kết cấu/hoàn thiện, điểm giao MEP, đánh giá và ghi chú. Nội dung chưa ghi tại nguồn không được tự suy thành đã kiểm đạt.

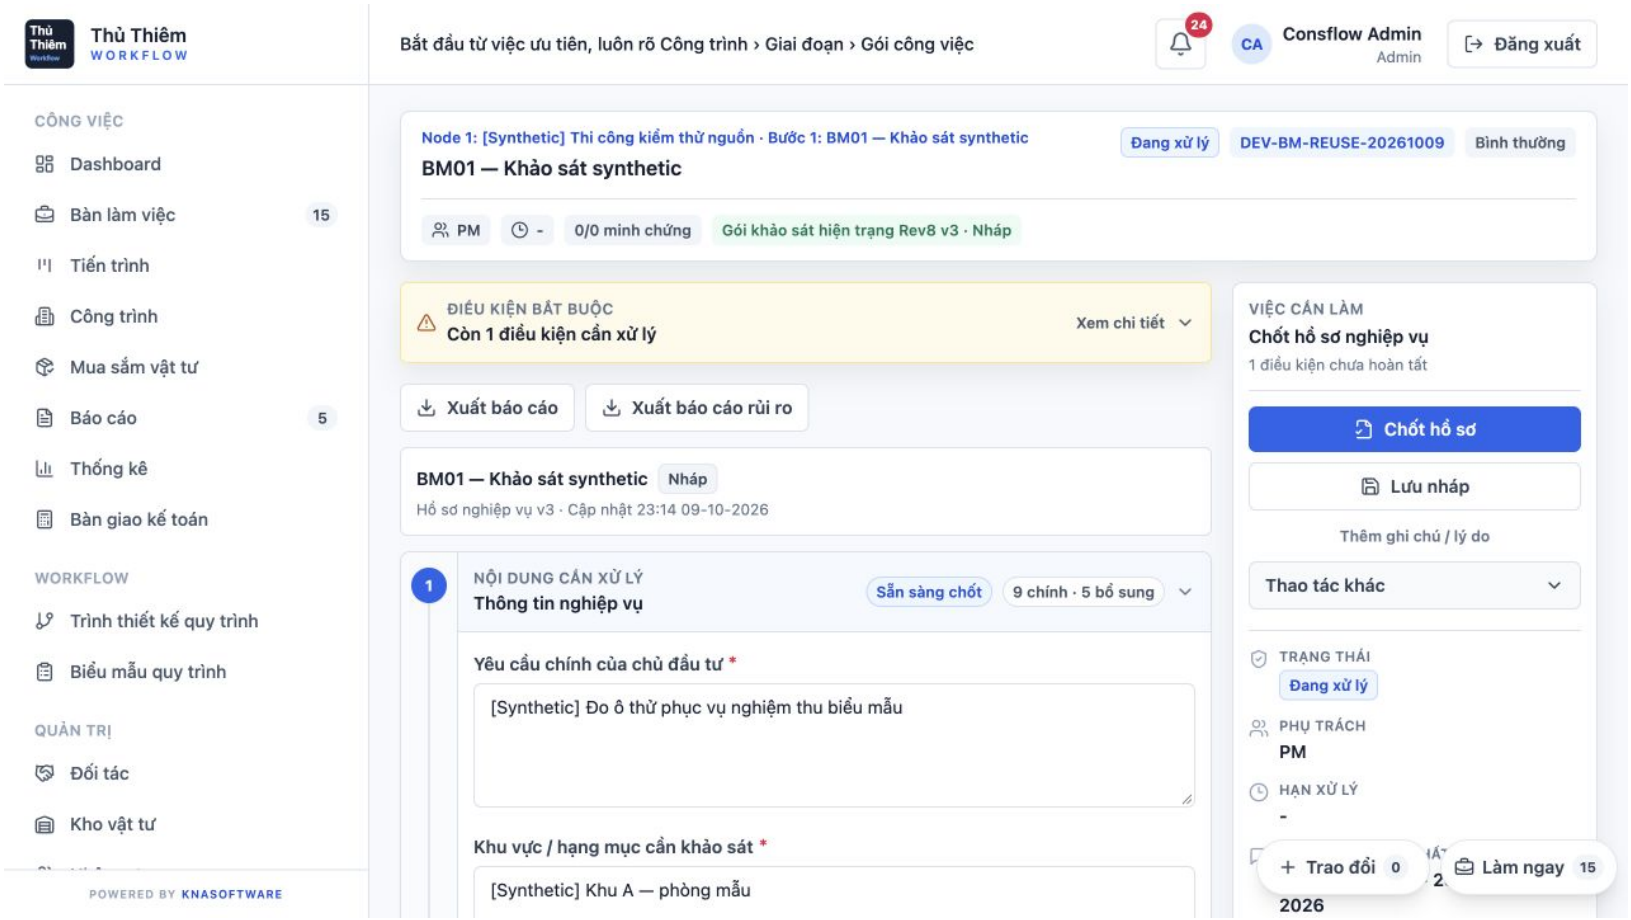

BM01-A · Phiếu khảo sát thử đã lưu nháp, Development 13/10/2026. Nút Xuất báo cáo ở đầu phiếu; nút Xuất báo cáo rủi ro là báo cáo khác. Ảnh không chứng minh phiếu đã Chốt hồ sơ.

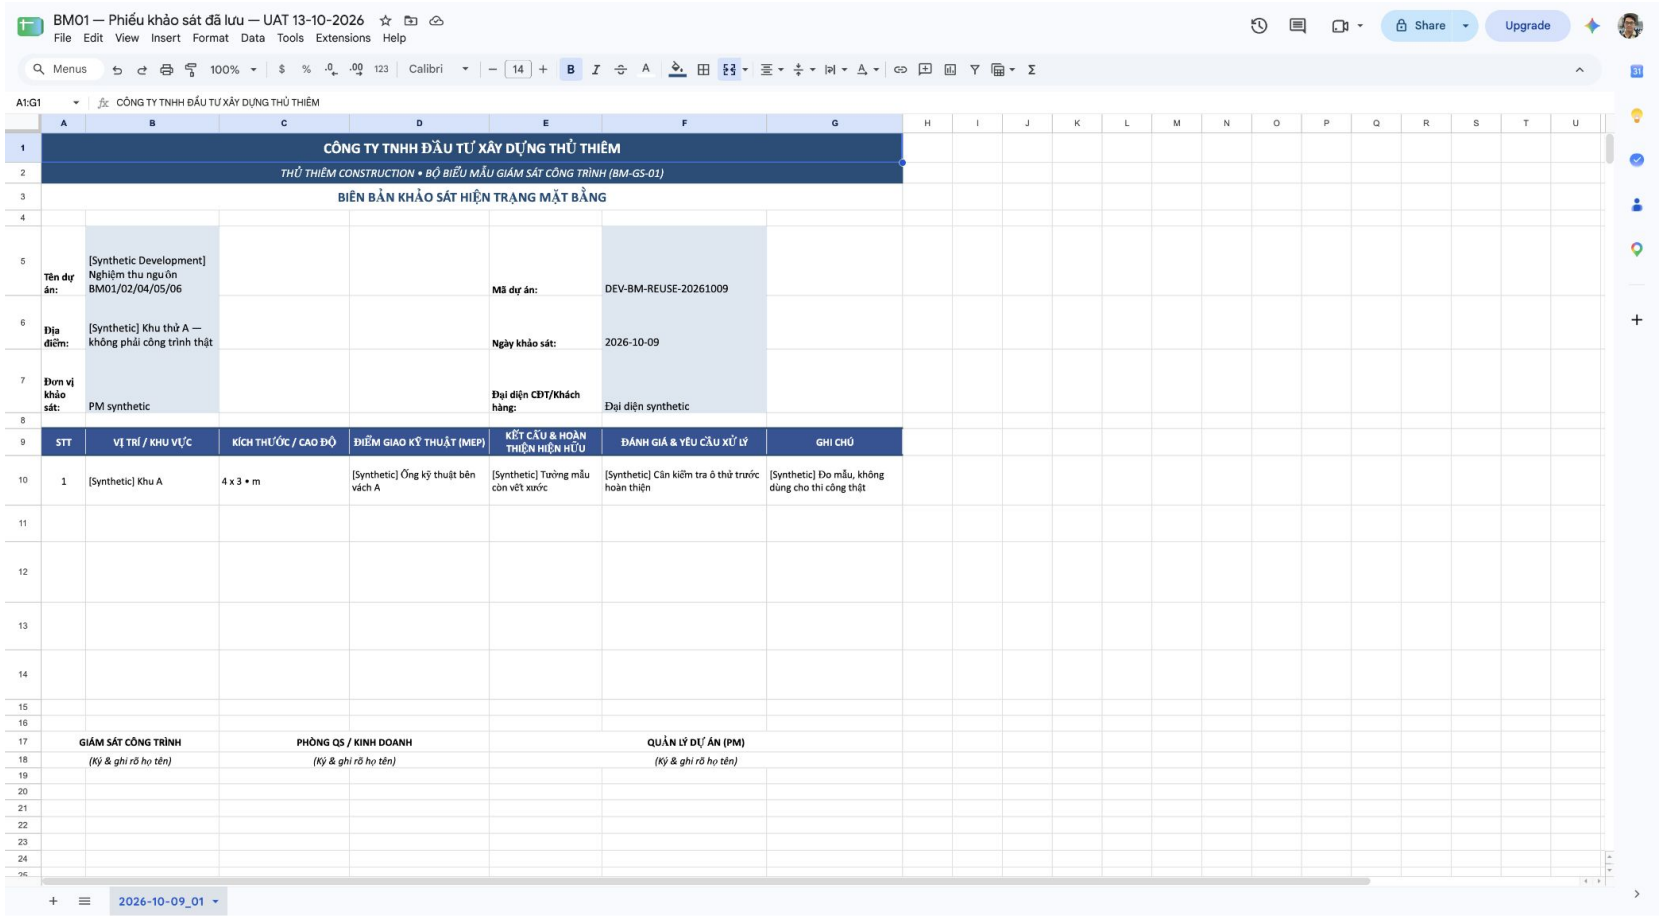


BM01-B · File từ nút xuất, đã mở trên Google Sheets. Mẫu BM01 có bảng hiện trạng, không có ô ảnh; ghi chú về việc chụp ảnh không phải yêu cầu chèn ảnh vào bảng này.

6.3. Rủi ro khảo sát/thi công: xuất BM-GS-05


Mục đích chính: đưa các rủi ro đã ghi nhận vào sổ theo dõi của client. Người lập phiếu rủi ro, Giám sát hoặc người được giao cập nhật rủi ro kiểm tra nội dung; PM theo dõi người phụ trách, thời hạn và tình trạng xử lý.

Nguồn đang mở	Nút và vị trí	Phạm vi báo cáo
Đầu việc có phiếu đánh giá rủi ro	**Xuất báo cáo** ở đầu phiếu	Các dòng rủi ro đã lưu của phiếu này.
Phiếu khảo sát có danh sách rủi ro	**Xuất báo cáo rủi ro** ở đầu phiếu	Rủi ro đã lưu trong chính phiếu khảo sát.
Phiếu báo cáo thi công có vướng mắc	**Xuất báo cáo rủi ro** ở đầu phiếu	Các dòng vướng mắc/rủi ro đã lưu của phiếu thi công.
Chi tiết báo cáo ngày hiện tại trong Thi công	**Xuất báo cáo rủi ro** trong phần Công việc trong ngày, khi có vướng mắc	Vướng mắc của đúng báo cáo ngày đang mở.

1. Mở đúng nguồn nêu trên. Kiểm tra rủi ro, ngày phát hiện, nguyên nhân, ảnh hưởng, mức độ, hướng xử lý, người phụ trách, hạn và tình trạng đang có; lưu thay đổi tại nguồn.
2. Chọn đúng nút theo bảng. Mở file **.xlsx**; đối chiếu tên công trình và các dòng rủi ro. Hạn xử lý khác ngày phát hiện; người phụ trách rủi ro khác người lập phiếu nếu nguồn ghi khác nhau.
3. Đối chiếu tình trạng của từng rủi ro. **Phiếu đã chốt** không tự có nghĩa mọi rủi ro đã xử lý xong. Nếu cần bổ sung, cập nhật tại hồ sơ nguồn theo quyền, rồi xuất lại.

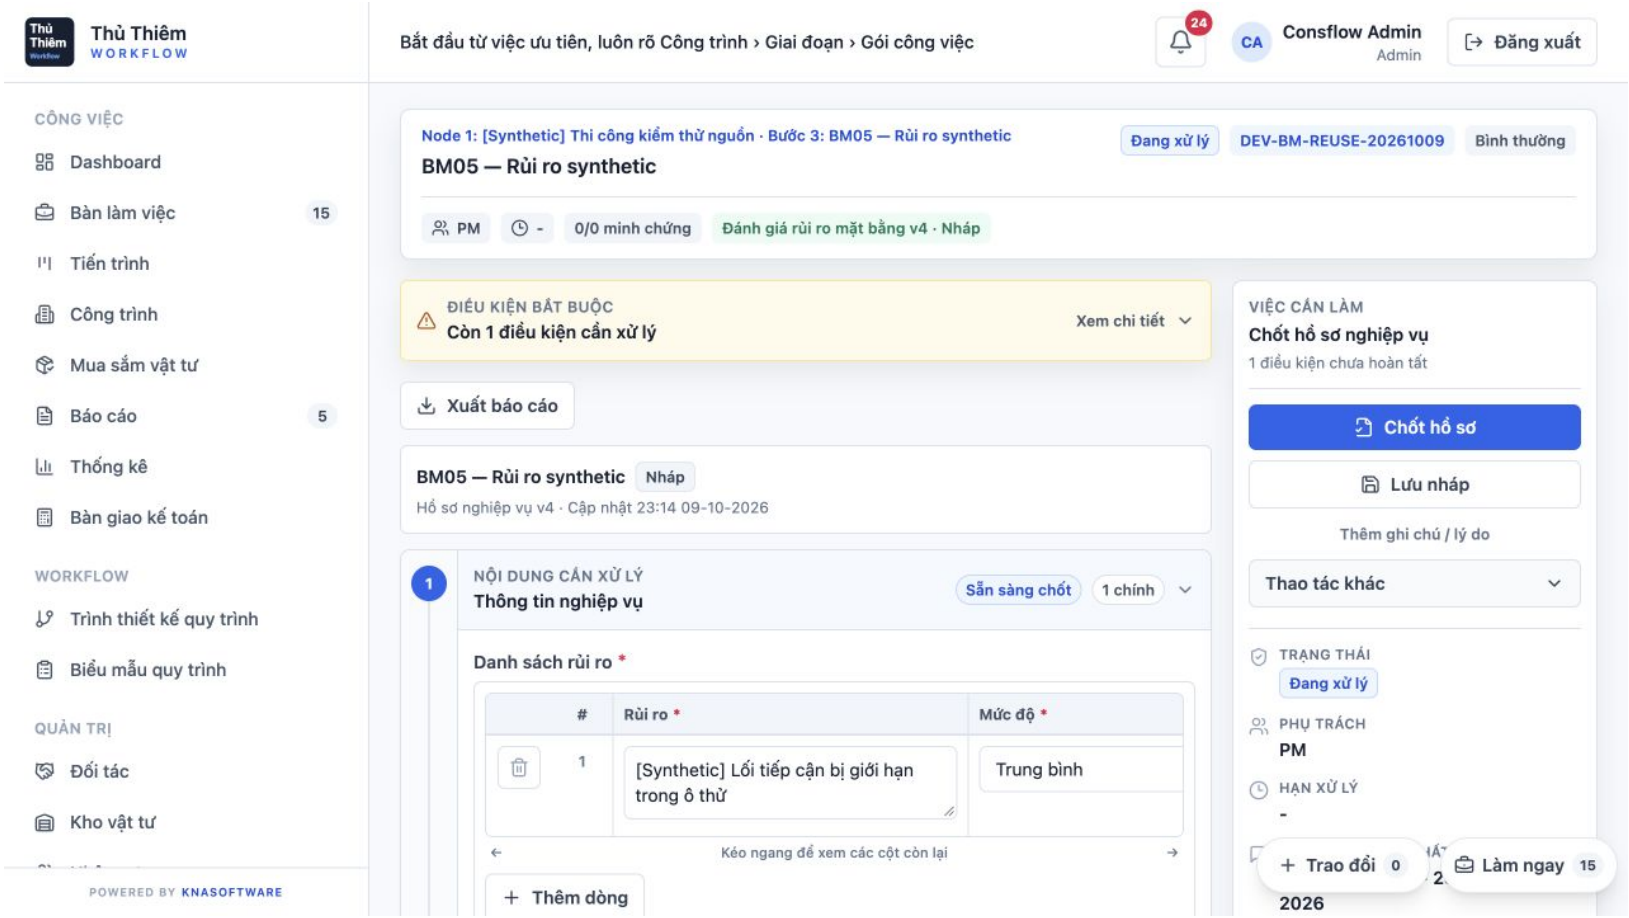

BM05-A · Nút Xuất báo cáo tại phiếu đánh giá rủi ro đã lưu nháp, Development 13/10/2026. Đây là nguồn minh họa đã nghiệm thu; bảng trên còn chỉ vị trí nút ở các nguồn liên quan.

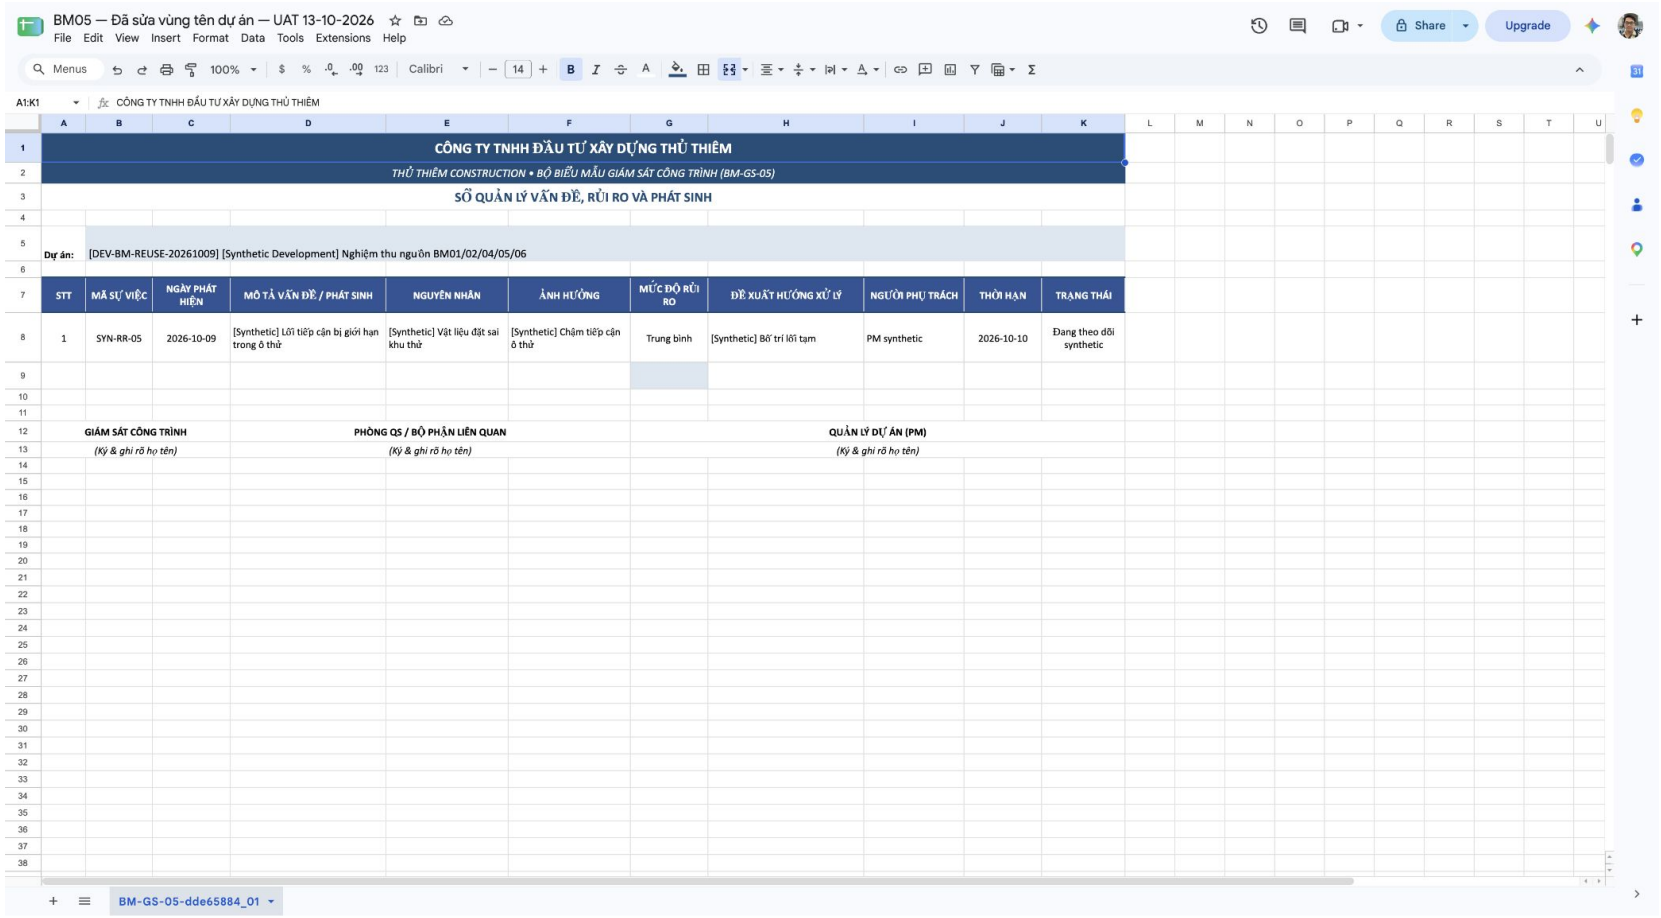

BM05 — Đã sửa vùng tên dự án — UAT 13-10-2026

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share Upgrade

A1:K1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-05)

SỔ QUẢN LÝ VẤN ĐỀ, RỦI RO VÀ PHÁT SINH

Dự án: [DEV-BM-REUSE-20261009] [Synthetic Development] Nghiệm thu nguồn BM01/02/04/05/06

STT	MÃ SỰ VIỆC	NGÀY PHÁT HIỆN	MÔ TẢ VẤN ĐỀ / PHÁT SINH	NGUYÊN NHÂN	ẢNH HƯỞNG	MỨC ĐỘ RỦI RO	ĐỀ XUẤT HƯỚNG XỬ LÝ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	THỜI HẠN	TRẠNG THÁI
1	SYN-RR-05	2026-10-09	[Synthetic] Lối tiếp cận bị giới hạn trong ô thử	[Synthetic] Vật liệu đặt sai khu thử	[Synthetic] Chậm tiếp cận ô thử	Trung bình	[Synthetic] Bố trí lối tạm	PM synthetic	2026-10-10	Đang theo dõi synthetic

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH	PHÒNG QS / BỘ PHẬN LIÊN QUAN	QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký & ghi rõ họ tên)*	*(Ký & ghi rõ họ tên)*


BM-GS-05-dde65884_01

BM05-B · File kết quả đã nghiệm thu sau khi sửa vùng tên công trình. Kiểm tra đủ tên và 11 cột sổ rủi ro. Mẫu BM05 gốc không có ô ảnh; không cần thêm ảnh để xuất sổ này.


6.4. Minh chứng của Đầu việc: xuất BM-GS-07

Mục đích chính: xuất sổ ảnh của đúng Đầu việc, sử dụng ảnh đã gắn trong quá trình làm việc. Người được giao hoặc người có quyền xem minh chứng thao tác; người kiểm tra đối chiếu ảnh và nội dung với công việc thực tế.

1. Mở Đầu việc > **Minh chứng**. Xem ảnh và thông tin đã lưu trong **Sổ minh chứng**. Cần bổ sung ảnh thì dùng thao tác tải minh chứng hiện có và lưu/gửi xong trước khi xuất.
2. Chọn **Xuất báo cáo** trong Sổ minh chứng, dưới phần thống kê. Nút xuất có khi Đầu việc có ảnh; không cần chọn hoặc tải lại ảnh ở bước xuất. Báo cáo lấy các ảnh hợp lệ gắn với đúng Đầu việc; tài liệu PDF/Word không trở thành dòng ảnh.
3. Mở file; đối chiếu từng dòng với ảnh nguồn, vị trí, nội dung, giai đoạn và ghi chú bàn giao. Ảnh nằm trong ô thuộc cột **Tên file ảnh tham chiếu**; hàng/cột được căn để ảnh giữ tỷ lệ, không che nội dung bên cạnh.

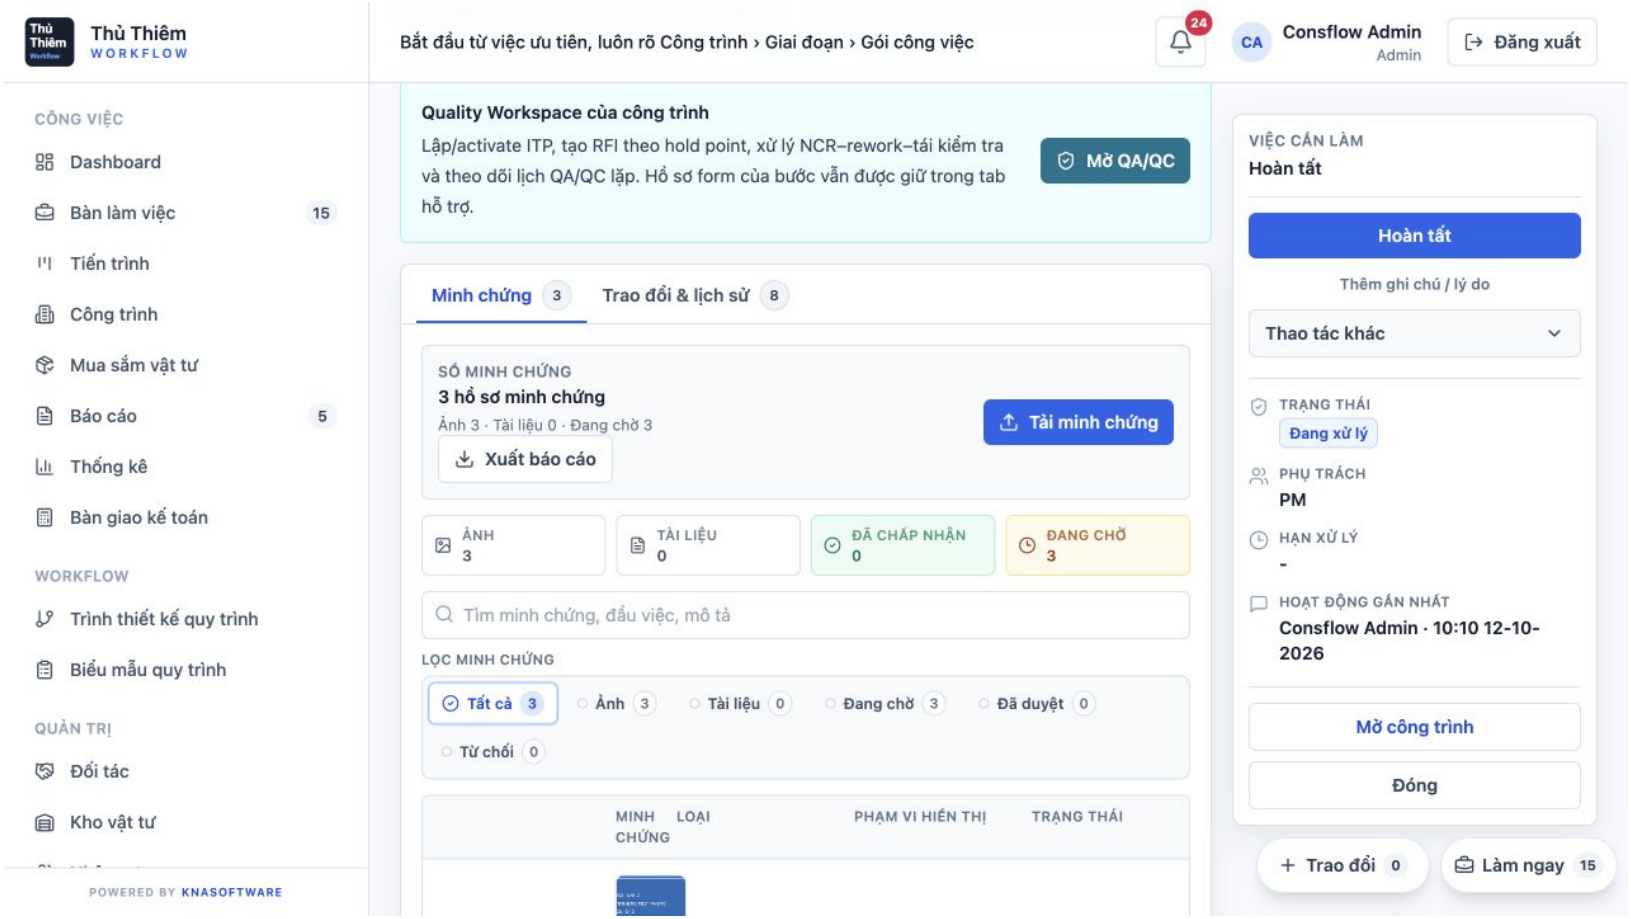

BM07-A · Đầu việc thử có ba ảnh đã liên kết. Nút Xuất báo cáo nằm ngay trong Sổ minh chứng, không mở bộ chọn ảnh riêng. Development 13/10/2026.

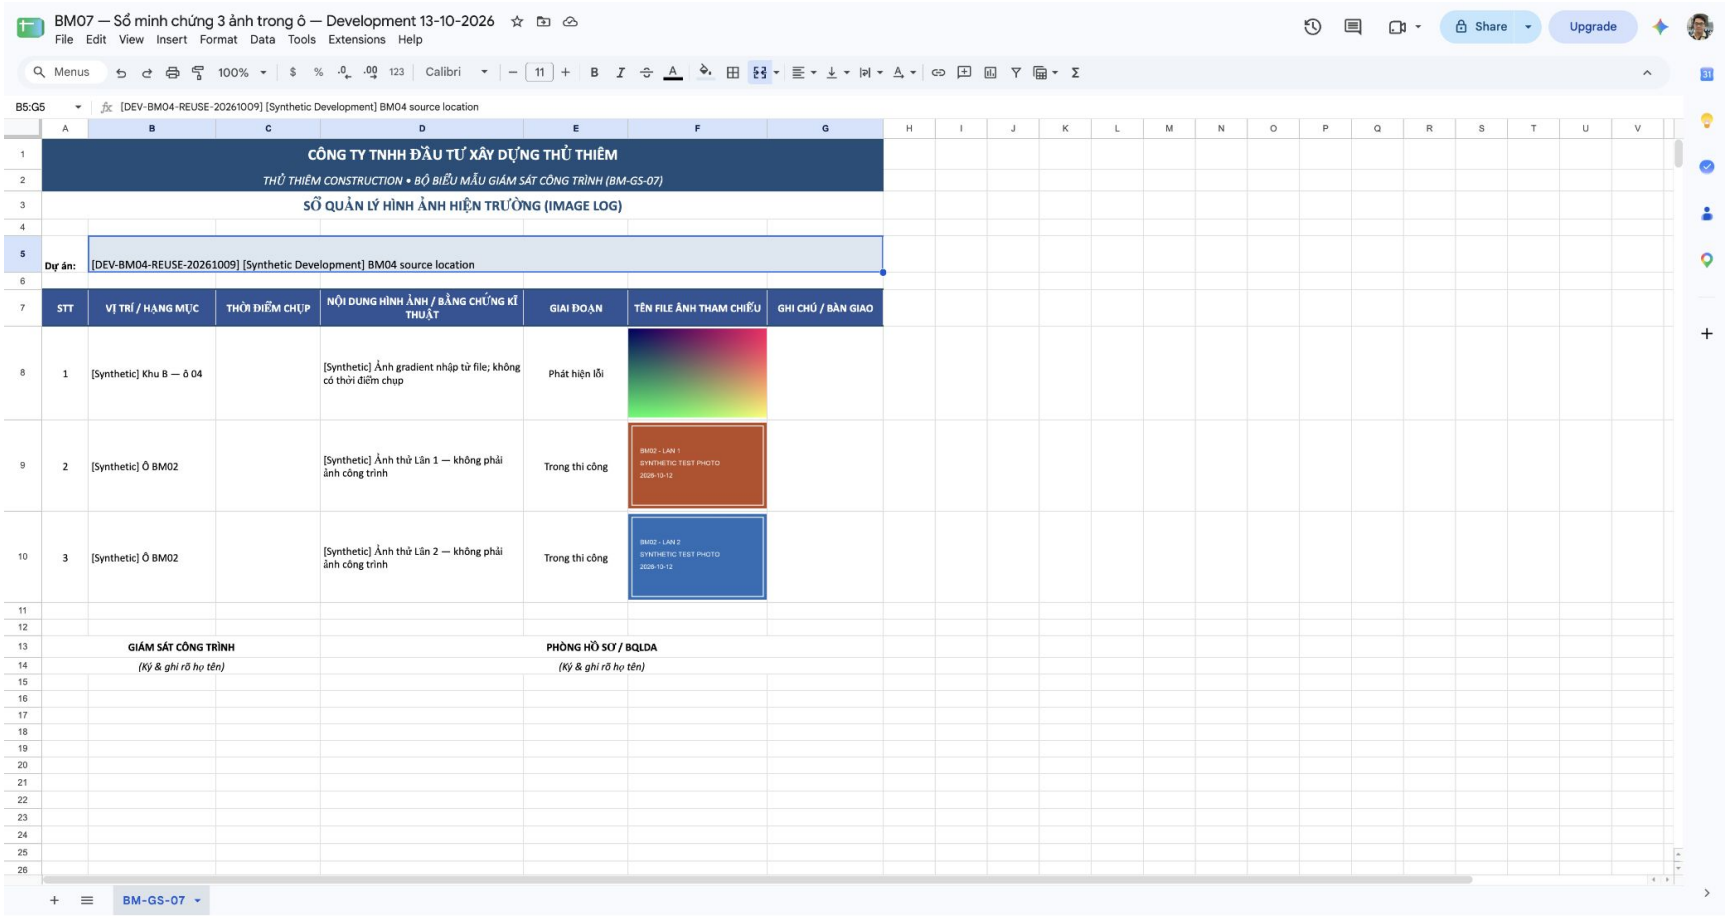


BM07-B · Nguyên file tải đã mở trên Google Sheets: ba ảnh nằm trong ô của ba dòng, giữ tỷ lệ; không có lỗi #VALUE!. Đây là ảnh thử nhập từ file, không phải ảnh công trường hoặc bằng chứng kiểm camera thật.

Thời điểm chụp: nếu ảnh nhập từ file không có thời điểm chụp đã ghi nhận, cột này để trống. Không lấy giờ tải lên làm giờ chụp. BM07 không tạo sheet Hình ảnh riêng; ảnh nằm trong bảng chính.


6.5. BOQ có thiết kế: bản vẽ, khối lượng và giá

Mục đích: QS lập khối lượng theo đúng bản Thiết kế PM đã bàn giao; người duyệt quyết định trên từng dòng BOQ, sau đó mới khóa giá cuối và tạo yêu cầu mua cho phần cần mua mới. Công trình Rev9 đã thực hiện chặng này bằng **số liệu [DEMO]**.


Mốc trong công trình Rev9	Người thực hiện và chức năng	Kết quả đã quan sát
Căn cứ đầu vào	**Thiết kế** phát hành DEMO-TK-R01; **PM** bàn giao revision đó cho QS	QS có một bản phát hành cụ thể để tham chiếu; sơ đồ chưa có số đo hiện trường
Bóc khối lượng	**QS Trần Hà** nhập 4 đèn LED âm trần và 24 m² tấm thạch cao, gắn mã vật tư; gửi duyệt và khóa định mức	Hai dòng tổng 7,4 triệu đồng chỉ là ví dụ; không dùng để đặt hàng thật
Rà và duyệt	**PM Nguyễn Minh** xem hai dòng và chọn **Duyệt dự toán**	Hai dòng chuyển **Đã duyệt**; lúc này giá cuối vẫn chưa tự khóa
Lấy giá và chọn nguồn	**PM** tạo báo giá nhà cung cấp giả lập DEMO-BG-R9-001, đánh giá **có điều kiện** và chọn giá cho từng dòng	Cả hai giá cuối được khóa; cần đối chiếu số đo, điện nước và tồn kho trước nghiệp vụ thật
Phát hành Gói công việc	**QS** ghi người nhận/kênh gửi là **nội bộ, chưa gửi ra ngoài**, chốt hồ sơ, tạo PDF, tải BOQ [DEMO] vào sổ minh chứng rồi hoàn tất	Giai đoạn 06 đạt 1/1. PDF biểu mẫu ghi 0 chữ ký, 0 con dấu; PDF minh chứng cũng mang dấu DEMO

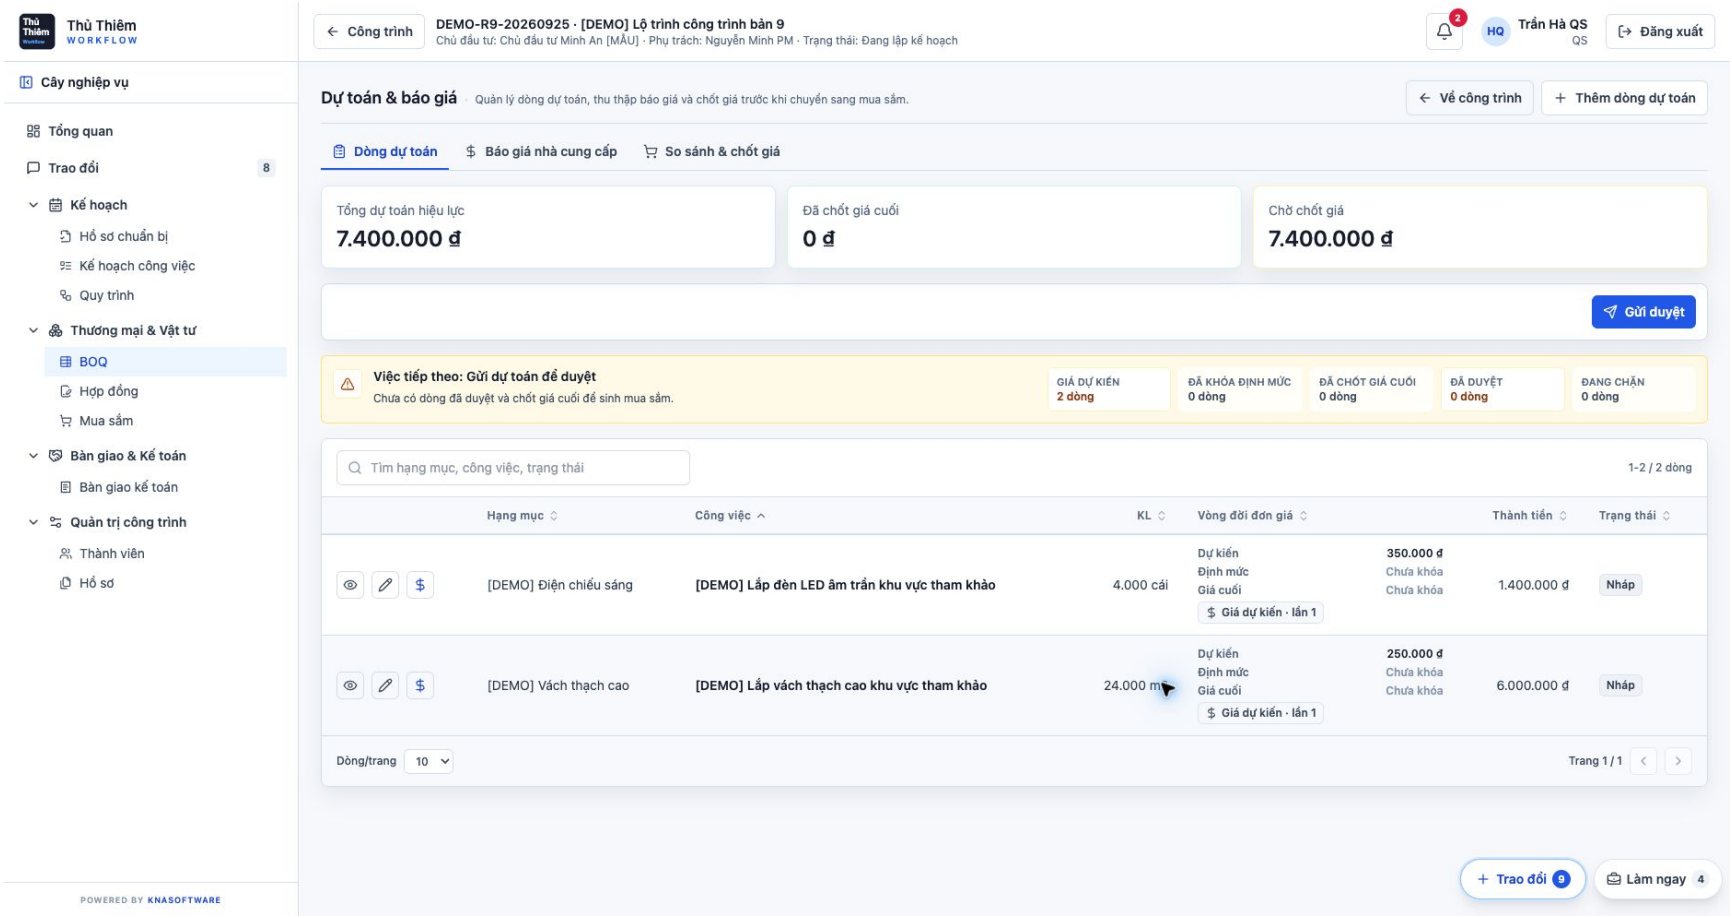


Hai dòng BOQ có thiết kế được QS nhập từ bản DEMO-TK-R01. Khối lượng và đơn giá là số mô phỏng.

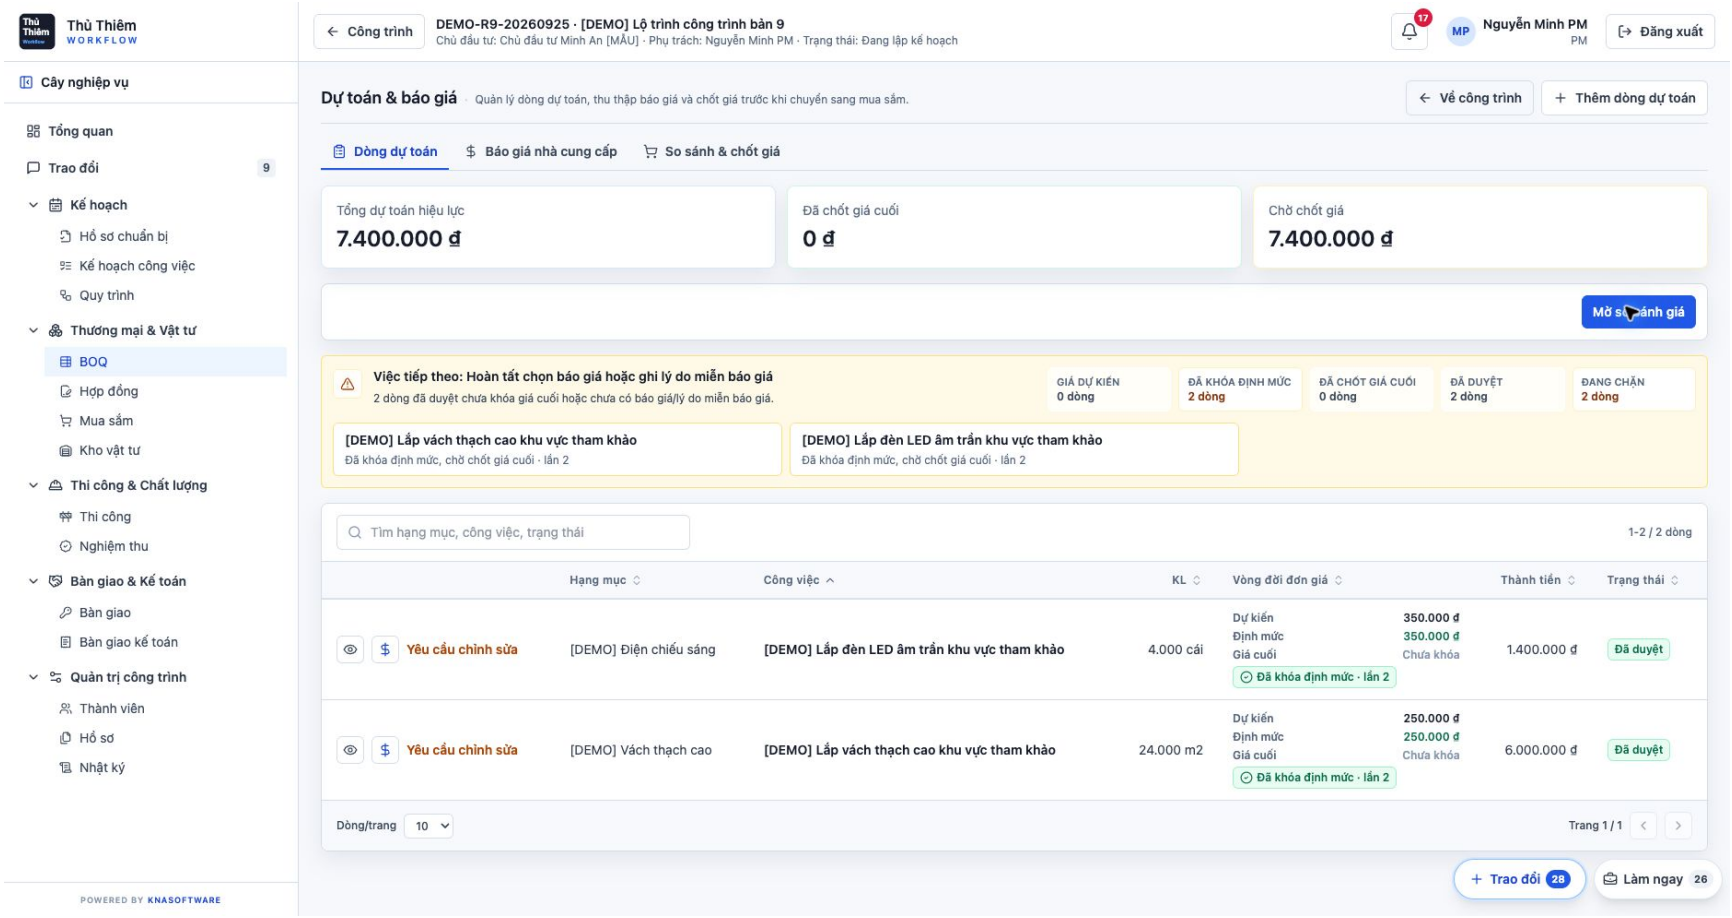


PM đã duyệt khối lượng/đơn giá dự toán; màn hình còn cho thấy giá cuối là bước riêng.

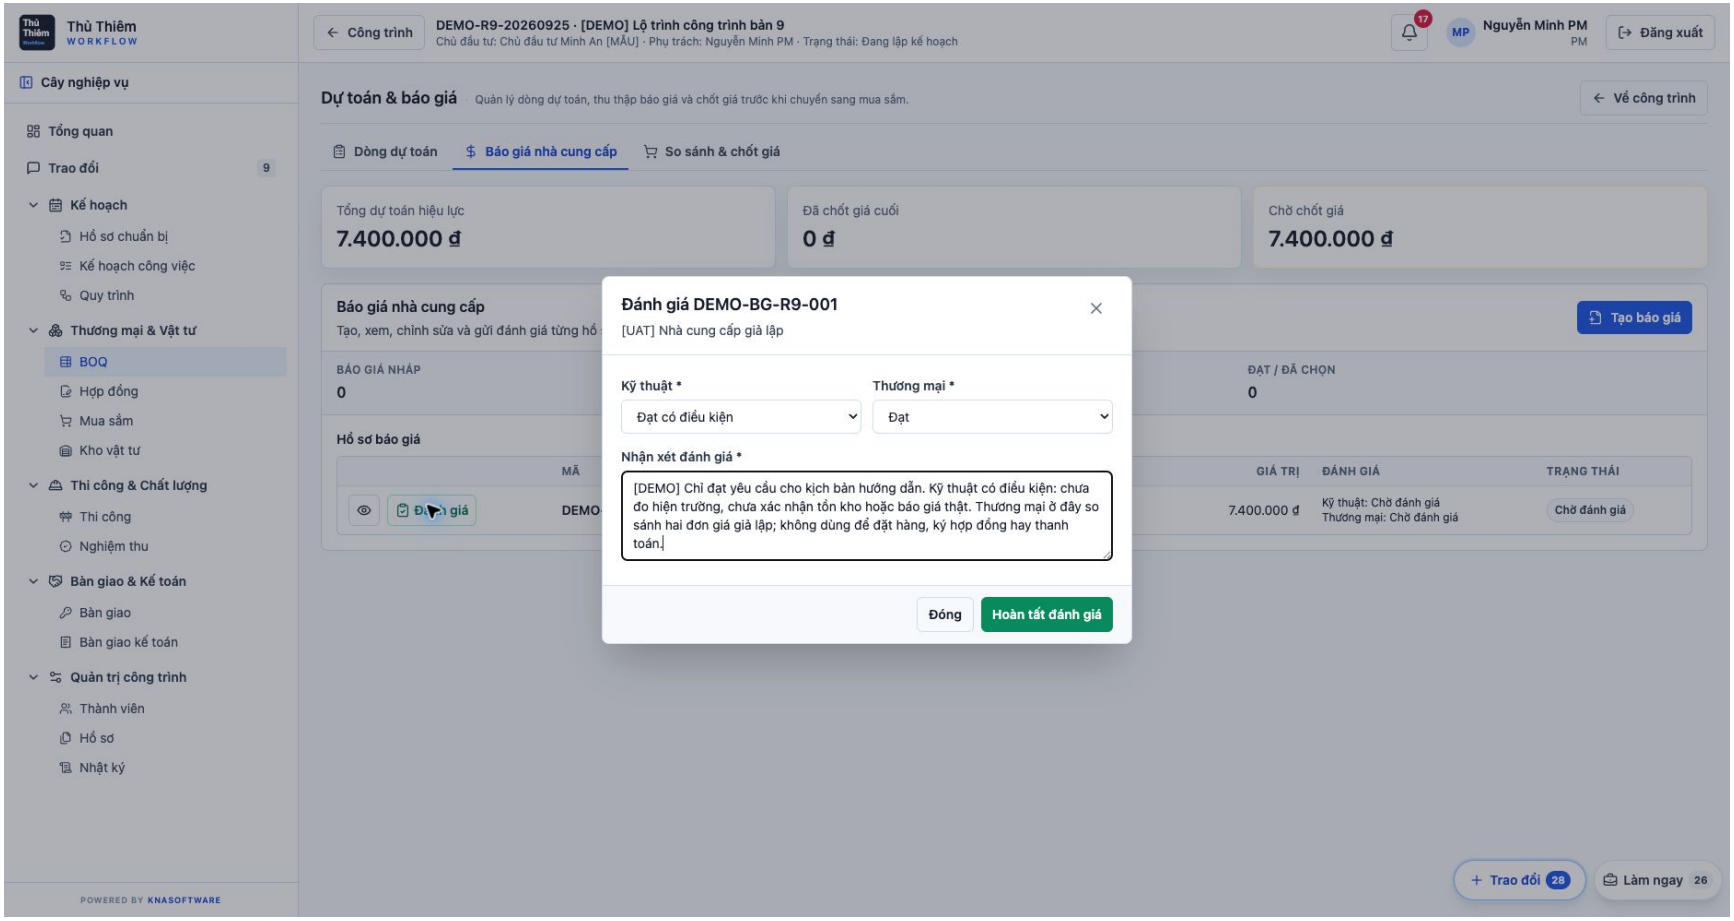


Báo giá mẫu có điều kiện kỹ thuật; đánh giá này không thay hồ sơ khảo sát thực tế.

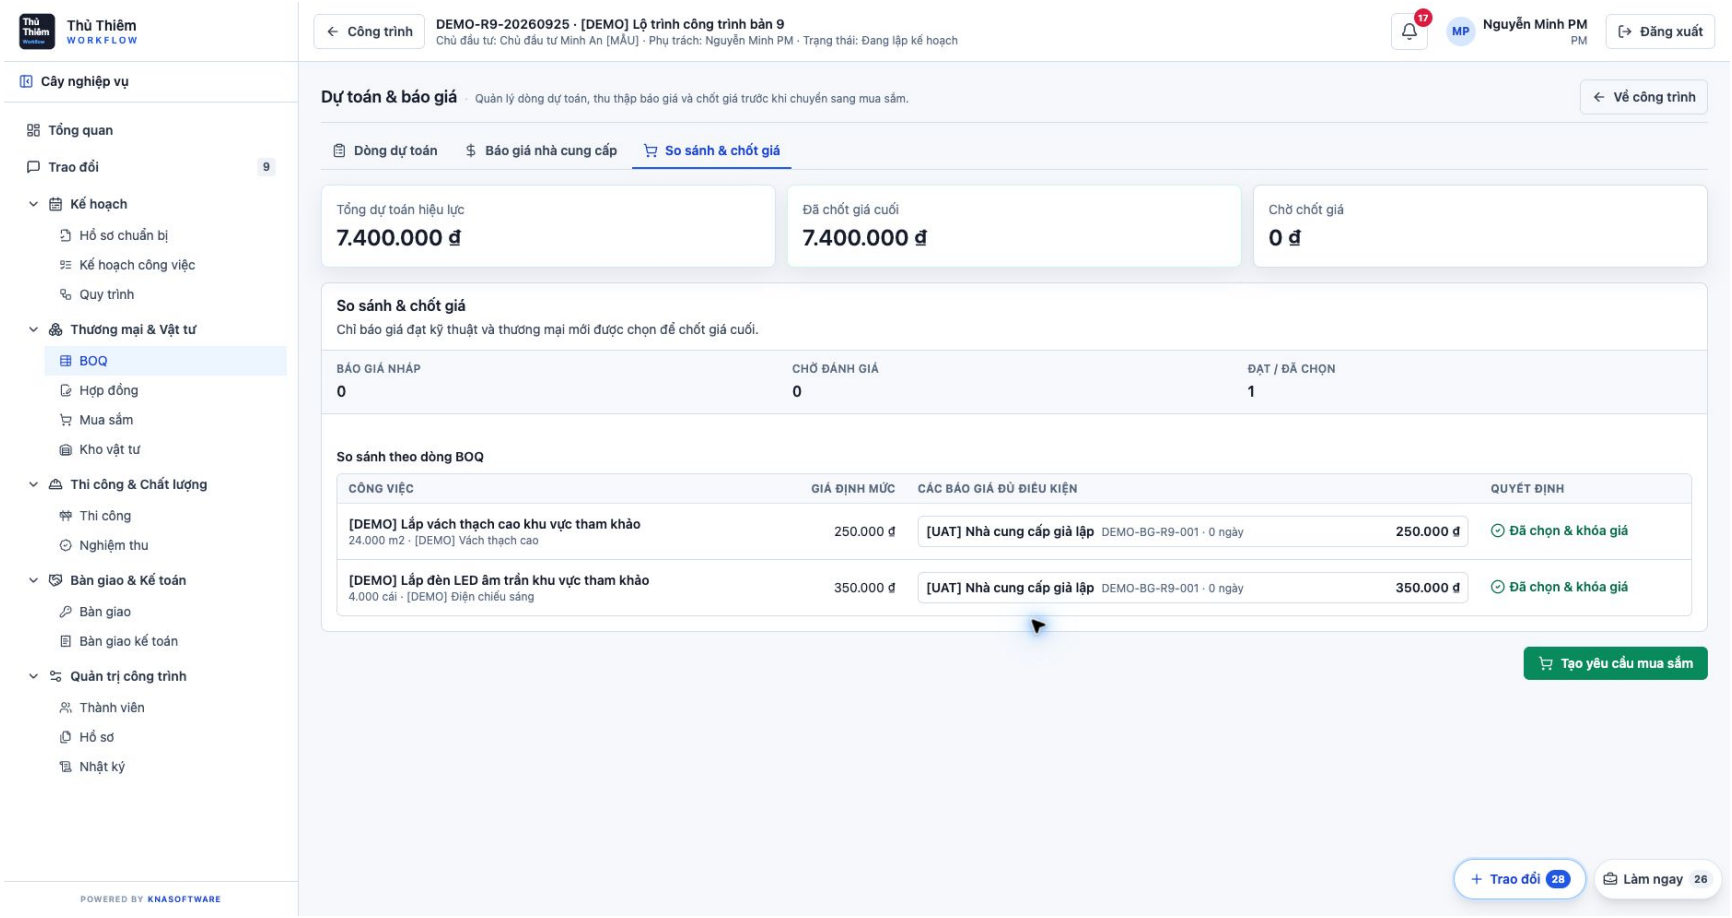

Giá cuối hai dòng đã khóa theo báo giá mô phỏng. Mỗi dòng giữ liên kết về nhà cung cấp và căn cứ giá.

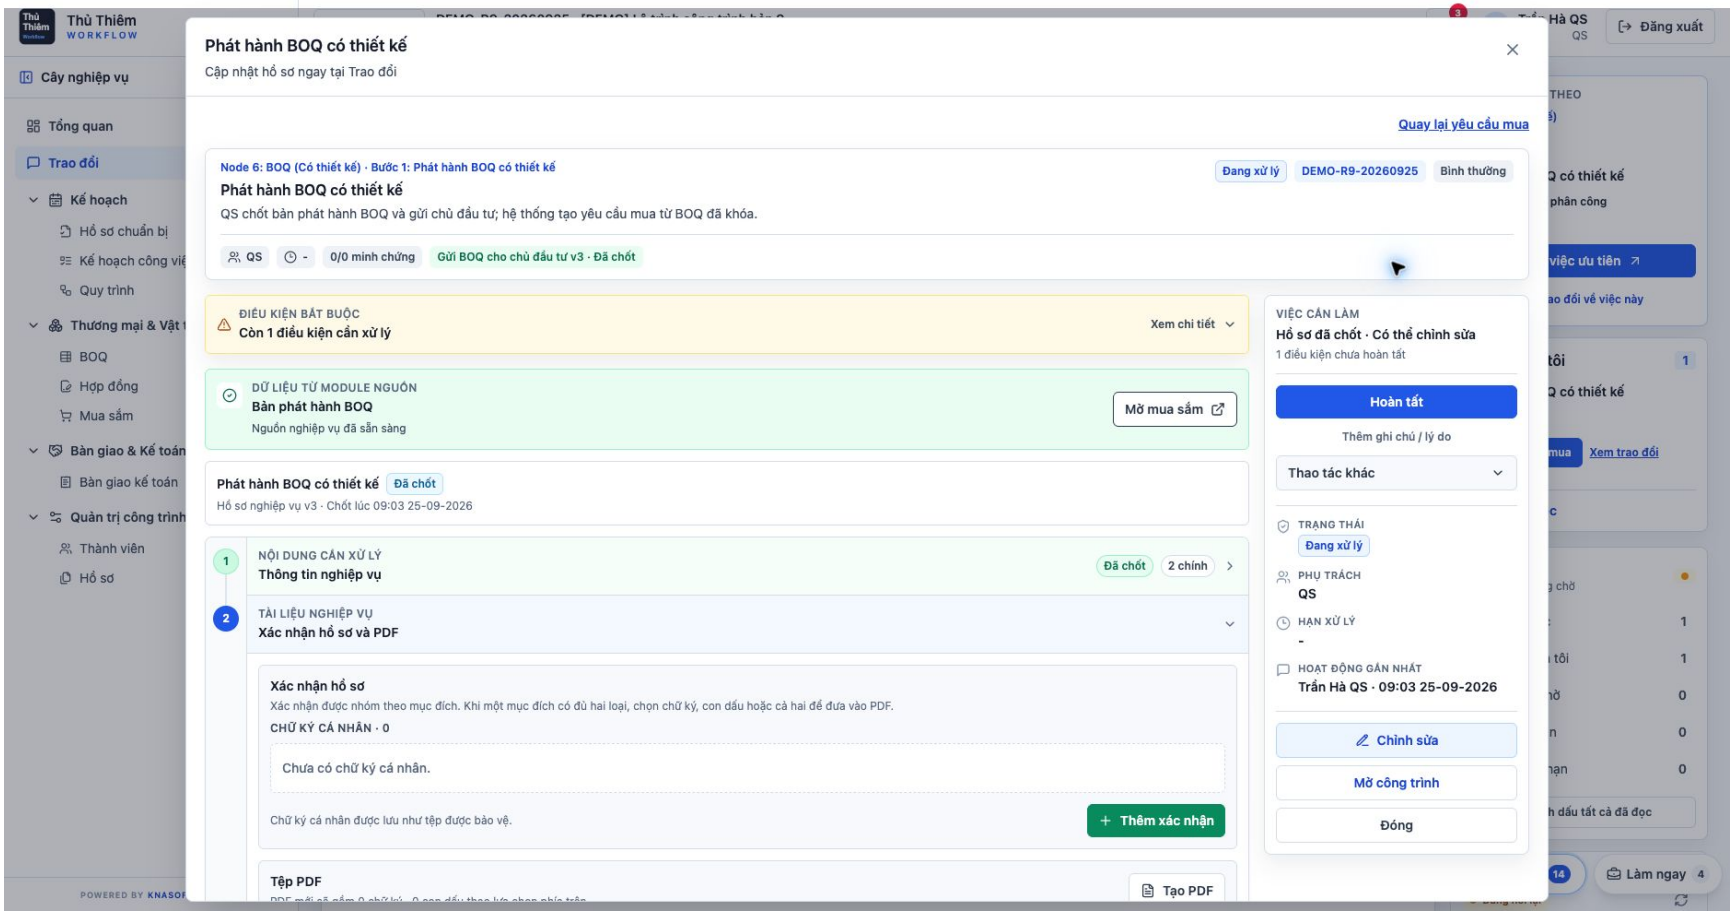

Hồ sơ Đầu việc đã chốt; người nhận/kênh gửi ghi rõ chưa chuyển BOQ ra ngoài. QS còn phải bổ sung minh chứng mới hoàn tất được Đầu việc.

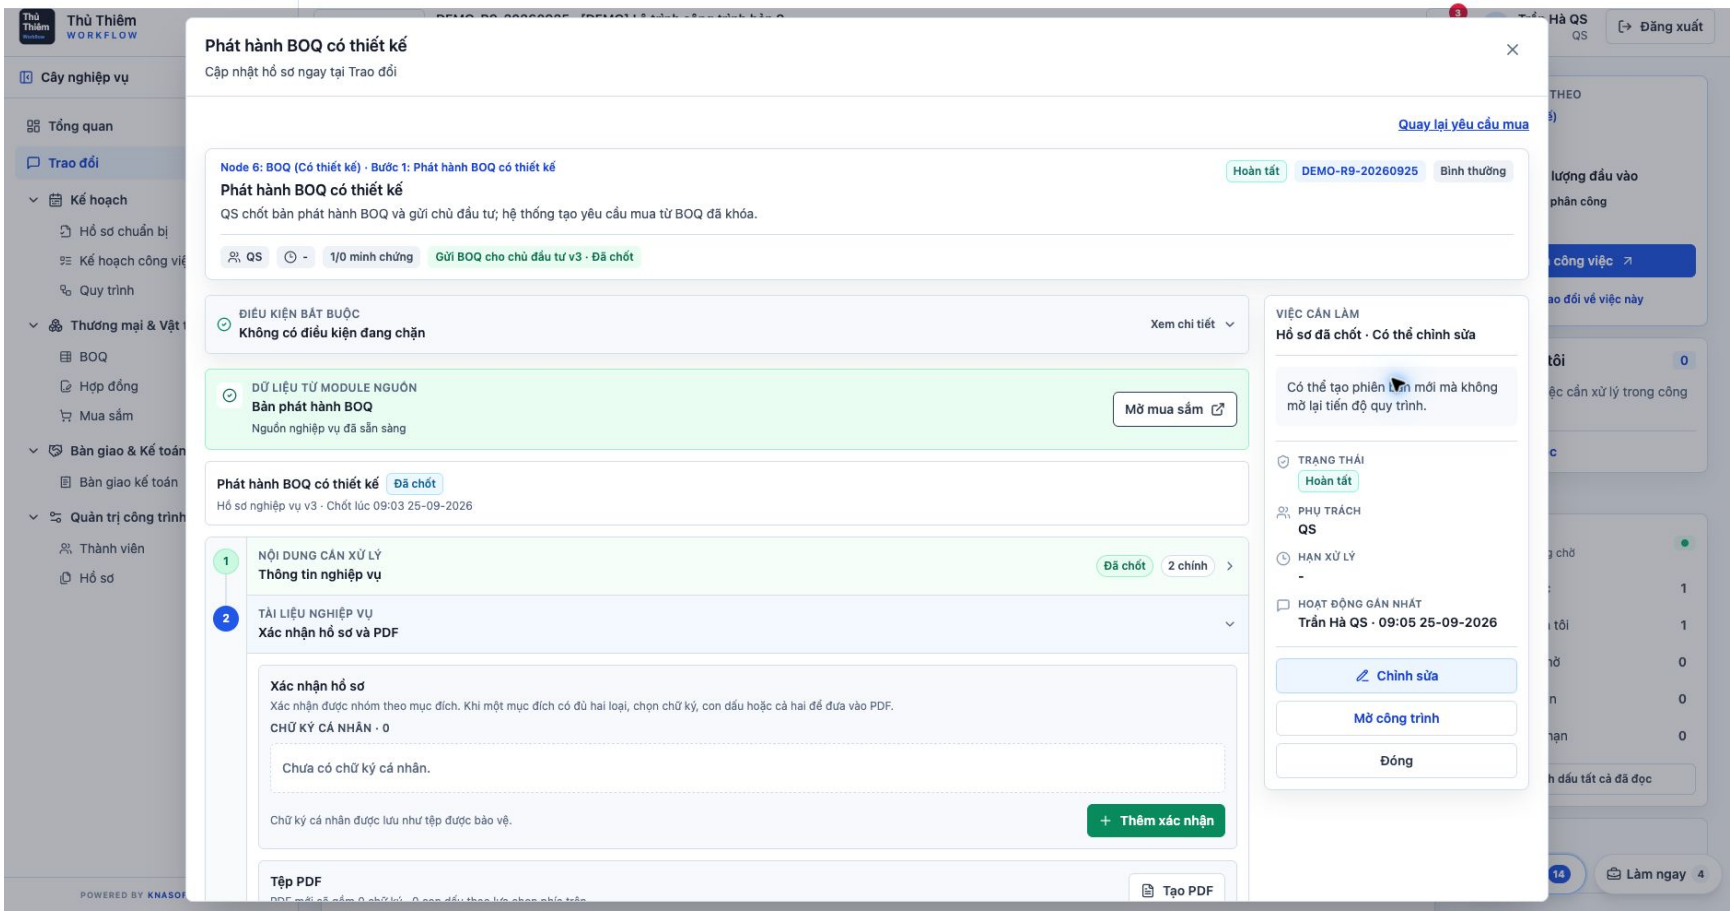

Sổ minh chứng có PDF [DEMO]; Đầu việc đạt Hoàn tất và PM mới chuyển Giai đoạn.


6.6. Hợp đồng chủ đầu tư và hợp đồng đầu vào

Mục đích: có đúng bản hợp đồng làm căn cứ thực hiện, biết ai rà nội dung, ai ký, và đã nhận lại hồ sơ giấy có chữ ký hay chưa. Từ **Quy trình**, mở Giai đoạn **07 Chốt Hợp đồng với chủ đầu tư** rồi chọn Đầu việc **Hoàn tất gói hợp đồng chủ đầu tư**; hồ sơ nguồn nằm tại **Hợp đồng**. Sau khi lấy giá đầu vào, Giai đoạn **10 Hợp đồng và tạm ứng đầu vào** kiểm tra cả yêu cầu mua đã duyệt và hợp đồng nhà cung cấp/thầu phụ phù hợp.


Hồ sơ hoặc mốc	Mục đích	Vai trò làm chính và thao tác	Vai trò kiểm tra/quyết định
Hợp đồng chủ đầu tư (phải thu)	Chốt phạm vi, giá trị, mốc thu, bản phát hành	**Bộ phận HĐ** tạo hợp đồng nháp, lập phiên bản, đối chiếu BOQ đã chốt và hồ sơ chủ đầu tư	**PM** đối chiếu phạm vi; người có quyền rà soát/duyệt phiên bản kết luận trên hồ sơ
Rà soát, duyệt và ký phiên bản	Giữ đúng một bản được phép ký, truy lại ý kiến	Bộ phận HĐ gửi bản để rà/duyệt; người được giao quyền rà soát và duyệt ghi ý kiến, quyết định	Người có quyền **ký** ký trên phần mềm bằng tài khoản của chính mình
Hồ sơ giấy và bản chụp có chữ ký	Xác nhận việc gửi và nhận bản ký thực tế	Người có quyền gửi ghi người nhận, cách gửi, thời điểm; người có quyền quản lý hồ sơ tải lên bản giấy đã ký	Người có quyền kích hoạt kiểm tra đúng **phiên bản hiện hành** và đủ chữ ký, lần gửi, bản chụp
Hợp đồng đầu vào (phải trả)	Chốt điều kiện với nhà cung cấp hoặc thầu phụ	**Mua hàng** đưa căn cứ chọn nhà cung cấp, đơn hàng; **Bộ phận HĐ** lập và theo dõi phiên bản hợp đồng đầu vào	Người được cấp quyền rà/duyệt/ký; **Kế toán** xem căn cứ tạm ứng theo hồ sơ, không tự hiểu "hợp đồng" là đã chi tiền

Trình tự nên chỉ trực tiếp: lập hợp đồng nháp › tạo phiên bản › gửi rà soát/duyệt › ký trên phần mềm › ghi nhận gửi giấy › tải bản chụp giấy đã ký › kích hoạt khi hệ thống cho phép. Hồ sơ cũ có thể mang nhãn **Đang hiệu lực** mà vẫn thiếu chứng từ theo điều kiện mới; cảnh báo màu vàng trên ảnh mẫu là ví dụ. Không nói "đủ điều kiện" chỉ dựa vào nhãn trạng thái.


Điểm dừng trên công trình Rev9: PM đã mở Giai đoạn 07, Bộ phận HĐ Vũ An đã mở Đầu việc. Ban đầu phần mềm nêu **0/4 điều kiện nguồn**. Khi Bộ phận HĐ chọn **Tạo hợp đồng**, ô **Đối tác** chỉ hiện "Chọn", nên tài khoản này chưa lập được bản nháp. PM sau đó tạo DEMO-HD-CDT-R9-001 với đúng chủ đầu tư mẫu, lập **V1 giá trị 0 đồng** để hướng dẫn và gửi rà soát. Bộ phận HĐ đọc được V1 nhưng không có nút kết luận trả lại tại sổ Hợp đồng, nên gửi ý kiến yêu cầu bổ sung trong Trao đổi. **V1 vẫn Đang rà soát**; chưa có hợp đồng được duyệt, chữ ký trên phần mềm, bản scan giấy đã ký hoặc kích hoạt. Không điền rằng đã gửi bản cứng và không chuyển tiếp Giai đoạn 07 khi thiếu căn cứ.

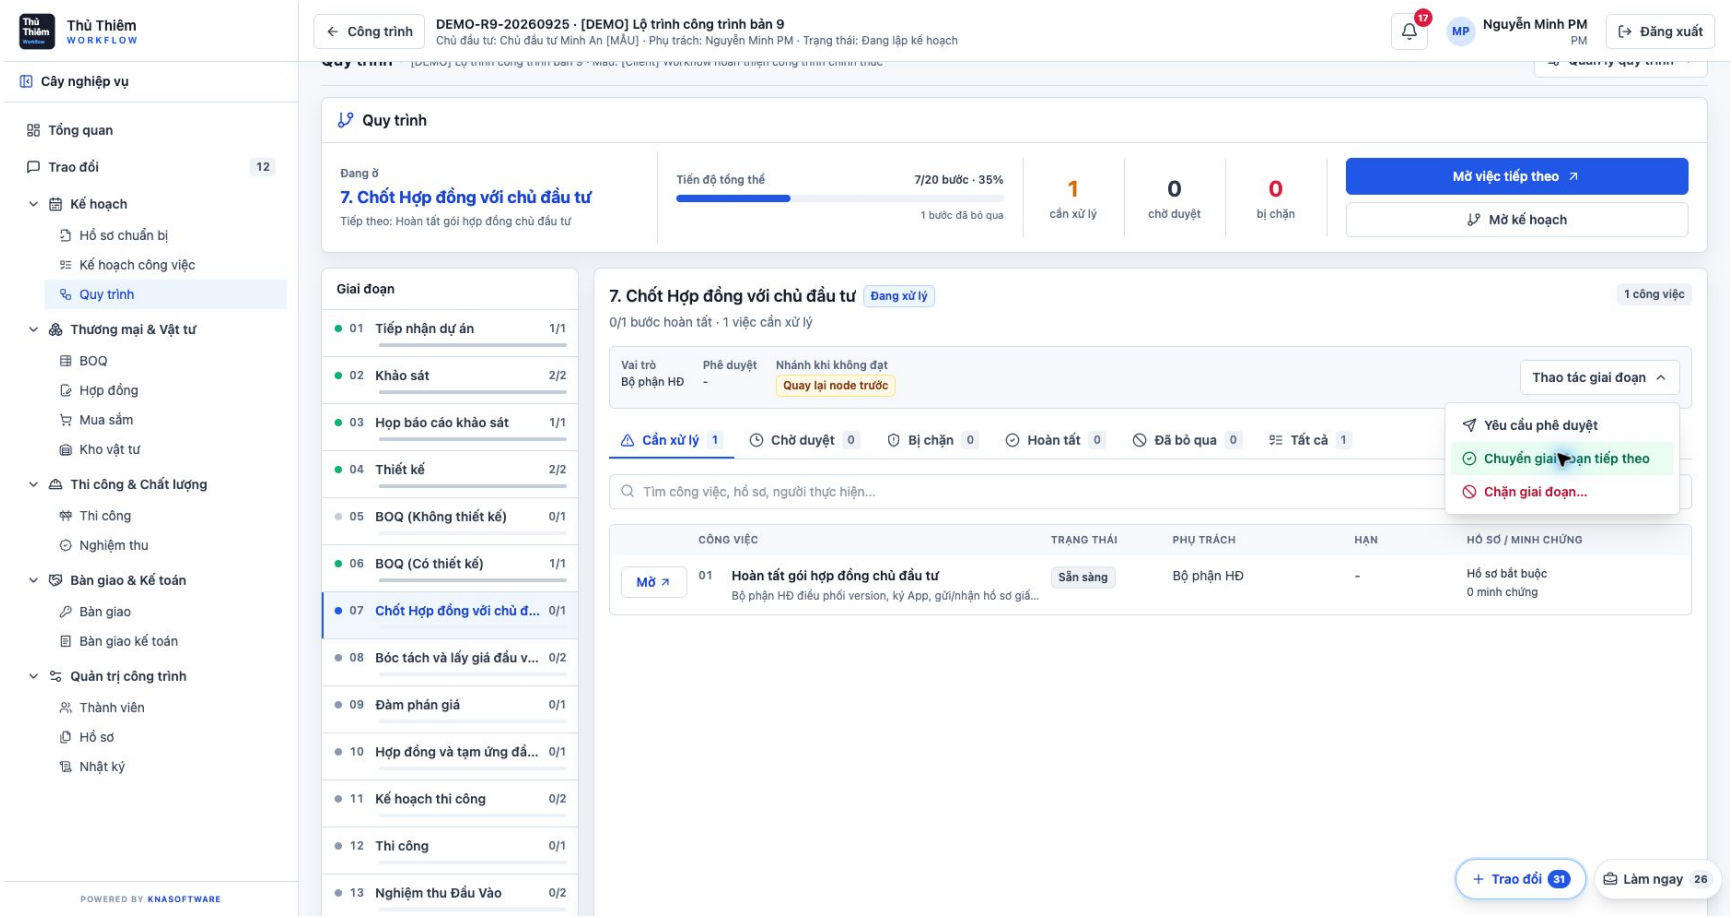


Rev9 ở Giai đoạn 07 sau khi BOQ đạt 7/20 Gói công việc; Gói Hợp đồng còn 0/1.

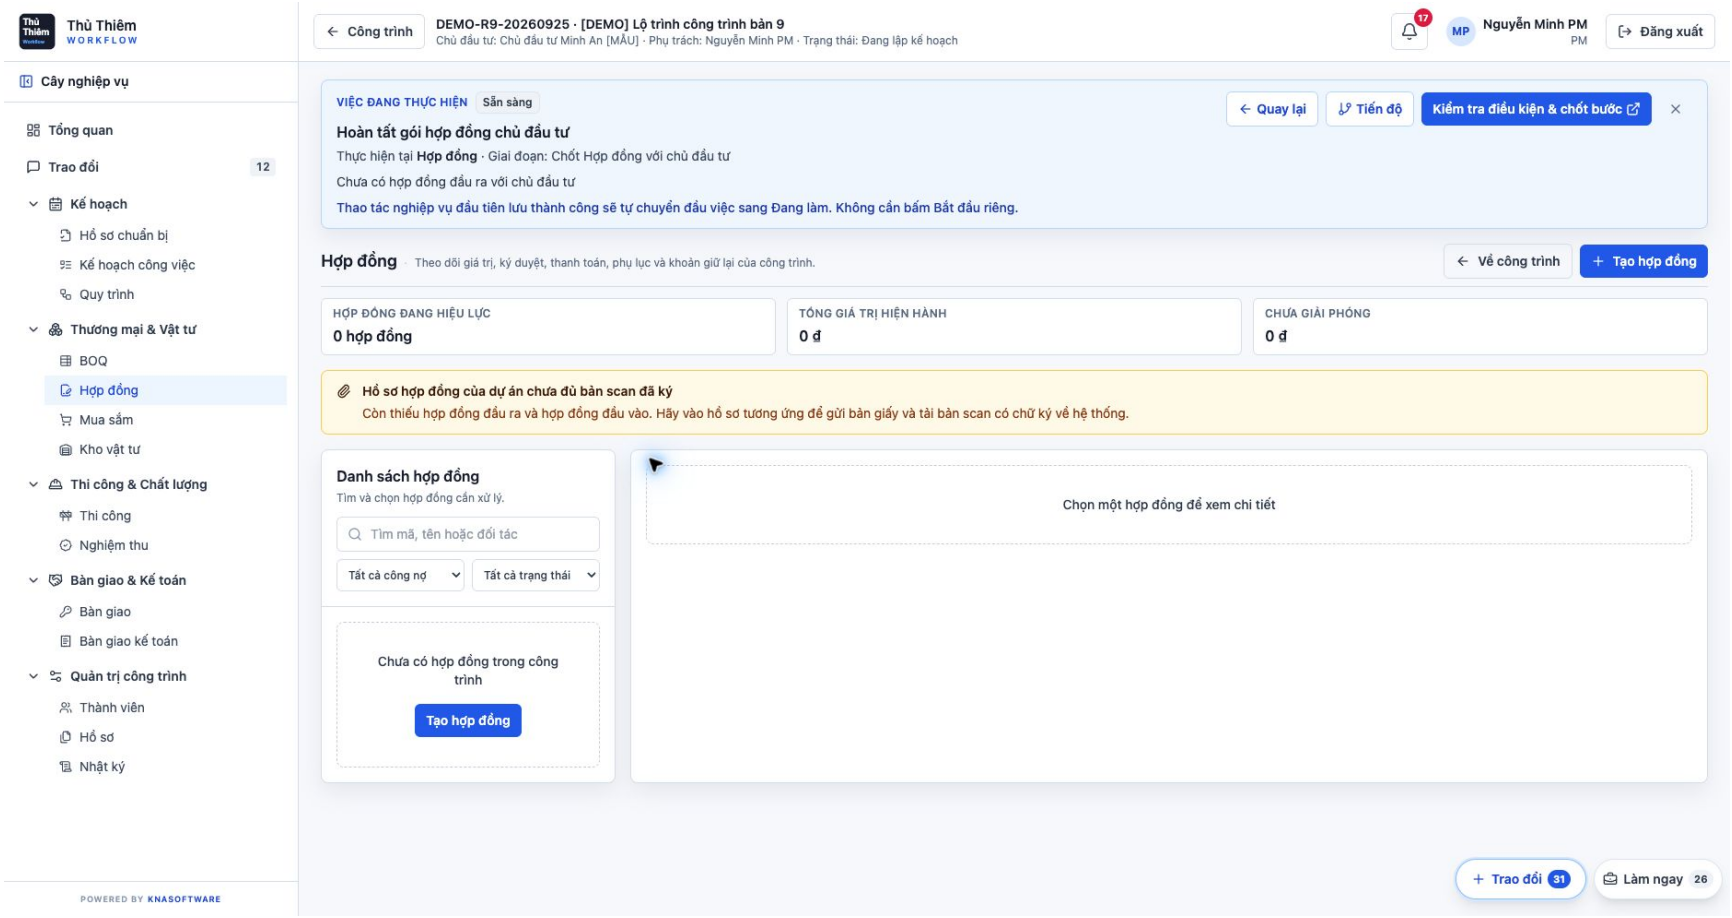


Thời điểm mới mở Giai đoạn 07, sổ Hợp đồng của chính công trình mới chưa có bản nào. Các ảnh tiếp theo ghi lại lúc PM tạo bản nháp.

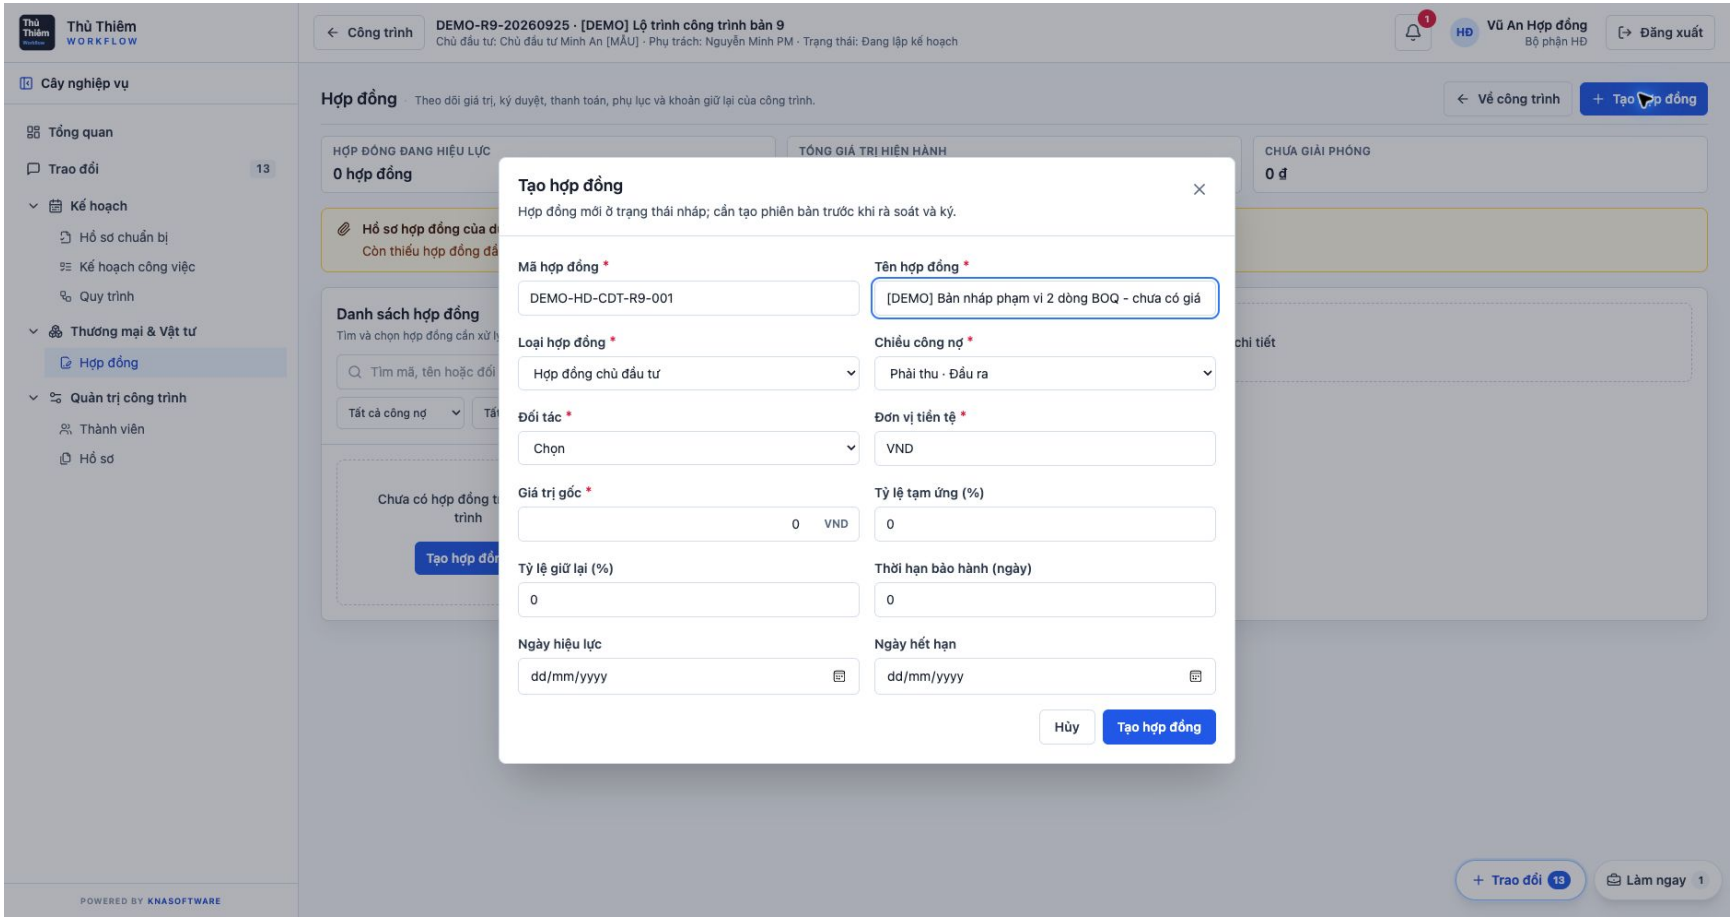


Vũ An Hợp đồng mở biểu mẫu bản nháp với mã/tên [DEMO], nhưng danh sách Đối tác không hiển thị Chủ đầu tư Minh An [MẪU]; không bấm Tạo hợp đồng.

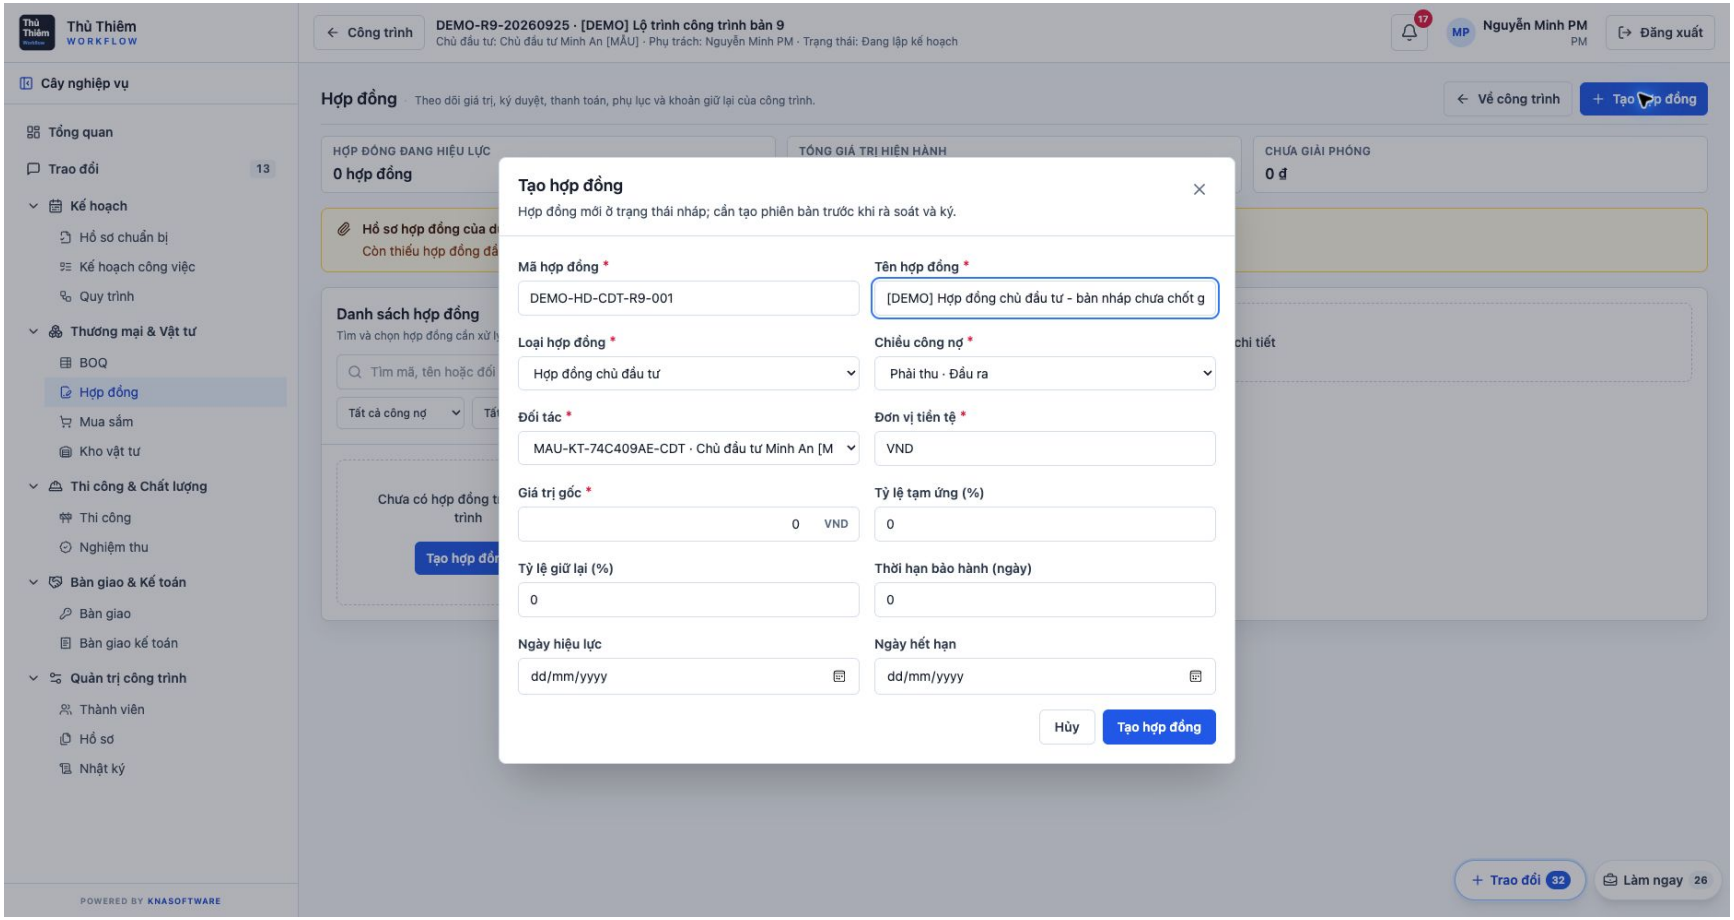


Cùng biểu mẫu dưới tài khoản PM có Chủ đầu tư Minh An [MẪU]; PM tạo hồ sơ [DEMO] với giá trị 0 đồng vì giá hợp đồng chưa chốt.

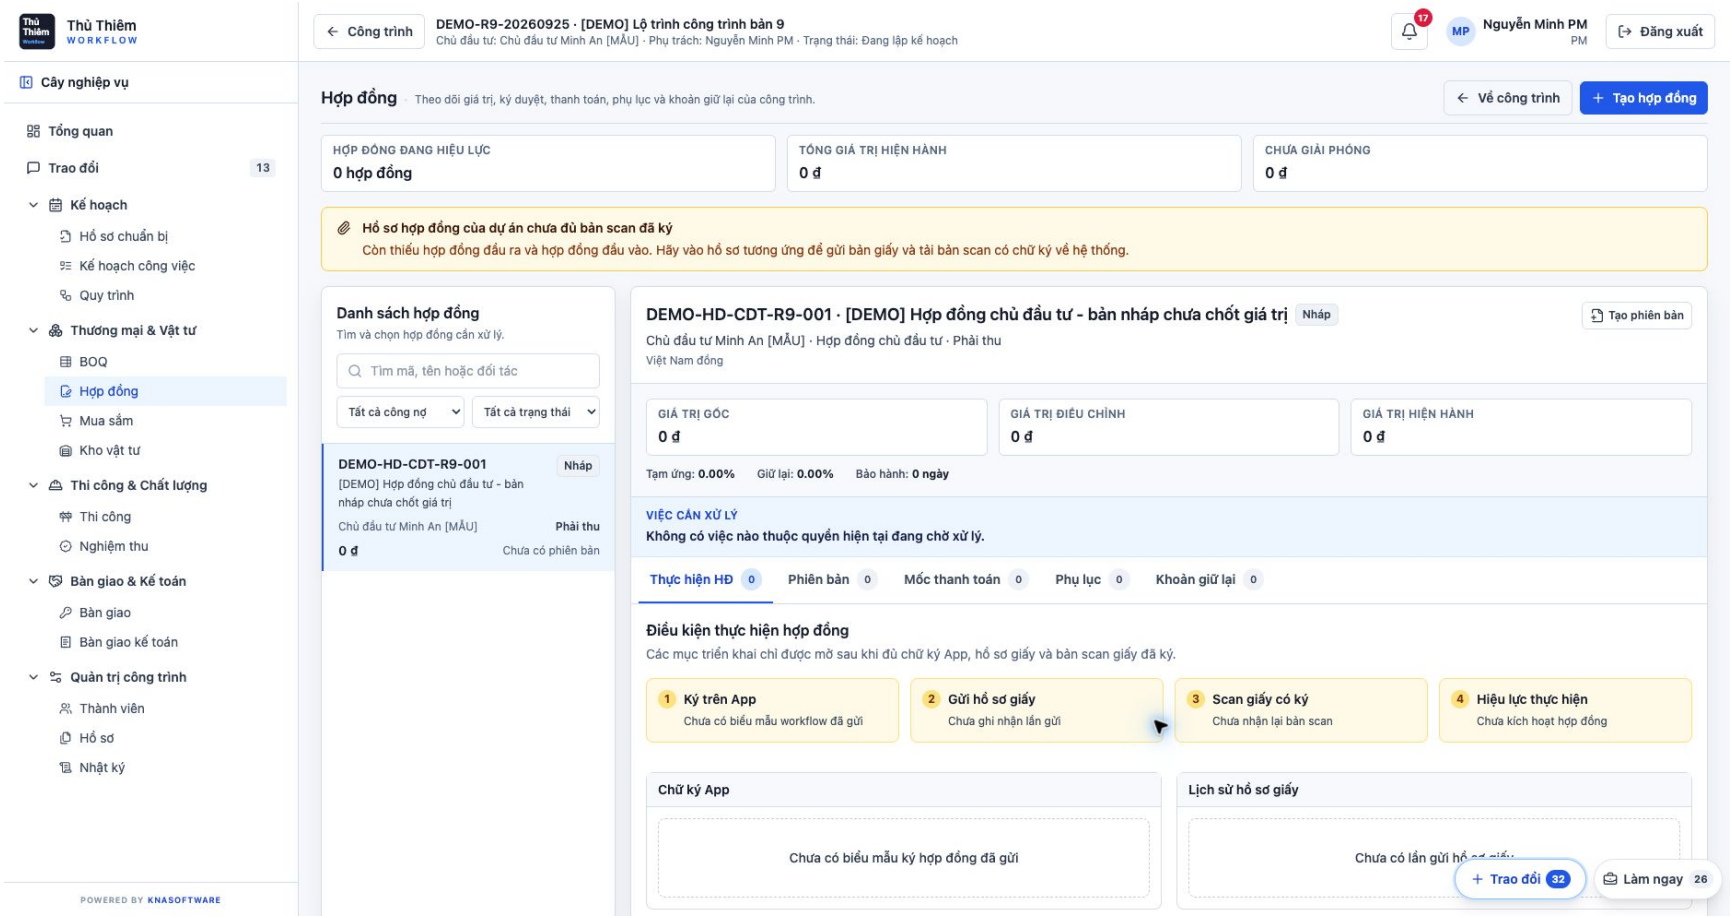


DEMO-HD-CDT-R9-001 ở trạng thái Nháp, chưa có phiên bản, chưa hiệu lực. Đây là hồ sơ của chính công trình Rev9.

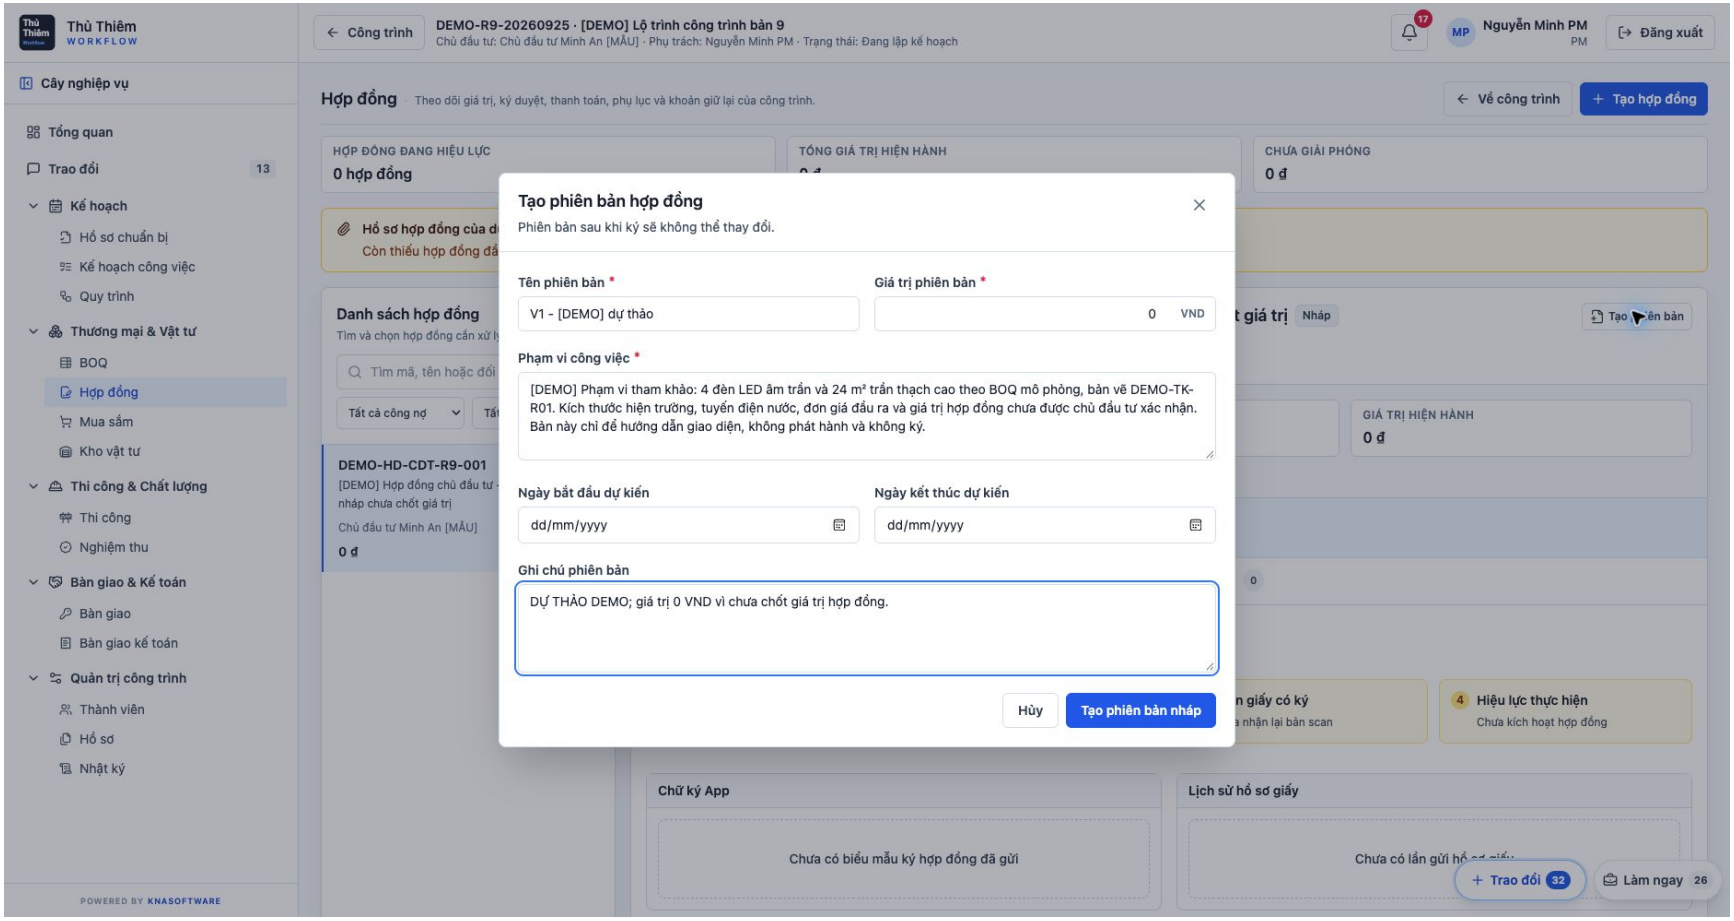


PM ghi phạm vi theo hai dòng BOQ mô phỏng, nêu rõ thiếu số đo và xác nhận chủ đầu tư; giá trị phiên bản bằng 0 đồng.

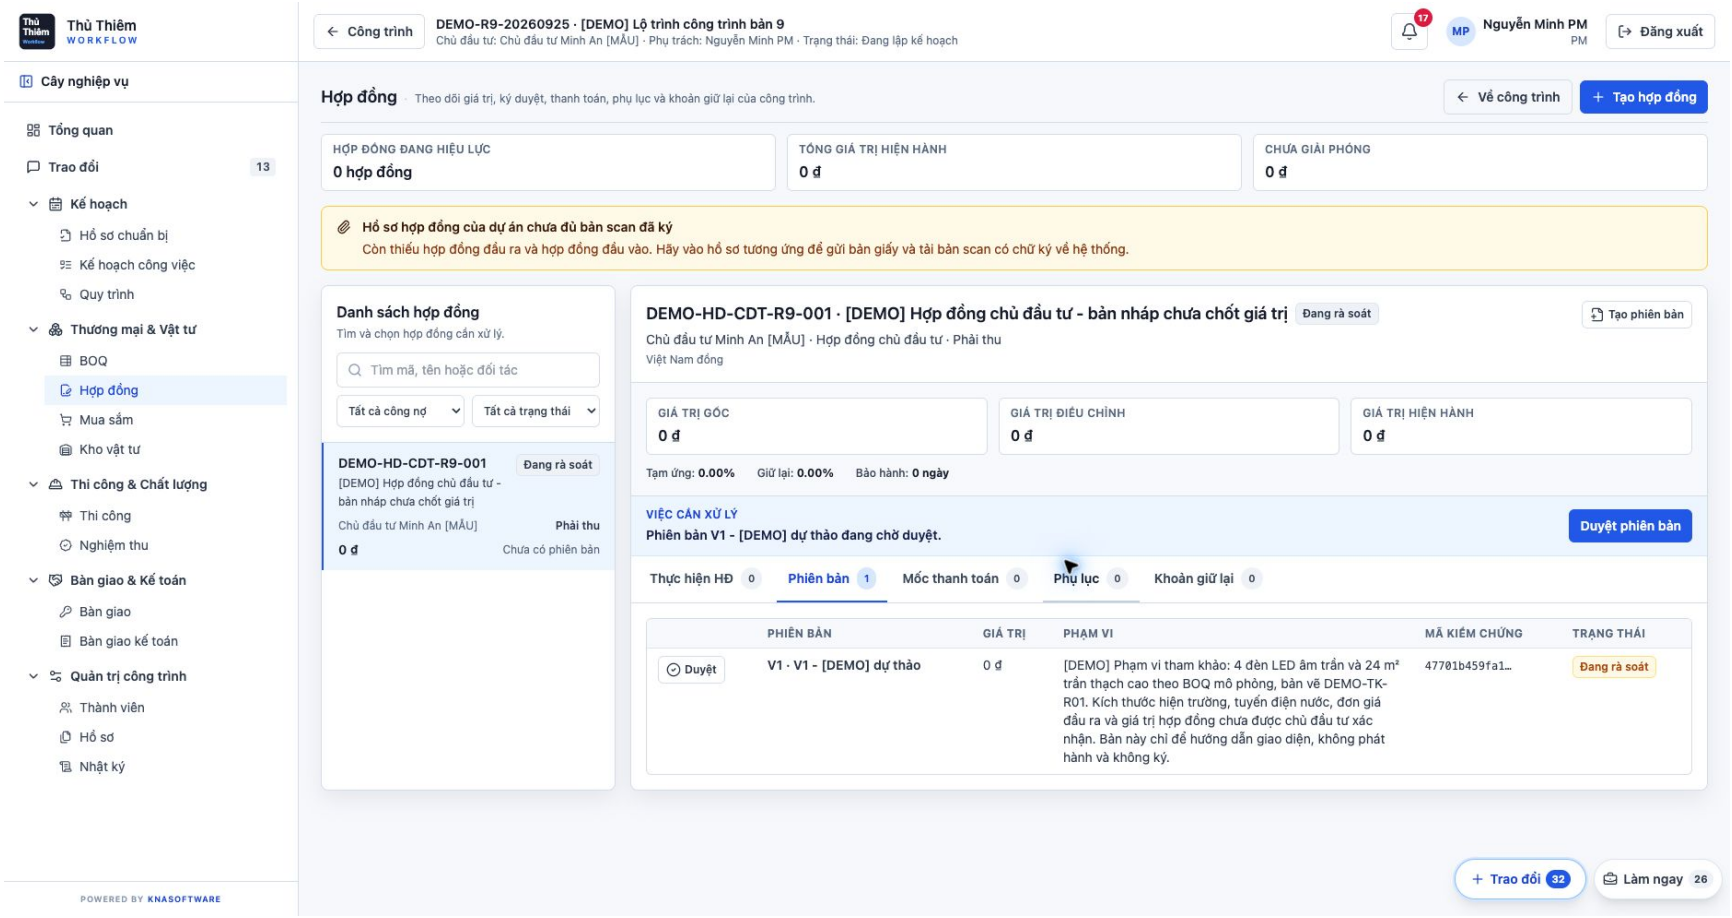


V1 **Đang rà soát**; nút Duyệt chỉ xuất hiện theo quyền PM. Không bấm duyệt khi bản dự thảo chưa đủ căn cứ.

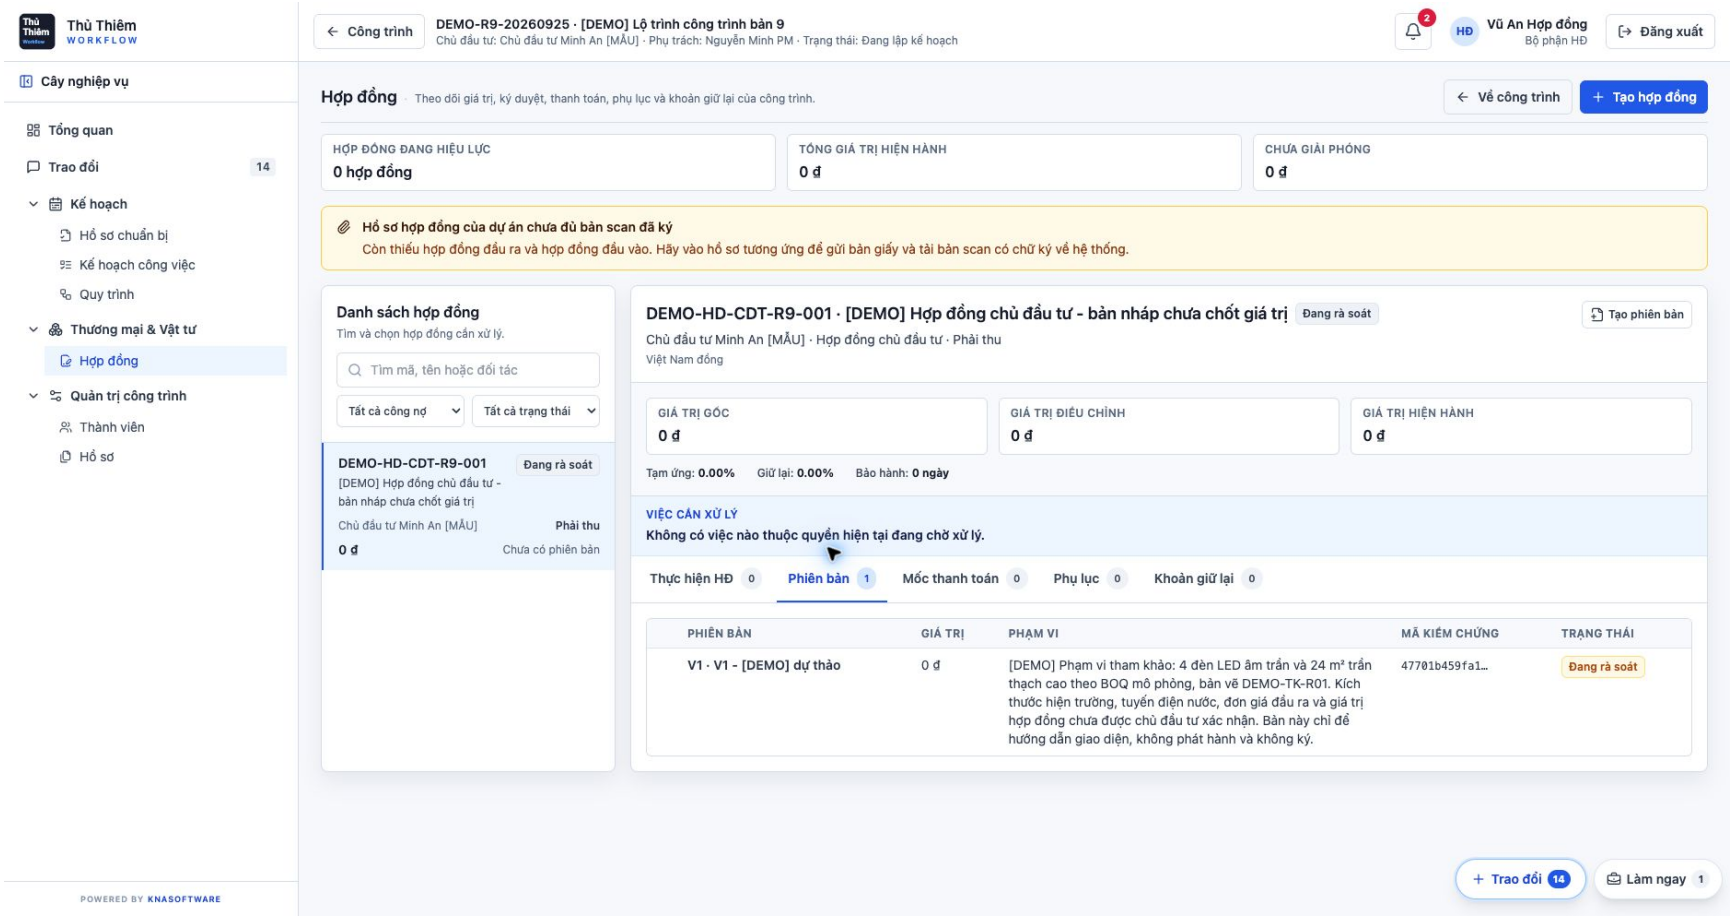


Bộ phận HĐ thấy V1 Đang rà soát và giá trị 0 đồng, nhưng cột Thao tác trống theo tài khoản này. Ý kiến bổ sung đã được gửi trong Trao đổi, chưa đổi trạng thái hợp đồng.

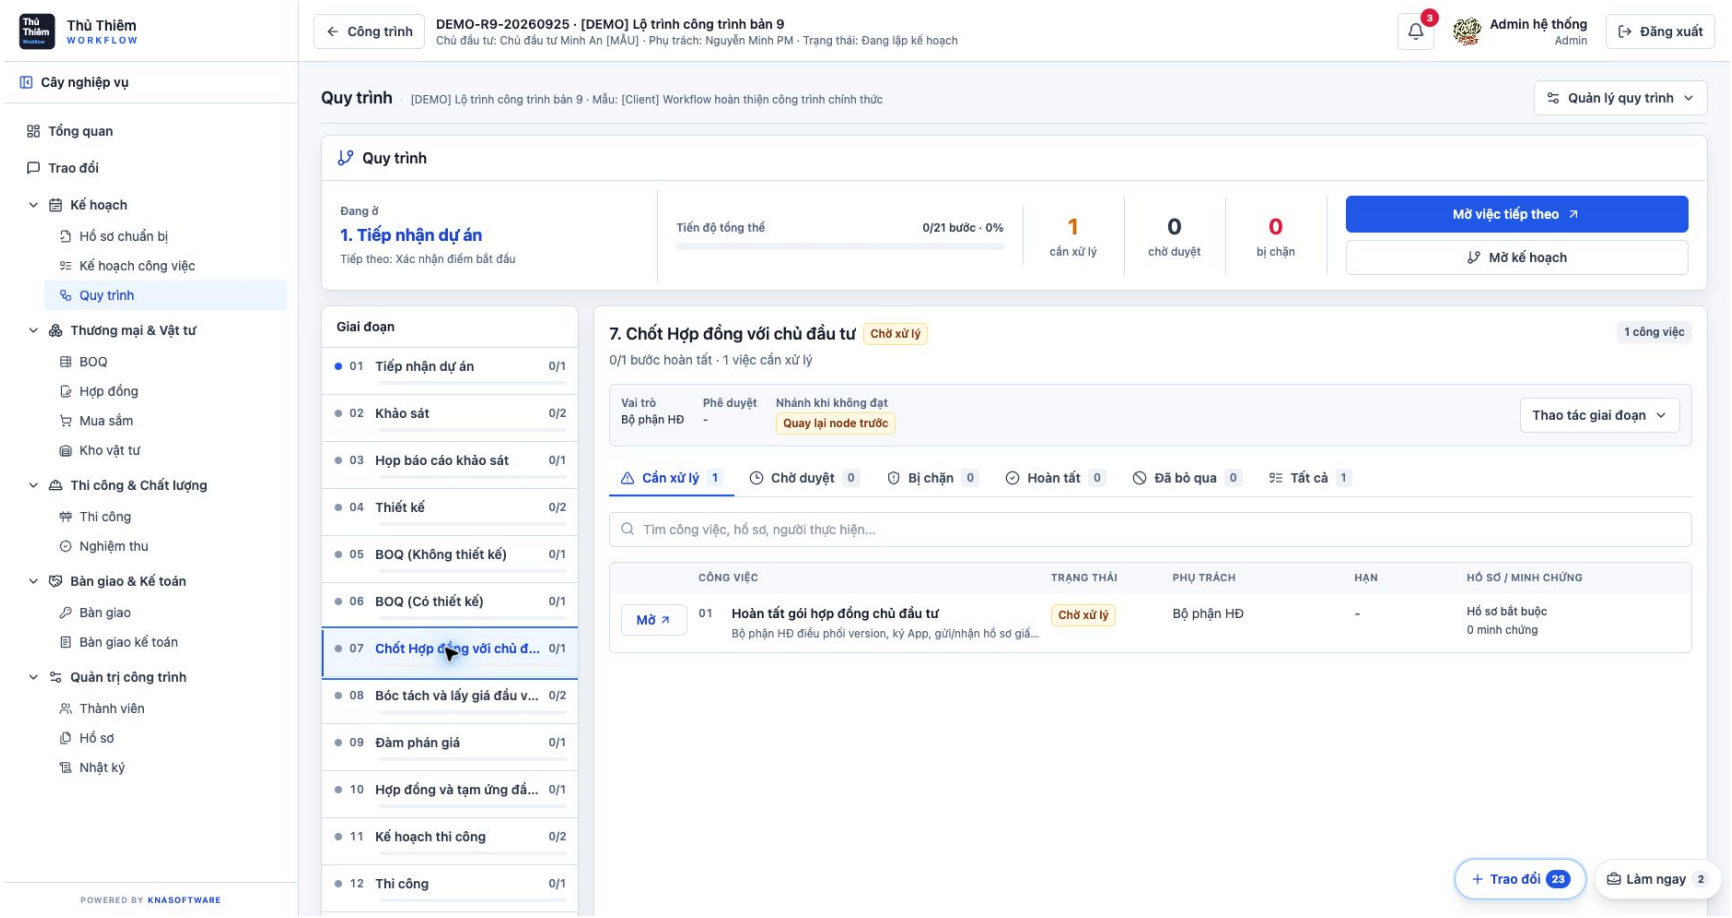


Ảnh 10 · Giai đoạn 07 của chính công trình Rev9 mới: Bộ phận HĐ phụ trách, gói hợp đồng còn chờ xử lý.

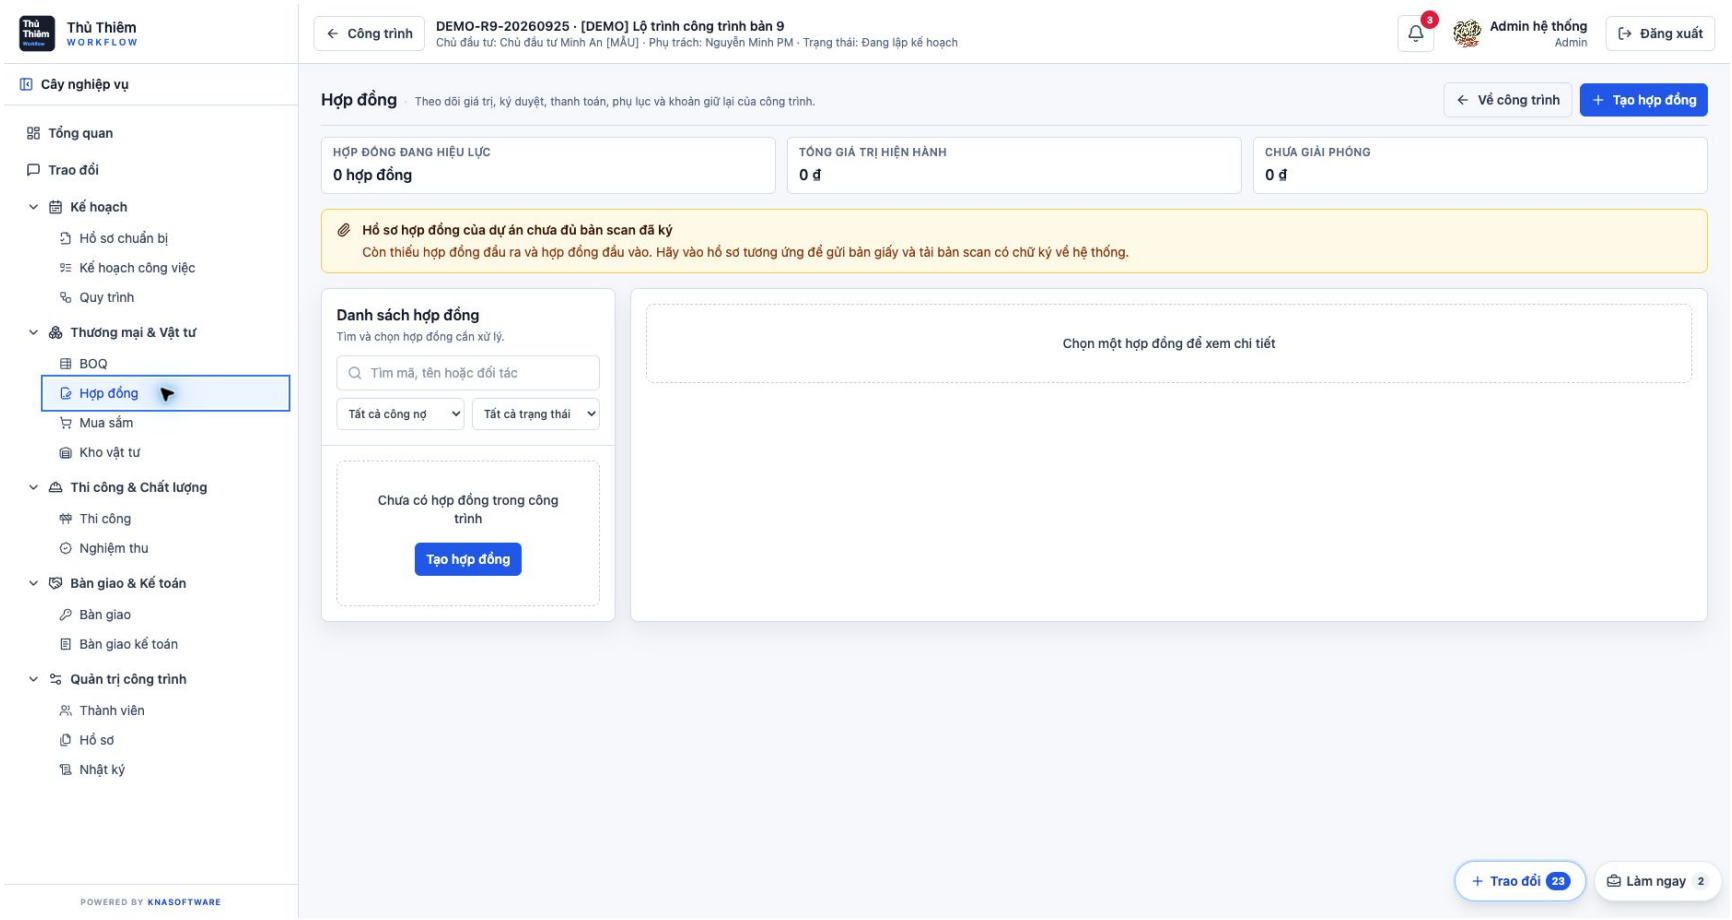

Ảnh 11 · Ảnh ở thời điểm ban đầu, công trình mới chưa có hợp đồng; giá trị dự kiến trong Thông tin công trình chưa tạo thành hợp đồng nguồn.

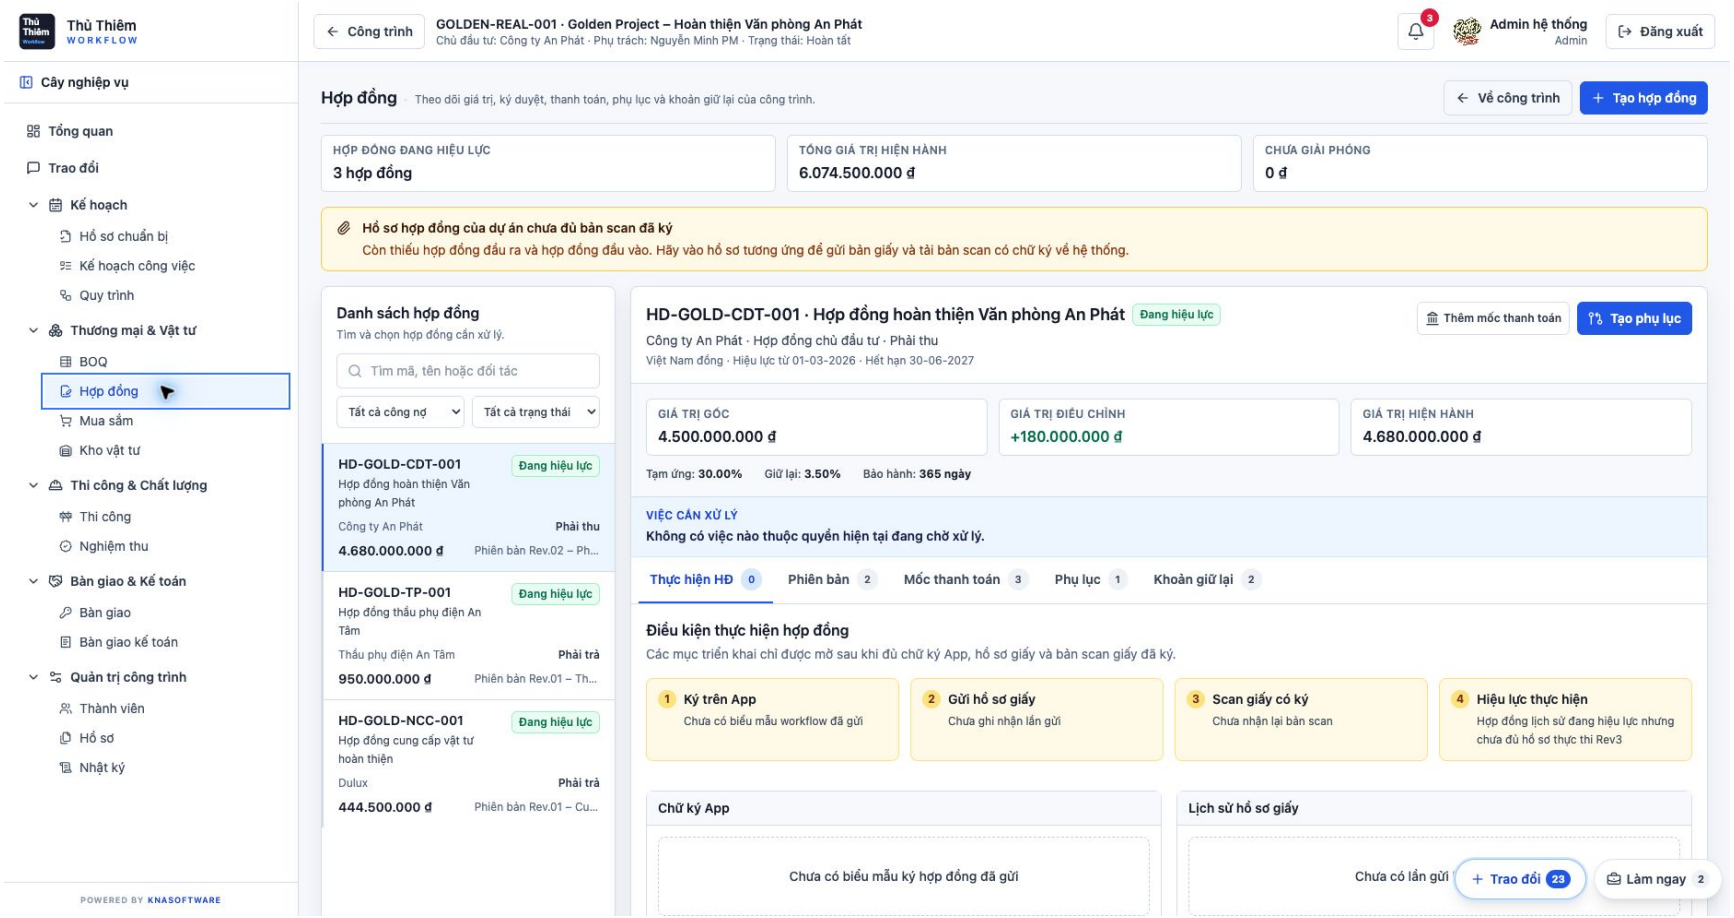

Ảnh 12 · Công trình mẫu GOLDEN-REAL-001: hợp đồng chủ đầu tư (phải thu), phiên bản/phụ lục/mốc thanh toán và bốn điều kiện thực hiện. Cảnh báo thiếu bản chụp hợp đồng đã ký vẫn còn trên hồ sơ mẫu lịch sử.

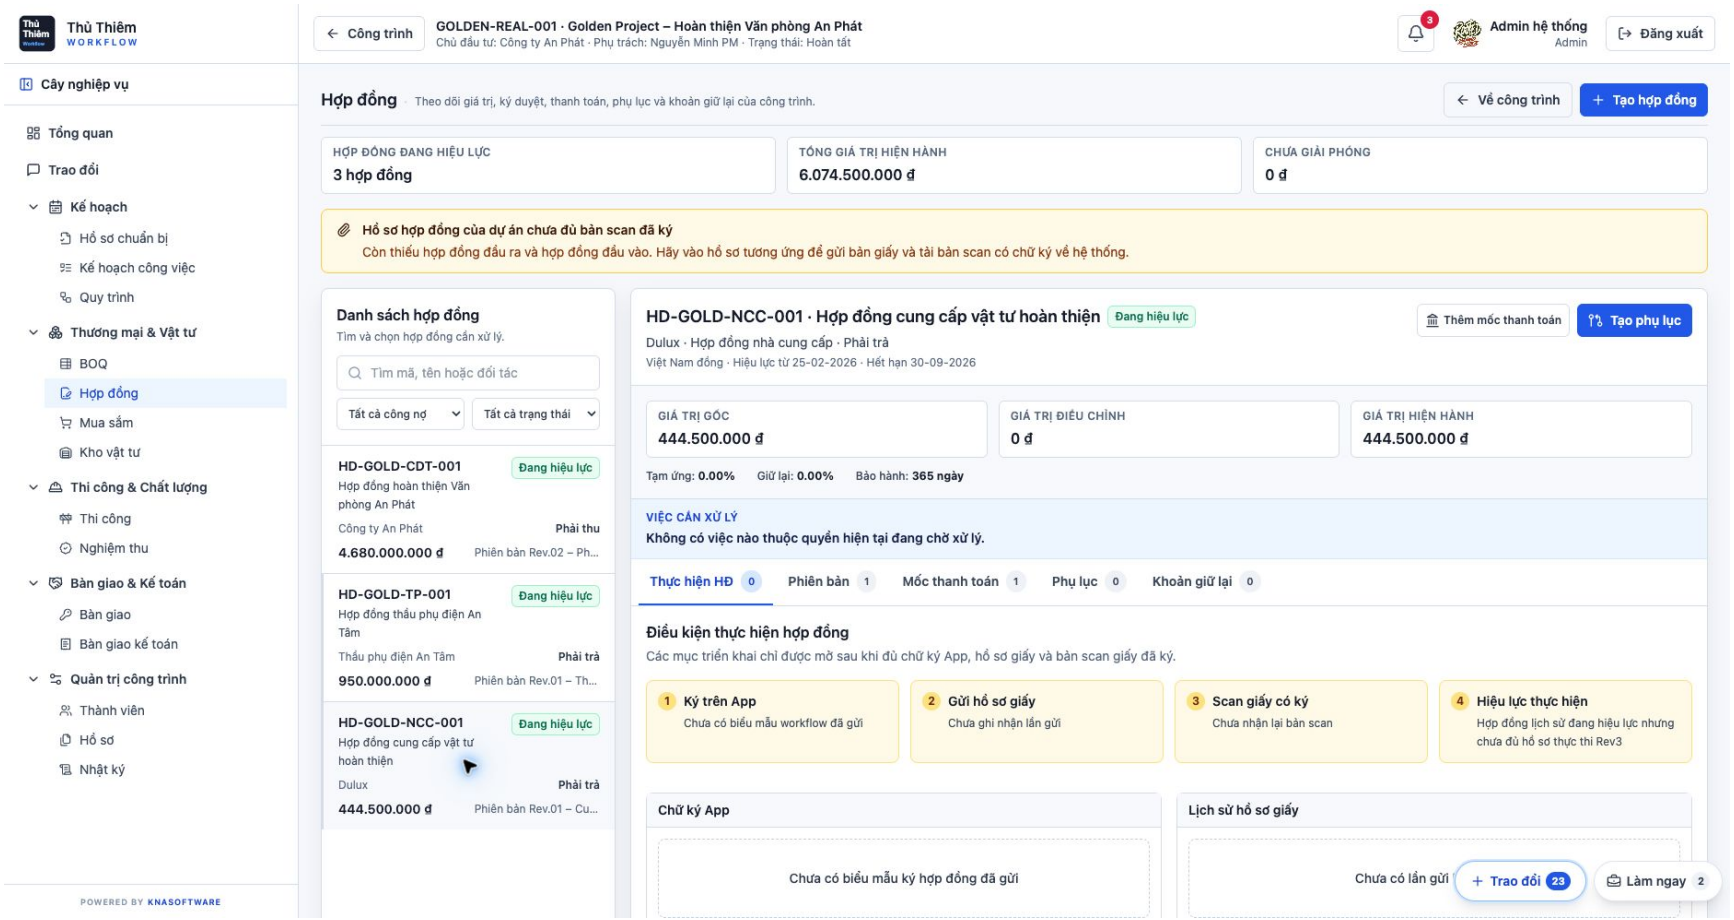


Ảnh 13 · Cùng công trình mẫu: hợp đồng nhà cung cấp Dulux là đầu vào (phải trả), tách biệt hợp đồng chủ đầu tư và yêu cầu mua.


6.7. Mua sắm: từ BOQ, báo giá tới hàng đã nhận

Mục đích: biết mua vật tư nào, từ nhà cung cấp nào, bằng đơn hàng nào, đã được duyệt và nhận đến đâu. Trên công trình Rev9, **PM** đã dùng quyền của mình duyệt BOQ, ghi báo giá giả lập và xử lý một yêu cầu mua; lịch sử ghi đúng PM là người thao tác. Trách nhiệm vận hành ở Giai đoạn 08–10 vẫn thuộc **QS** và **Mua hàng** theo từng Gói công việc. Mở **BOQ** để xem căn cứ khối lượng/giá và **Mua sắm** để theo dõi yêu cầu mua.


Mốc	Người làm và chức năng	Điều cần chỉ ra trên màn hình	Điều kiện để đi tiếp
Chốt BOQ và giá mua	**QS** xác nhận khối lượng; **Mua hàng** tập hợp báo giá, đối chiếu nhà cung cấp	Dòng BOQ, bản giá cuối và báo giá được chọn; nếu chọn giá thủ công phải có lý do	BOQ đã duyệt, giá cuối đã khóa; không tự lấy giá từ tin trao đổi
Tạo yêu cầu mua	**Mua hàng** là vai trò nghiệp vụ thường làm; trong lượt Rev9 **PM** đã thao tác từ BOQ và kiểm tra kết quả trong sổ Mua sắm	Yêu cầu mua dẫn về BOQ/báo giá; một nhà cung cấp có thể có nhiều dòng hàng	Tạo yêu cầu **không** làm tăng tồn kho hay tự lập khoản chi
Gửi và duyệt yêu cầu mua	Người lập gửi; **người có quyền duyệt mua** xem căn cứ và kết luận	Trạng thái chờ duyệt/đã duyệt hoặc cần chỉnh sửa; ý kiến duyệt lưu với nguồn	Chỉ người có quyền trong công trình mới duyệt; người lập xử lý yêu cầu sửa rồi gửi lại
Đặt hàng	**Mua hàng** thường ghi nhà cung cấp, số đơn và ngày giao; trong lượt Rev9 **PM** ghi DEMO-PO-R9-001 nội bộ	Yêu cầu mua chuyển sang theo dõi giao/nhận	Bản ghi PO [DEMO] **chưa được gửi nhà cung cấp**; không hiểu trạng thái "Đang giao / nghiệm thu" là hàng đã giao
Nghiệm thu đầu vào	**QA/QC** kết luận số lượng/chất lượng đạt; **Mua hàng** đối soát	"Yêu cầu", "Đạt nghiệm thu" và "Chờ nhập kho" là ba số riêng	Hàng đạt nghiệm thu **chưa** tự nằm trong kho
Ghi phiếu nhập kho	**Thủ kho** chọn đúng chứng từ nghiệm thu, kho nhận, vật tư, lượng nhập	"Đã nhập kho" tăng theo phiếu kho đã ghi; từng dòng vẫn nối về nguồn	Không nhập vượt lượng đạt chưa nhập; phiếu kho là chứng từ tăng tồn riêng

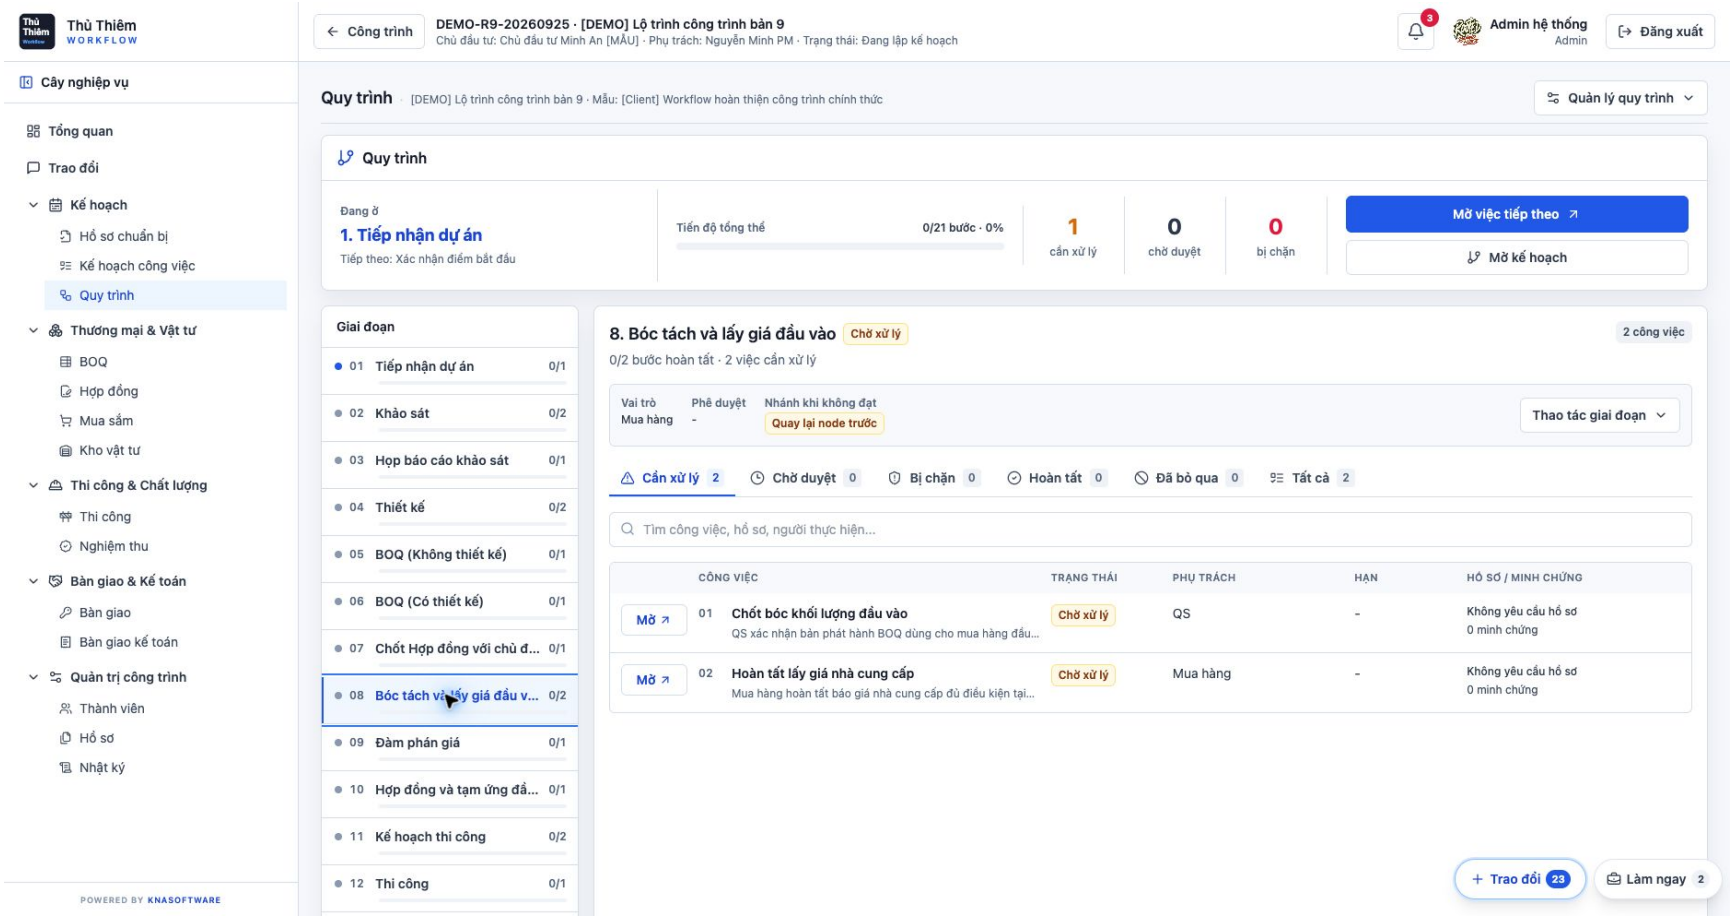

Ảnh 14 · Màn xem trước Giai đoạn 08 của công trình Rev9: QS sẽ chốt bản BOQ dùng cho mua; Mua hàng sẽ hoàn tất lấy giá nhà cung cấp. Giai đoạn này **chưa mở** trên công trình tham chiếu.

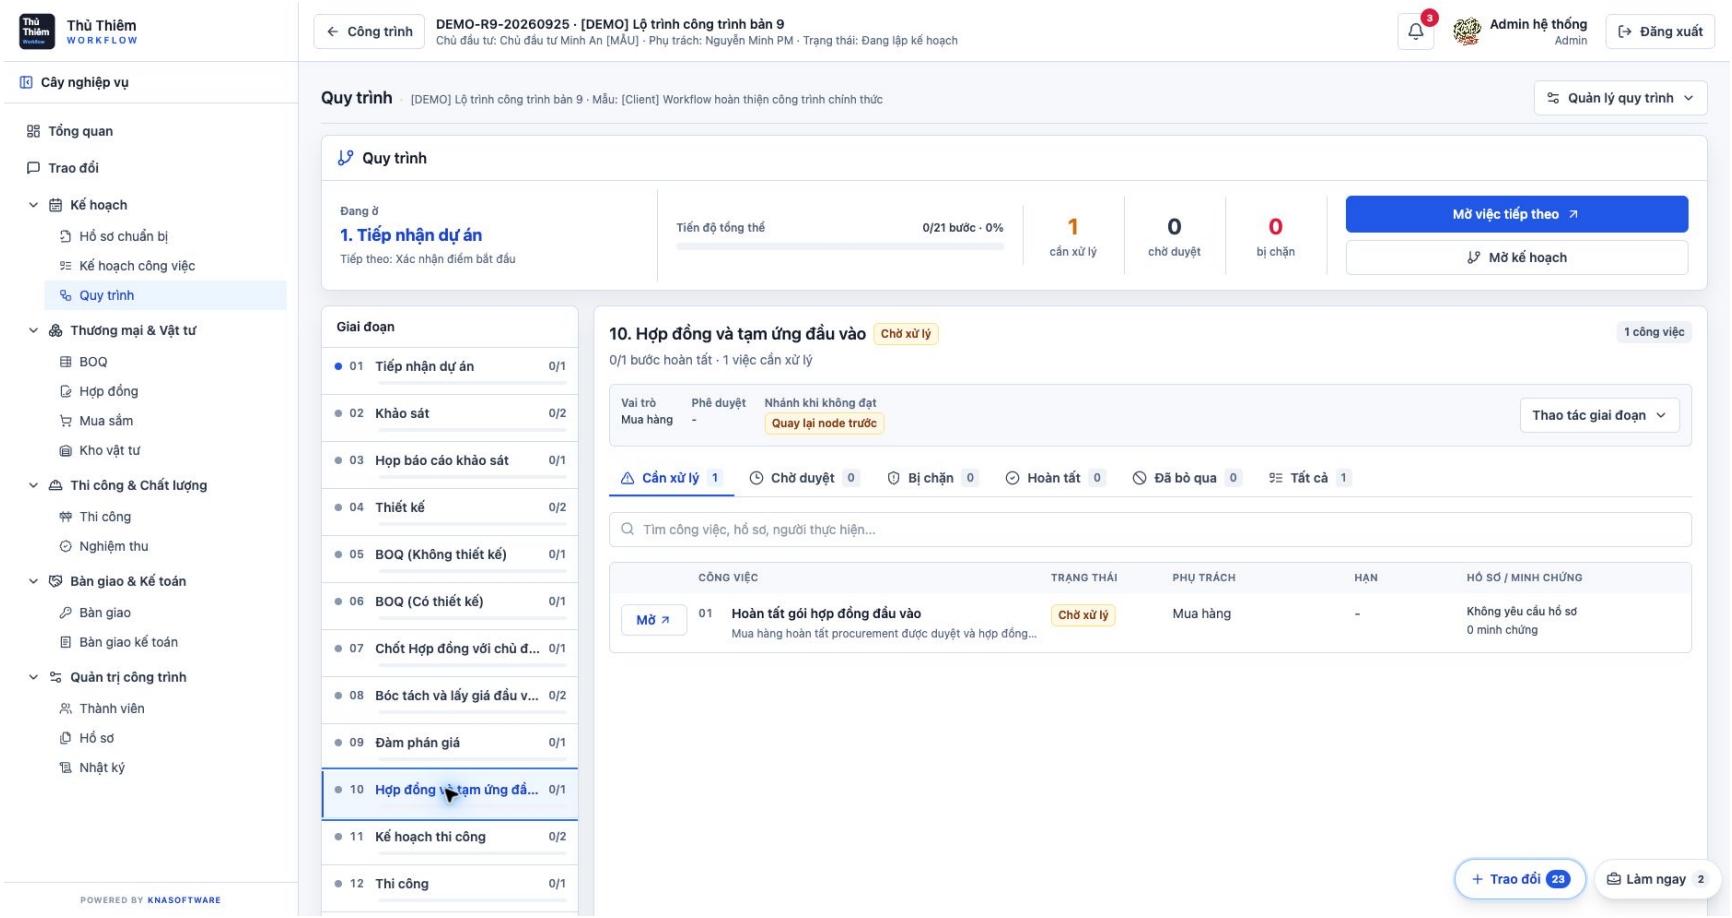


Ảnh 15 · Màn xem trước Giai đoạn 10 của công trình Rev9: sẽ kiểm tra yêu cầu mua được duyệt và hợp đồng đầu vào đủ điều kiện; Giai đoạn này **chưa mở**.

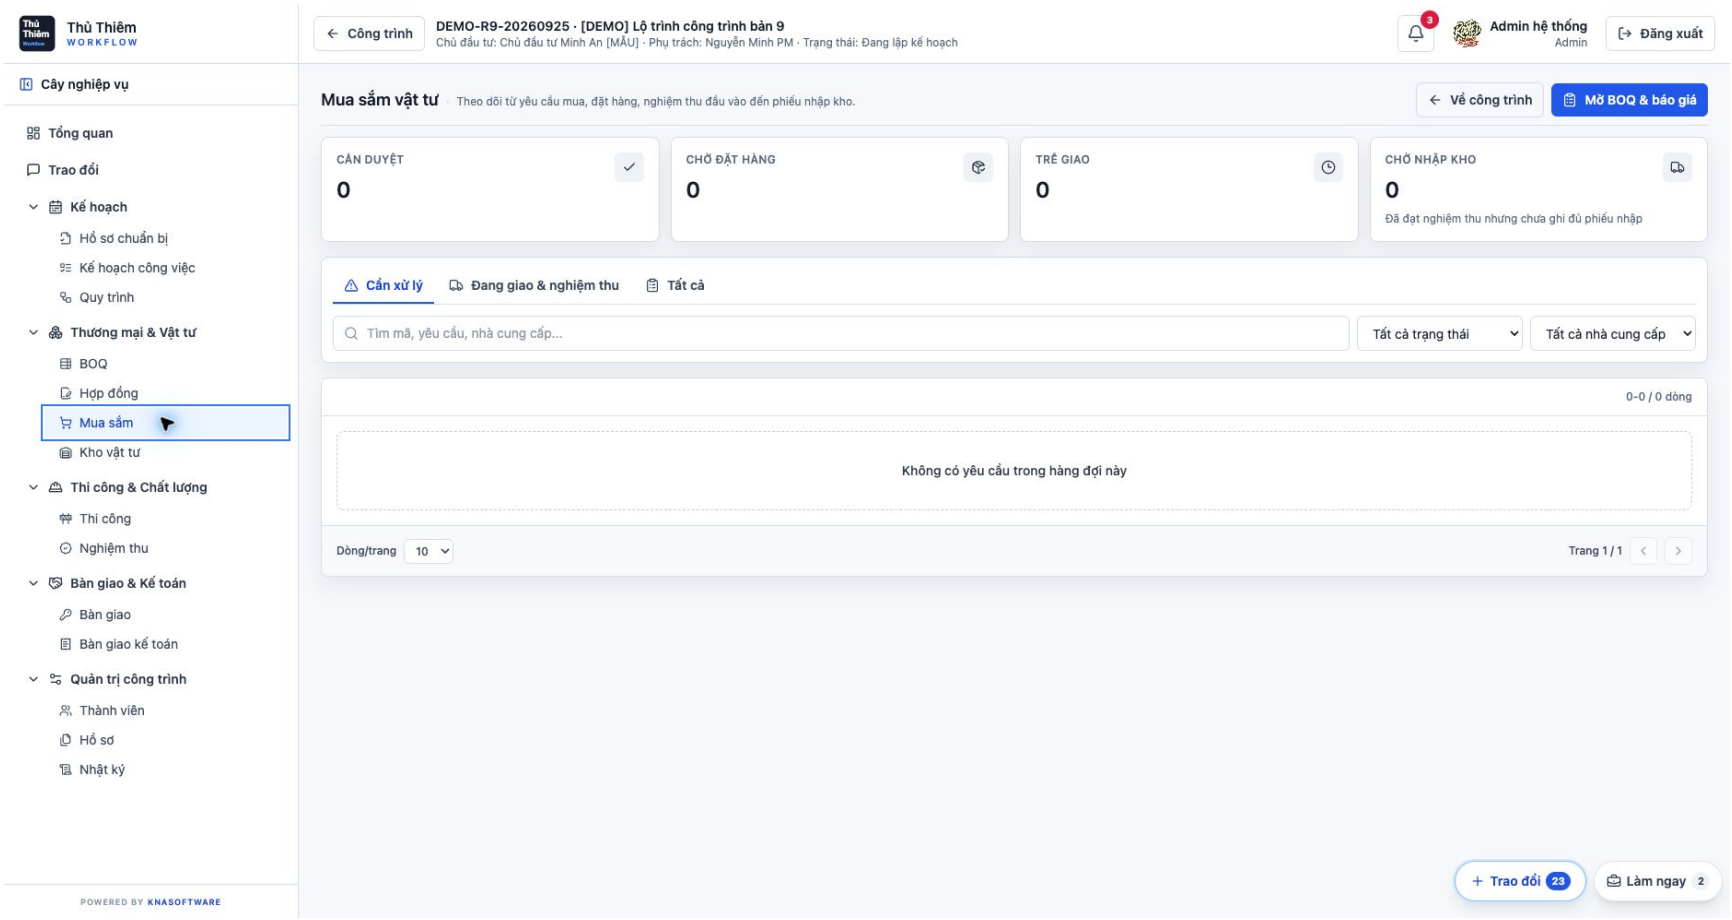


Ảnh 16 · Ảnh chụp **trước** khi tạo BOQ và yêu cầu mua của công trình Rev9. Xem các ảnh ngay dưới để thấy yêu cầu đã phát sinh về sau.


Yêu cầu mua đã ghi trên công trình Rev9: từ hai dòng BOQ đã duyệt và khóa giá, phần mềm ghi **một** yêu cầu PR-95fd70ab-1790301536-01, nhà cung cấp [UAT] Nhà cung cấp giả lập, hai mặt hàng, **7.400.000 đồng**. Màn hình lúc bấm **Tạo yêu cầu mua sắm** báo lỗi với mã tra cứu 6cdf0748-ea78-4146-ac03-cbc3d6ebc735, nhưng sổ Mua sắm và Trao đổi đều cho thấy yêu cầu đã được lưu. Khi gặp tình huống tương tự, **mở lại sổ kiểm tra trước khi thử lại** để tránh tạo hai yêu cầu cho cùng BOQ. PM đã duyệt yêu cầu đó và ghi PO mẫu, ngày giao dự kiến 28/09/2026; **đạt nghiệm thu 0/28, đã nhập kho 0**.

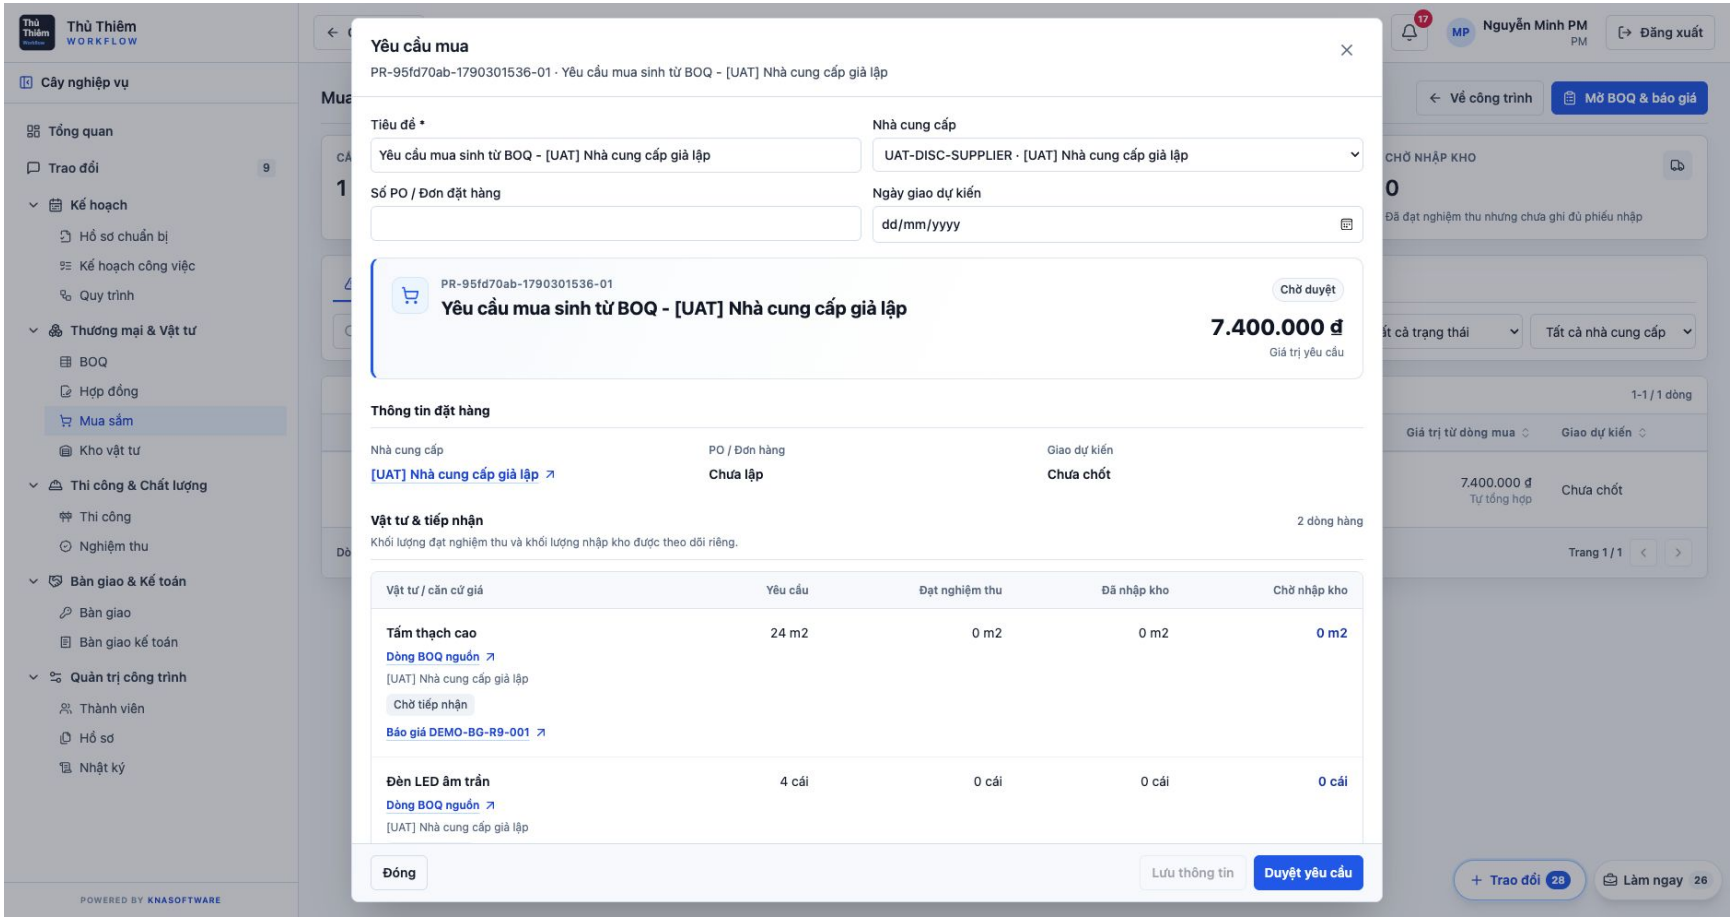


Hai dòng vật tư và liên kết về BOQ, báo giá nằm trong chính yêu cầu mua của công trình Rev9.

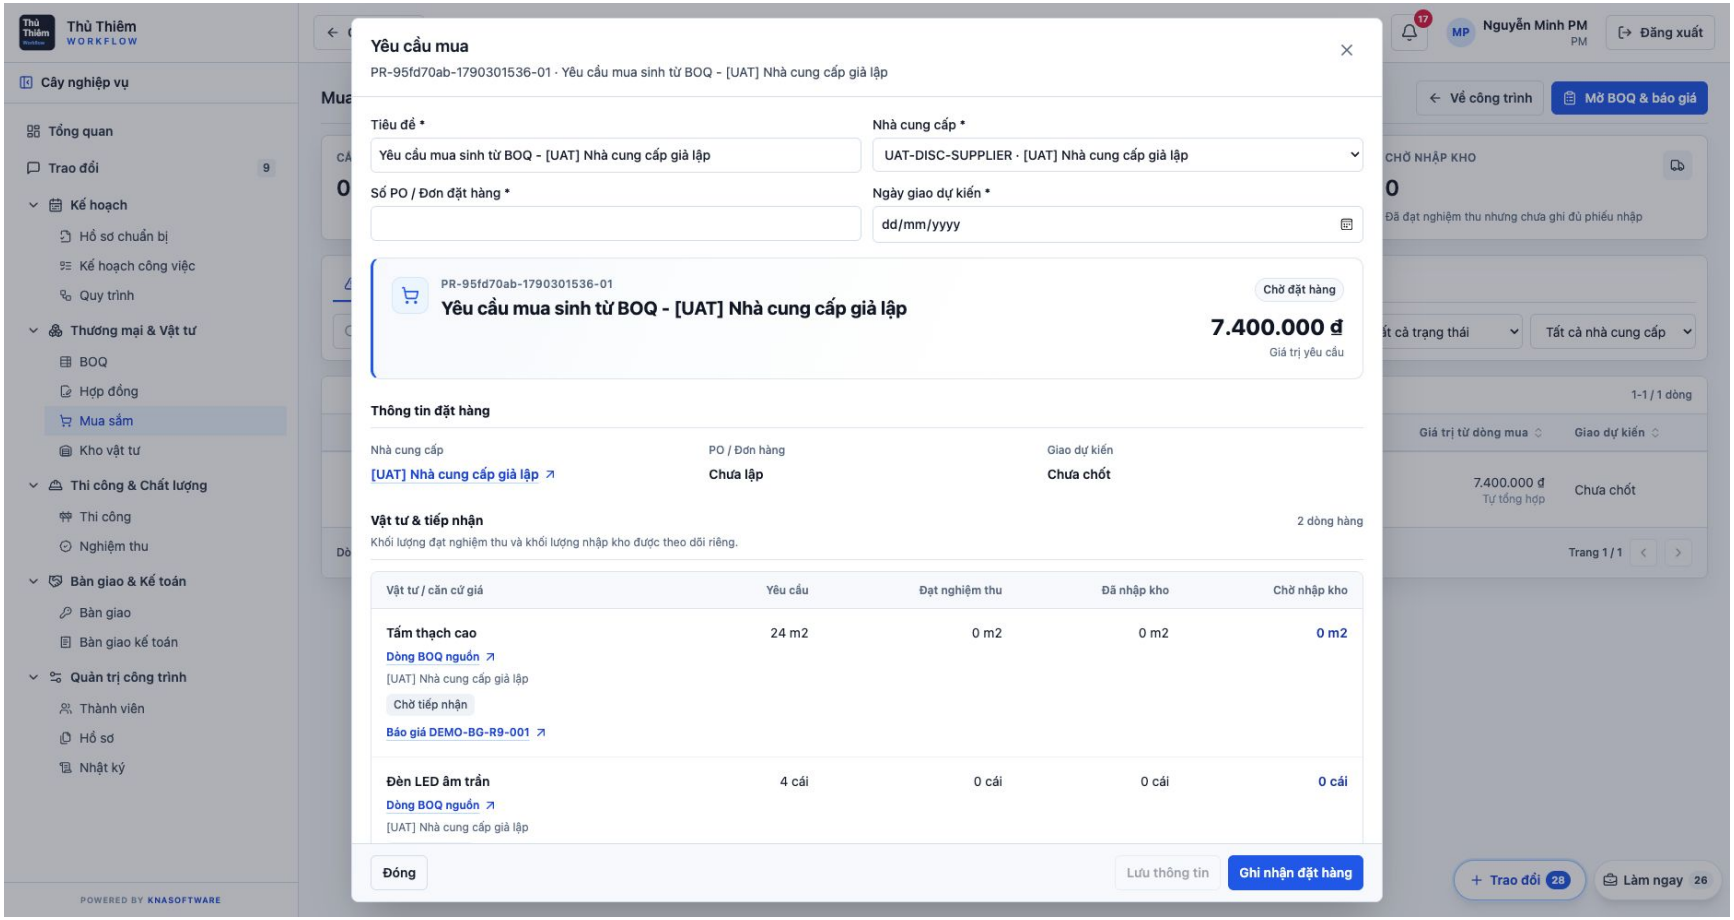


Yêu cầu chuyển Chờ đặt hàng; duyệt yêu cầu chưa tạo đơn hàng hoặc nhập kho.

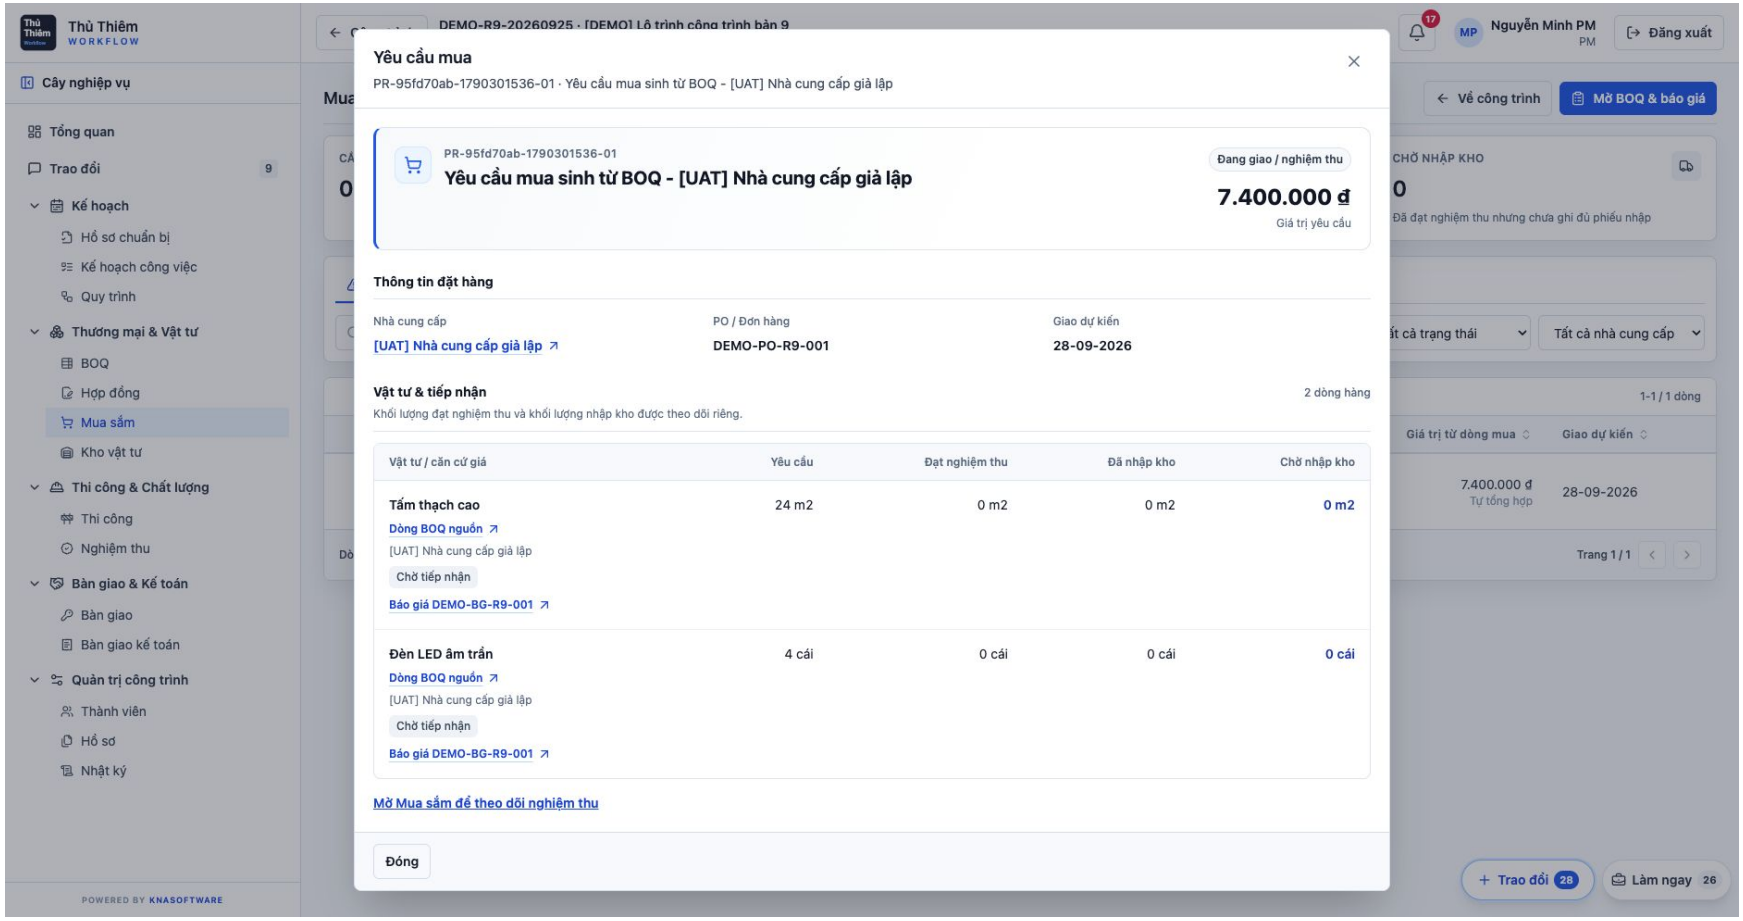

PO DEMO-PO-R9-001 và ngày giao dự kiến đã lưu trong phần mềm. Nhà cung cấp chưa nhận đơn, hàng chưa giao, chưa nghiệm thu hoặc nhập kho.

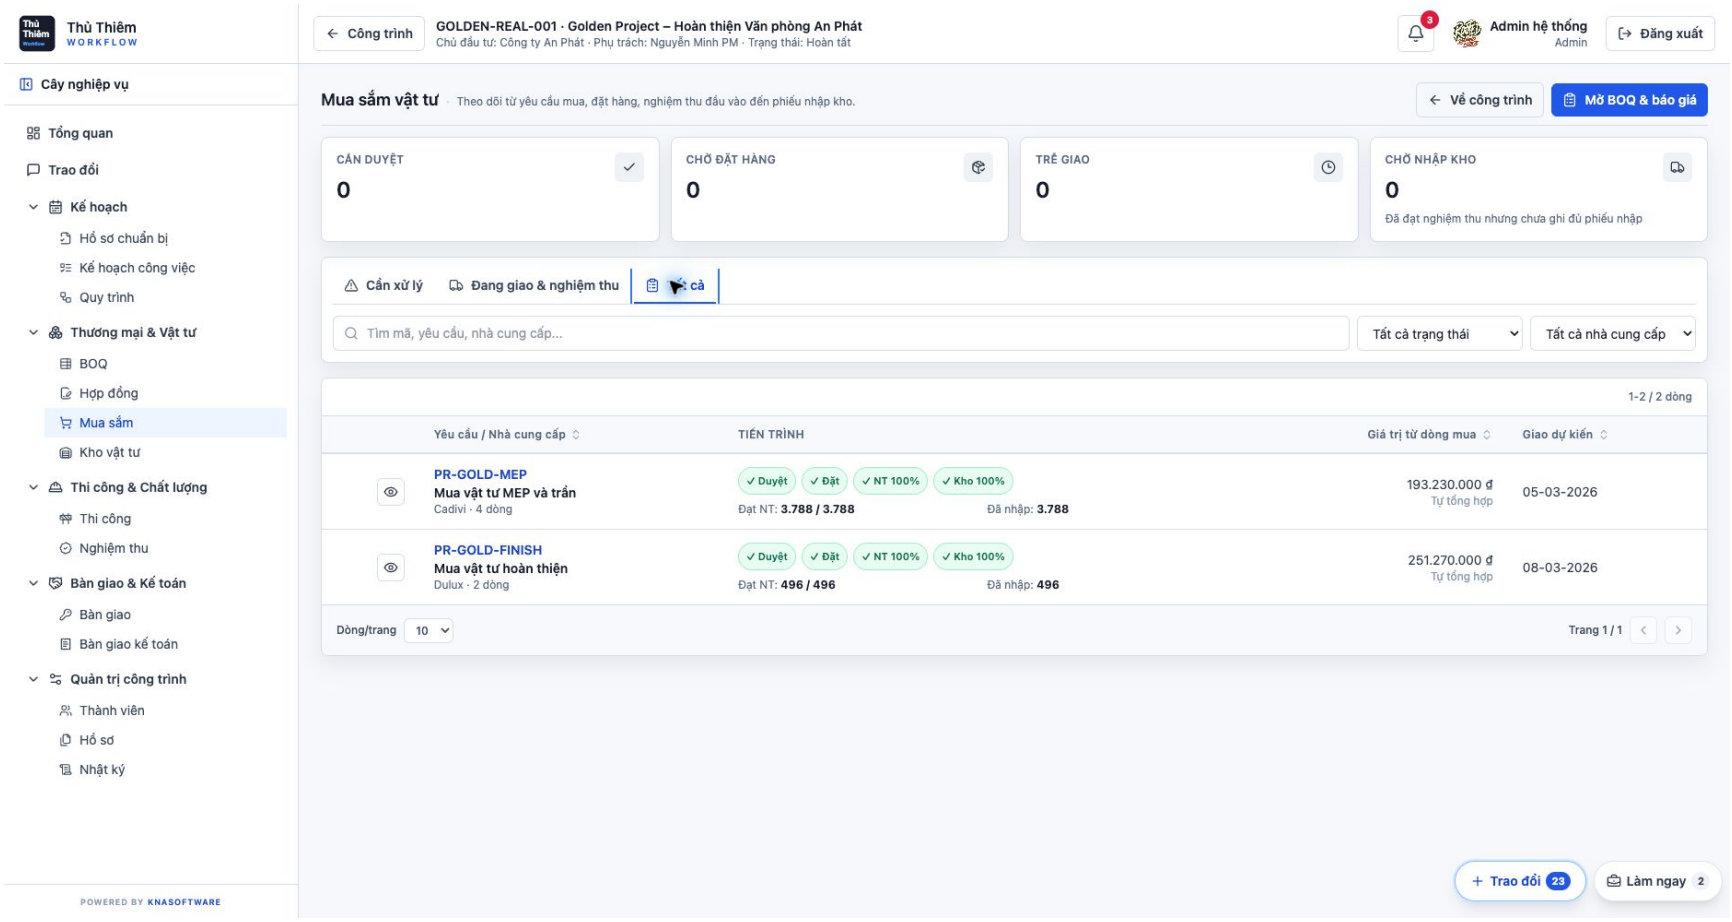

Ảnh 17 · Công trình mẫu GOLDEN-REAL-001, thẻ Tất cả: hai yêu cầu đã duyệt, đặt hàng, nghiệm thu và nhập kho; các nhãn NT/Kho là hai kết quả khác nhau.

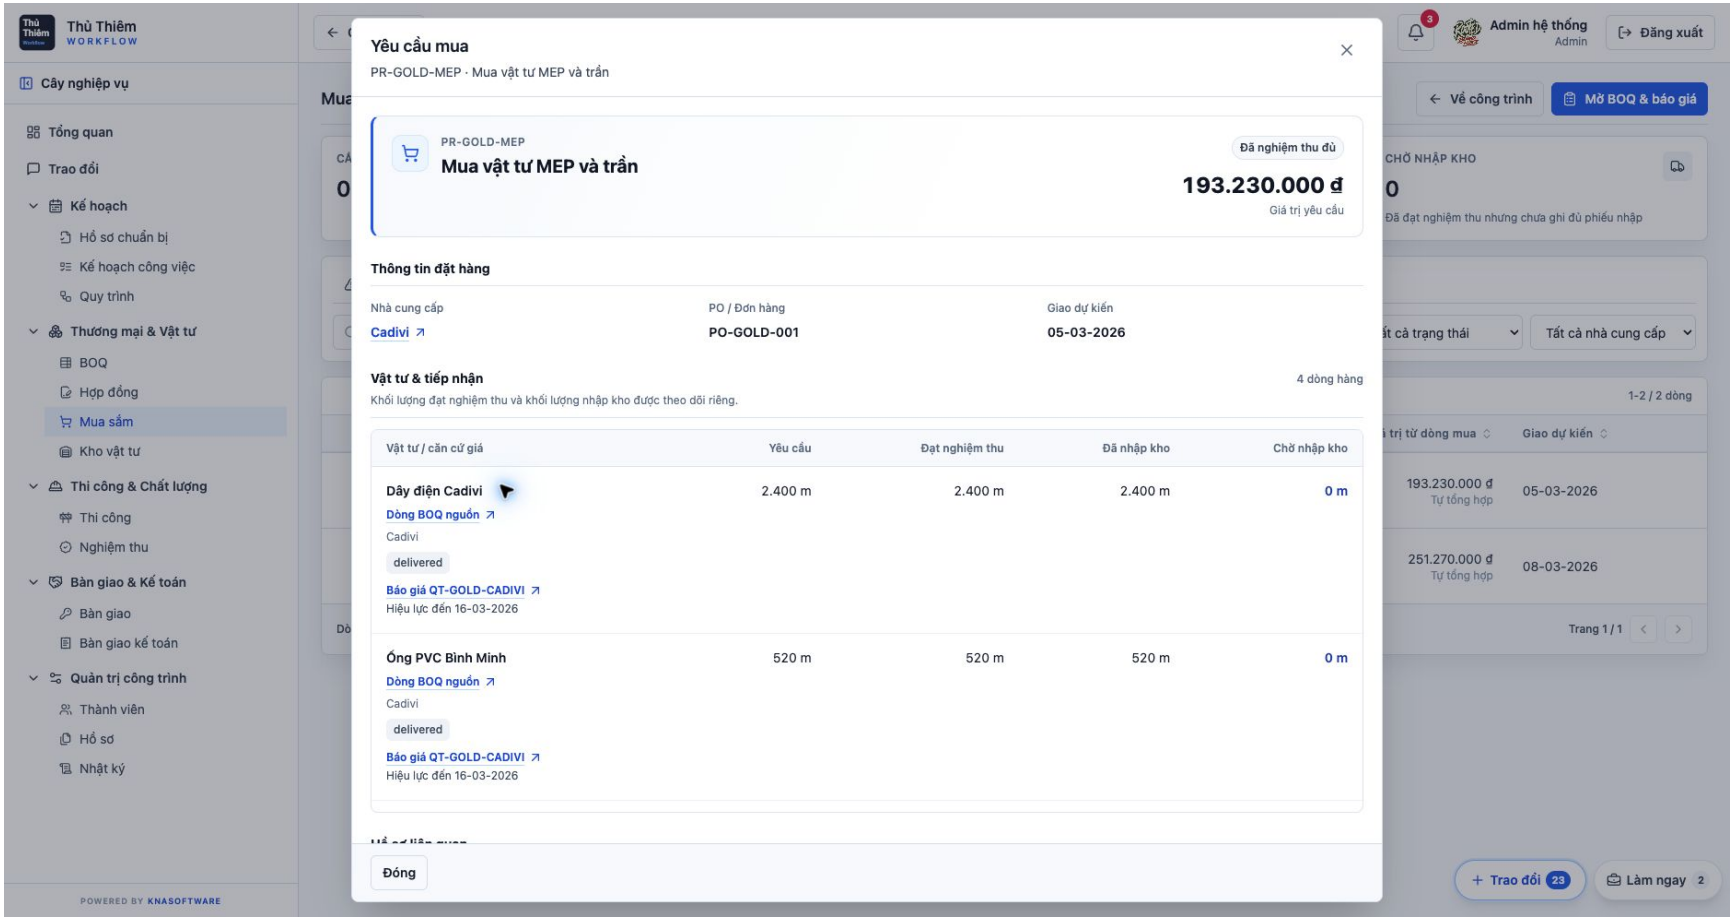


Ảnh 18 · Một yêu cầu mua mẫu cho thấy nhà cung cấp, số đơn đặt hàng, hạn giao và bốn cột lượng: yêu cầu, đạt nghiệm thu, đã nhập kho, chờ nhập kho.

6.8. Lấy vật tư: kiểm kho trước, mua phần còn thiếu


Mục đích: cấp đúng vật tư, đúng lượng và đúng công trình; một nhu cầu có thể tách thành **lấy từ kho** và **mua mới**. Tại **Kho vật tư › Tồn theo kho**, lọc kho nguồn, đối chiếu mã/đơn vị và lượng còn dùng được. Số tồn đang nhìn là tồn của kho; **chưa phải vật tư đã giao cho công trình**. Trong ảnh kho trung tâm, Sơn Dulux còn 80 thùng, Dây điện Cadivi còn 2.000 m; một số mã khác bằng 0.

Tình huống nguồn	Người tham gia và việc làm	Chứng từ/quan hệ cần có	Kết quả được phép nói
Kho còn đủ vật tư dùng được	**PM/Giám sát** xác nhận nhu cầu; **Thủ kho** chọn **Tạo phiếu kho › Xuất công trình**, kho nguồn, vật tư và số lượng	Phiếu xuất đã ghi gắn công trình, vật tư, kho, người thực hiện và biến động kho	Vật tư đã xuất ra công trình theo phiếu; Mua sắm không phải bước bắt buộc của nguồn này
Kho chỉ đủ một phần	PM/Giám sát xác nhận phần dùng trước; Thủ kho xuất lượng có sẵn; **QS/Mua hàng** làm nguồn mua cho phần thiếu	Phiếu xuất kho cho phần có sẵn và yêu cầu mua riêng cho phần thiếu, tránh đếm hai lần	Chỉ lượng trên phiếu xuất được coi là đã cấp; phần mua vẫn chờ duyệt/giao/nhận
Kho hết hoặc cần mua mới	**QS** chốt BOQ/khối lượng; **Mua hàng** lấy giá, tạo yêu cầu, trình duyệt và đặt; **QA/QC** nghiệm thu; **Thủ kho** lập phiếu nhập rồi phiếu xuất	BOQ › báo giá/chọn nhà cung cấp › yêu cầu mua/đơn đặt hàng › nghiệm thu đầu vào › phiếu nhập › phiếu xuất công trình	"Đã đặt", "đạt nghiệm thu", "đã nhập kho" và "đã xuất công trình" là bốn mốc khác nhau

Lời giải thích gọn: "Sơn có sẵn thì Thủ kho xuất thẳng cho công trình bằng phiếu xuất. Đèn đang hết tồn thì Mua hàng đi theo BOQ, báo giá và đơn hàng; QA/QC nghiệm thu đạt, Thủ kho ghi phiếu nhập, sau đó mới xuất cho công trình. Nếu chỉ đủ một phần, tách hai lượng và giữ hai bộ chứng từ." Vật tư có mã đơn vị vật lý phải chọn đúng đơn vị còn dùng được ở kho nguồn; số tồn tổng không thay thế việc kiểm tra tình trạng từng đơn vị. **Trong công trình Rev9, nhánh mua mới hiện dừng ở PO mẫu và 0 lượng hàng nhận; nhánh xuất thẳng từ kho mới được mở biểu mẫu, chưa ghi phiếu xuất.**

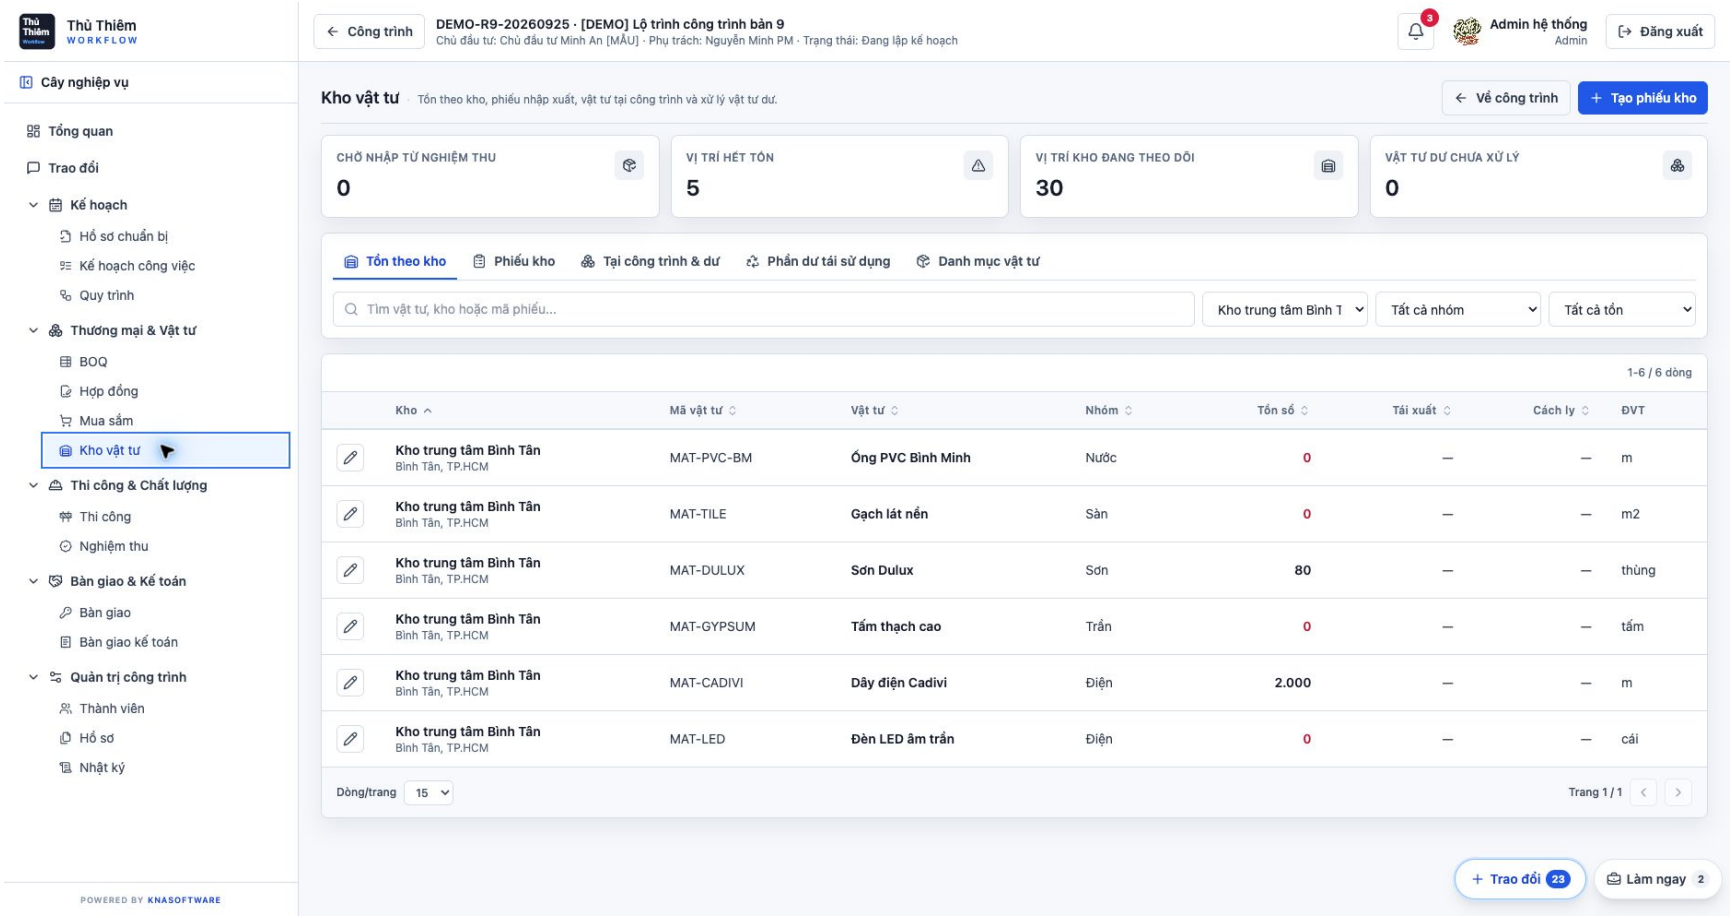

Ảnh 19 · Kho trung tâm Bình Tân có mã còn tồn và mã hết tồn; lọc trong trang công trình mới không có nghĩa số tồn đã dành riêng cho công trình mới.

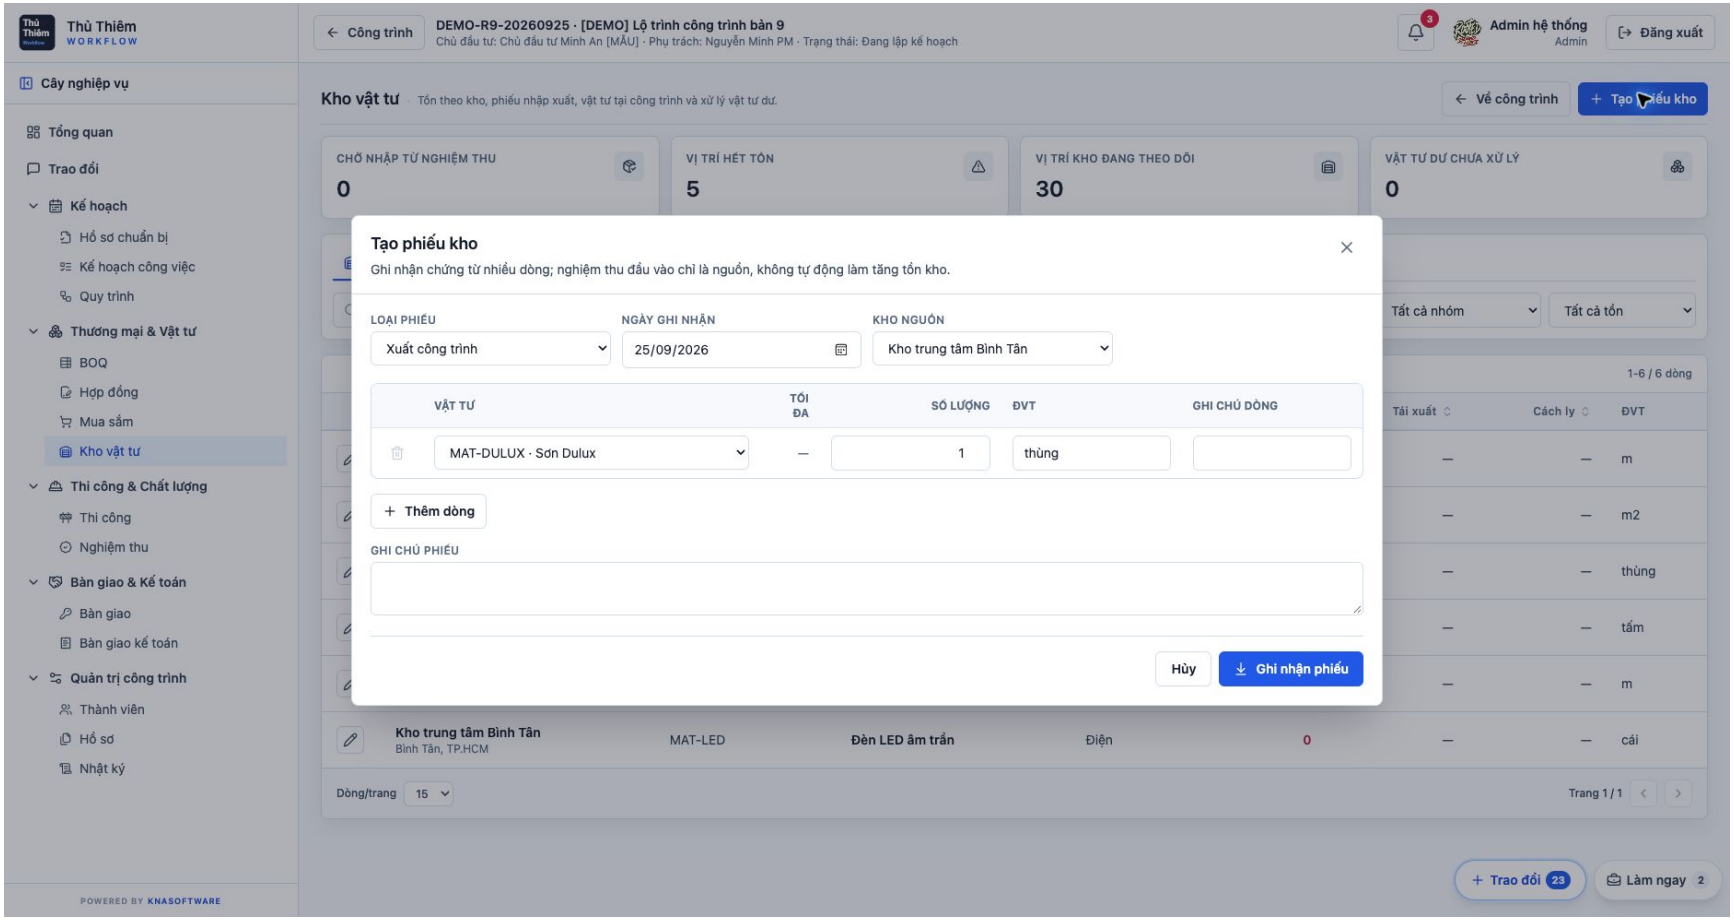


Ảnh 20 · Màn hình chọn loại "Xuất công trình", kho nguồn và Sơn Dulux trên công trình mới. Đây là **bản đang nhập để minh họa**, đã đóng bằng Hủy, chưa ghi phiếu hoặc trừ tồn.

7. Rà soát lại và phê duyệt: nói đúng tầng quyết định

Tầng quyết định	Mục đích	Ai gửi	Ai kết luận	Nếu chưa đạt
Rà soát Đầu việc/hồ sơ	Kiểm tra nội dung, ảnh, biên bản hoặc nguồn nghiệp vụ	Người phụ trách Gói công việc	Người có quyền rà soát/duyệt được phần mềm cho phép	Nêu rõ mục cần sửa; người làm bổ sung trên đúng hồ sơ rồi gửi lại
Duyệt hồ sơ nguồn	Quyết định của BOQ, hợp đồng, yêu cầu mua, biên bản nghiệm thu...	Người tạo/gửi hồ sơ nguồn	Vai trò có quyền quyết định ở màn hình nguồn	Hồ sơ nguồn quay lại trạng thái cần bổ sung; Đầu việc chưa tự hoàn tất
Duyệt Giai đoạn 02	Xác nhận gói khảo sát và biên bản đã được xem xét trước cuộc họp chọn nhánh	PM gửi yêu cầu sau khi 2/2 gói hoàn tất	Giám sát Cao Nhất Hiệp đã duyệt trên công trình Rev9	Ghi rõ số liệu/ảnh còn thiếu; PM và Giám sát sửa trên hồ sơ nguồn rồi gửi xét lại
Duyệt Giai đoạn 03	Chốt nhánh sau họp khảo sát	Người yêu cầu duyệt Giai đoạn	Một người thuộc PM/QS/Giám sát, khác người gửi	Trả về để bổ sung biên bản hoặc căn cứ chọn nhánh
Duyệt Giai đoạn 15	Xác nhận hoàn tất Bàn giao công trình và hồ sơ kế toán	Người yêu cầu duyệt Giai đoạn	Một người thuộc Kế toán/PM/Giám đốc, khác người gửi	Xử lý đúng hồ sơ Bàn giao hoặc hồ sơ kế toán còn thiếu

Trên công trình Rev9, PM gửi yêu cầu duyệt Khảo sát, Giám sát Hiệp duyệt; PM gửi yêu cầu duyệt Họp báo cáo khảo sát, QS Trần Hà duyệt. Mỗi ý kiến có điều kiện phải đo lại kích thước và rà tuyến điện nước. Người gửi không tự duyệt yêu cầu của mình; nút **Yêu cầu chỉnh sửa** đưa hồ sơ về cho người làm bổ sung, còn **Từ chối** là kết luận không chấp nhận. Chỉ dùng nút duyệt khi công trình đã đến đúng Giai đoạn và người đăng nhập thực sự có quyền. "Hoàn tất Đầu việc", "duyệt hồ sơ nguồn" và "chuyển Giai đoạn" là ba thao tác khác nhau. Ảnh 7g–7p cho thấy hai lần duyệt và chuyển Giai đoạn đã ghi nhận.

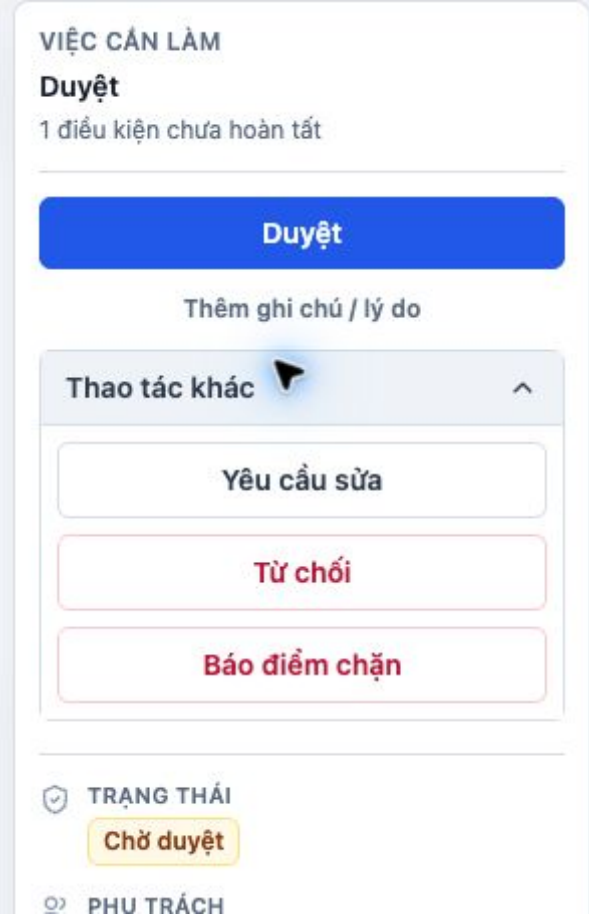


Ảnh 21 · Vùng quyết định của một Đầu việc mẫu đang Chờ duyệt. Ảnh còn báo một điều kiện chưa hoàn tất: người được giao cần mở điều kiện này và bổ sung hồ sơ trước khi kết luận. Lựa chọn tại Giai đoạn hoặc hồ sơ nguồn phụ thuộc đúng quyền và tình trạng của hồ sơ đó.

8. Thi công: Nhật ký › Kiểm tra › Cần xử lý


Mục đích chính: ghi thực tế hiện trường, so với tiêu chí kiểm tra, giao người khắc phục và xác nhận đã sửa. Vào **Thi công**. Khi chưa đến Giai đoạn Thi công, các hồ sơ cũ còn xem được nhưng tạo mới bị khóa.

Mục	Nội dung và quan hệ	Người ghi/tạo	Người xem xét hoặc kết luận
Nhật ký	Ngày, việc đã làm/đang làm/sẽ làm, nhân lực, vật tư, tiến độ, ảnh; có thể mở Kiểm tra hoặc Cần xử lý gắn với nhật ký	Giám sát là vai trò chính của Gói công việc; Đội thi công hỗ trợ nội dung thực tế	Người nhận báo cáo được chọn khi gửi, thường PM; xác nhận đã đọc/yêu cầu bổ sung báo cáo **không phải** nghiệm thu chất lượng
Kiểm tra	Tiêu chí, vị trí, lịch, ảnh hiện trạng và ảnh kết quả; kết luận Đạt/Không đạt	Giám sát/QA/QC hoặc người được giao có quyền kiểm tra	Người có quyền ghi kết quả kiểm tra; nếu Không đạt, hệ thống tạo một việc cần xử lý liên kết
Cần xử lý	Việc khắc phục, người được giao, hạn, bằng chứng hoàn thành; nối về Kiểm tra hoặc Nhật ký nguồn	Giám sát/PM/QA/QC hoặc người có quyền giao việc	Đội thi công/Thầu phụ xử lý; PM/QA/QC hoặc người có quyền xác nhận kết quả. Không đạt thì mở lại, giữ lịch sử cũ


Ví dụ quan hệ giữa các hồ sơ: Giám sát ghi Nhật ký ngày thi công trần. Kiểm tra cao độ không đạt. Hệ thống mở một việc khắc phục; tổ đội sửa và đính ảnh. Người kiểm tra xác nhận đạt rồi mới đưa hạng mục sang Nghiệm thu. Ảnh mẫu có lịch sử nhân sự cũ đã ngừng tài khoản; khi áp dụng cho công trình khác, cần giao người đang hoạt động.

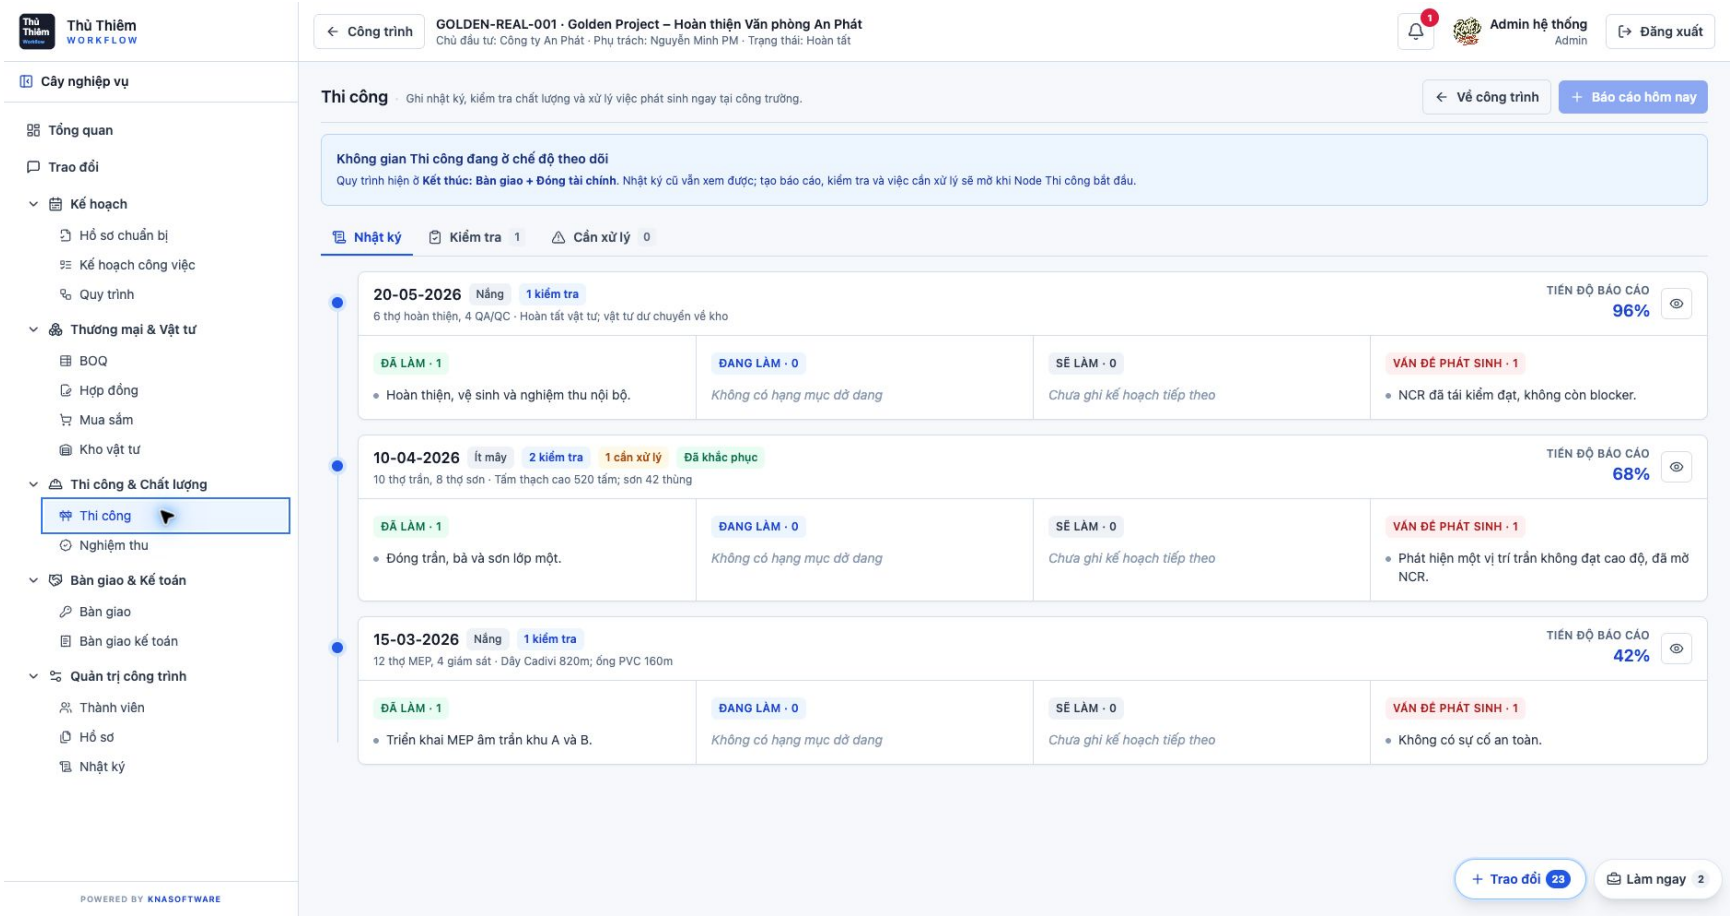

Ảnh 22 · Các ngày thi công cùng việc đã làm, tình hình và vấn đề phát sinh.

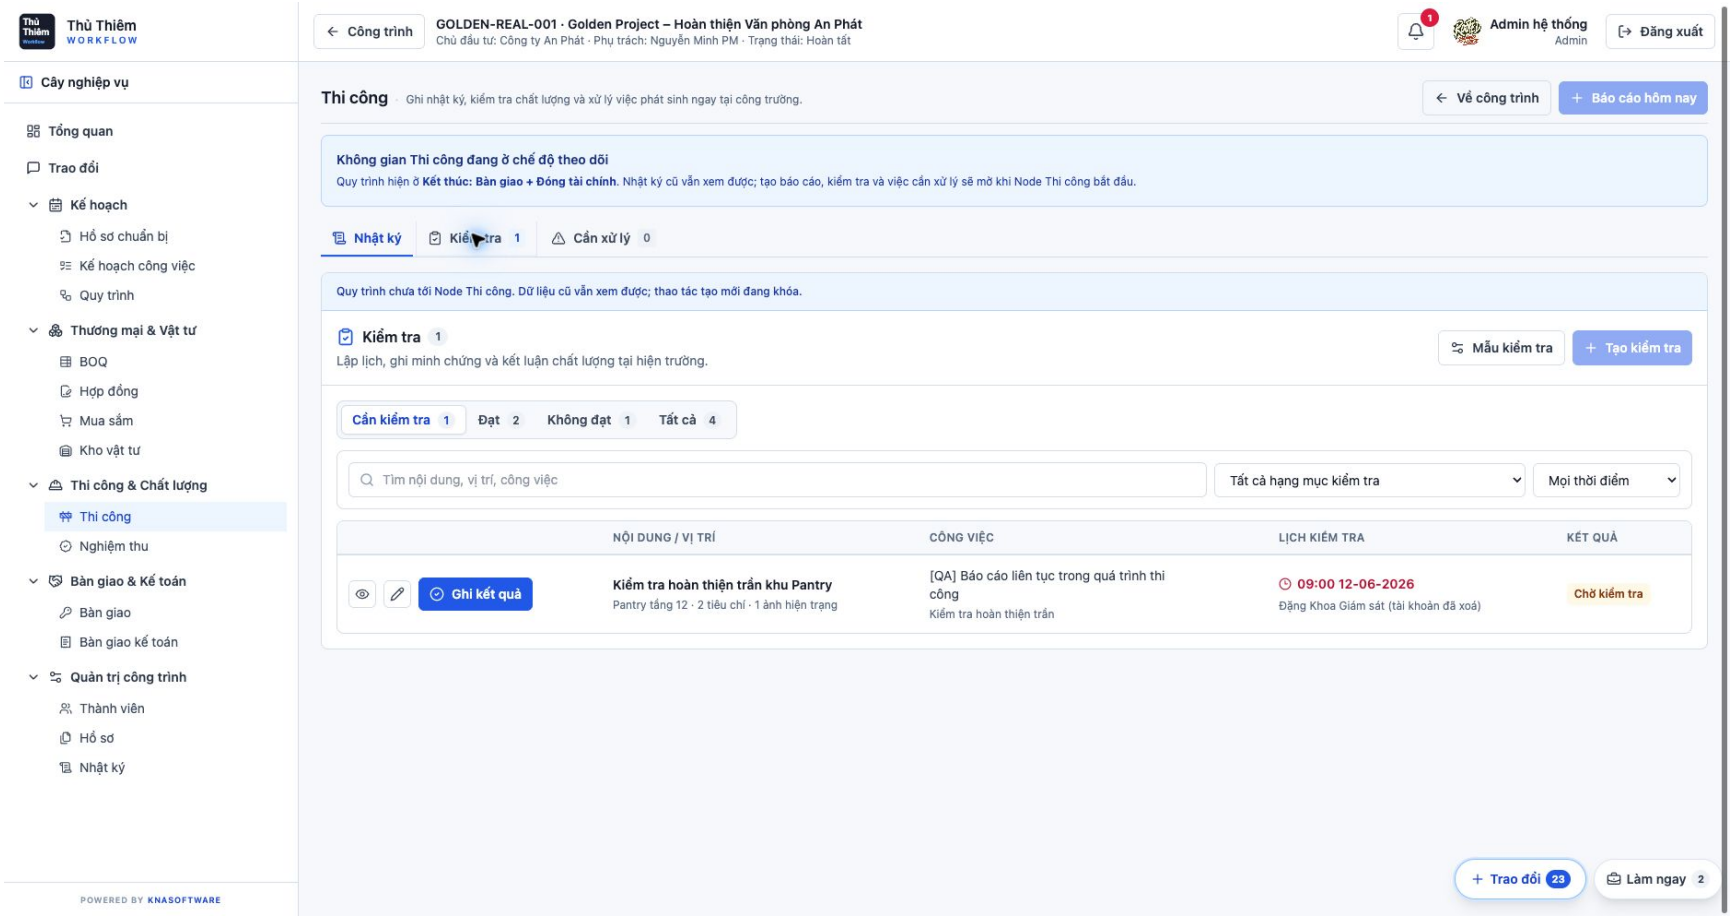

Ảnh 23 · Danh sách kiểm tra, kết quả và người được giao.

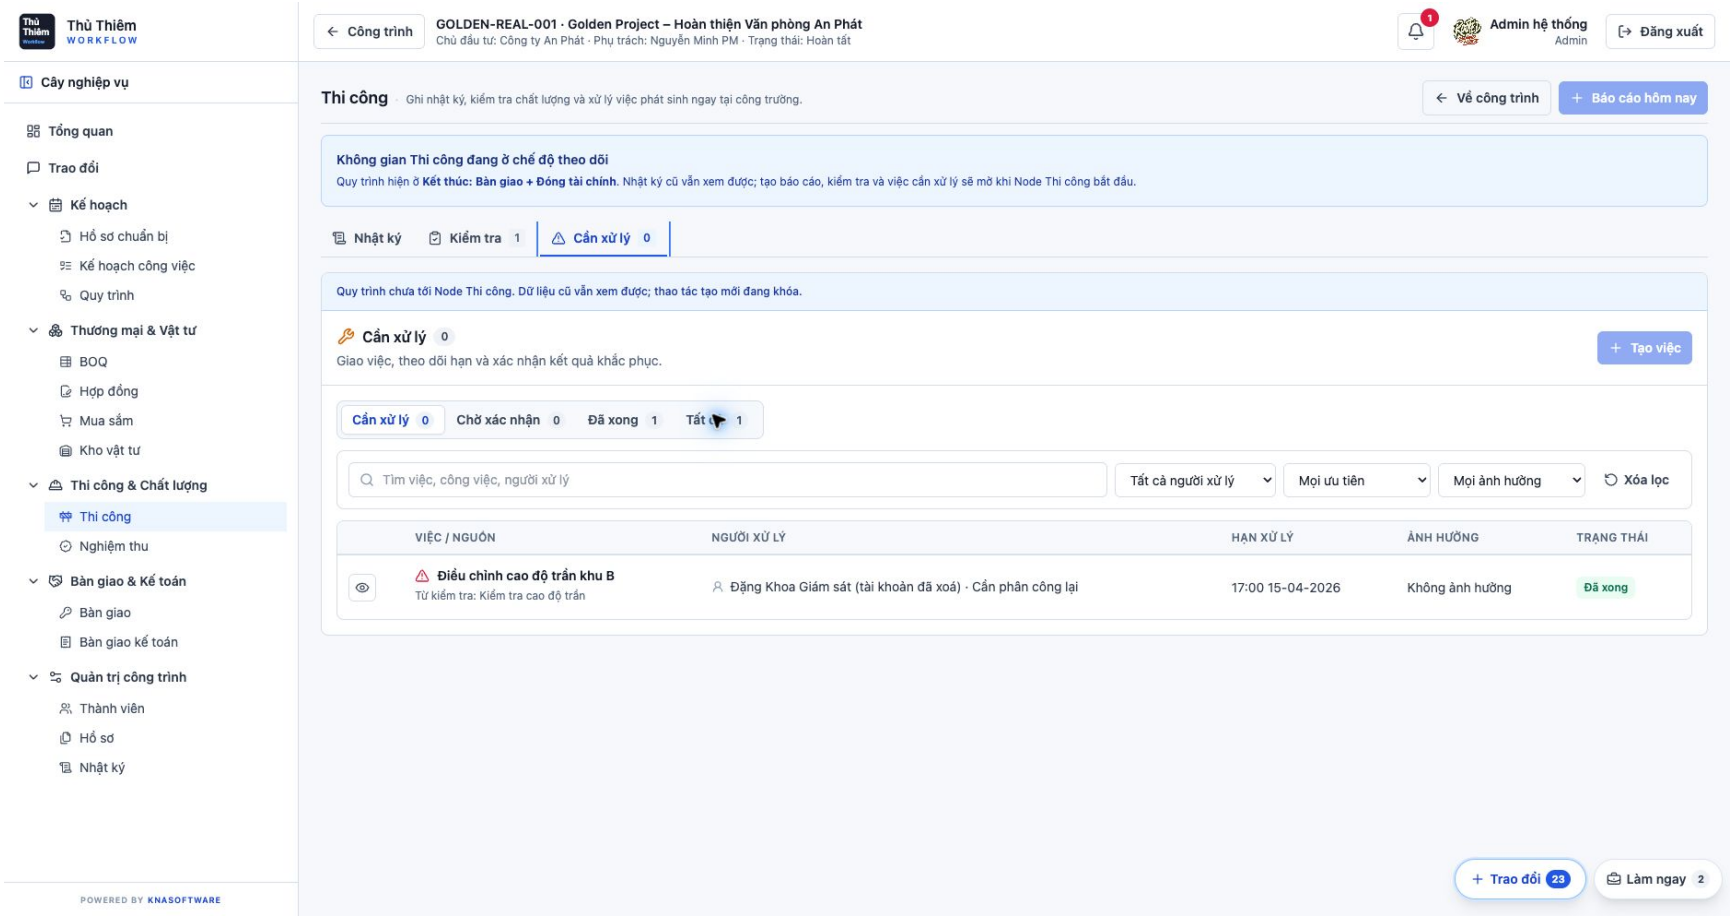


Ảnh 24 · Việc khắc phục liên kết ngược về Kiểm tra không đạt.

8.1. Báo cáo ngày: xuất BM-GS-02 từ hồ sơ đang làm


Mục đích chính: xuất đúng báo cáo ngày hoặc phạm vi ngày đang theo dõi. Giám sát/người lập báo cáo kiểm tra nguồn; PM/người nhận báo cáo đối chiếu file theo quyền của mình.

Điểm mở	Nút và vị trí	Phạm vi file
Công trình > Thi công > Nhật ký	**Xuất báo cáo**, cùng hàng Từ ngày/Đến ngày	Các báo cáo thuộc phạm vi bộ lọc đã áp dụng, không chỉ các dòng đang nhìn thấy trên một trang.
Thi công > mở một báo cáo ngày	**Xuất báo cáo ngày**, trước Công việc trong ngày	Đúng báo cáo ngày đang mở.
Quy trình > Đầu việc > phiếu báo cáo thi công	**Xuất báo cáo ngày**, ở đầu phiếu	Nội dung phiếu đã lưu; lưu thay đổi trước khi xuất.
Báo cáo > danh sách	**Xuất báo cáo**, góc phải phía trên	Phạm vi danh sách theo bộ lọc đang áp dụng và quyền xem. Nút **Xuất sổ đăng ký** là file danh sách quản lý riêng.
Báo cáo > mở chi tiết lần gửi	**Xuất báo cáo**, thanh hành động dưới cùng	Đúng lần gửi đang chọn; xem tiếp mục 8.2.


1. Nếu xuất nhiều ngày, chọn **Từ ngày/Đến ngày > Áp dụng** tại Nhật ký rồi chọn **Xuất báo cáo**. Một báo cáo tương ứng một sheet trong workbook; hai báo cáo cùng ngày vẫn là hai hồ sơ.
2. Nếu xuất một phiếu/ngày, mở đúng chi tiết rồi chọn **Xuất báo cáo ngày**. Kiểm tra công việc, khối lượng/đơn vị, nhân lực, vật tư, thời tiết và ảnh đã lưu. Không nhập lại các thông tin này ở bước xuất.
3. Đối chiếu 12 tiêu chí của mẫu, thông tin hiện trường và bảng nhân lực/vật tư. Ví dụ đã nghiệm thu: vật tư nhận trường **12 m2**, khối lượng công việc **9 m2** và nhân lực **6 người** là ba dữ kiện khác nhau. Không dùng lượng đã thi công hoặc vật tư sử dụng thay cho lượng nhận trường.
4. Kiểm tra tên công trình, ngày và thời tiết trên file. Nhãn thời tiết hiển thị tiếng Việt, ví dụ **Mưa**, **Nắng nóng**. Chưa ghi tiến độ thì màn hình ghi **Chưa ghi tiến độ** và file không tự ghi 0%; số 0 thực sự được nhập vẫn giữ là 0%.

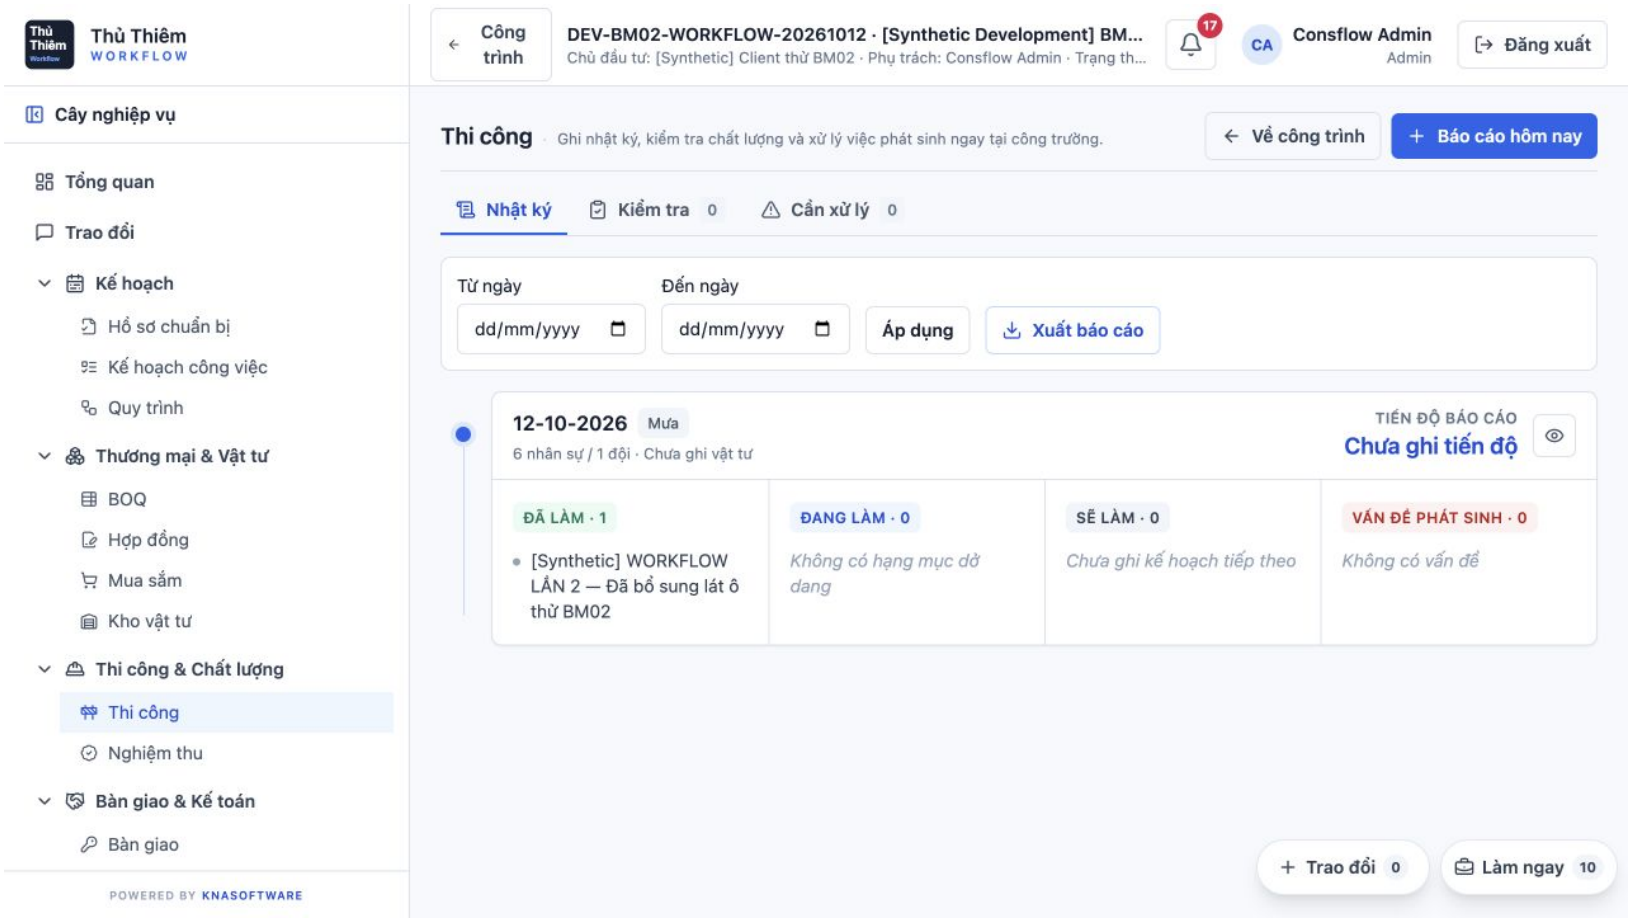


BM02-A · Nhật ký Development 12/10/2026: áp dụng bộ lọc ngày trước khi chọn Xuất báo cáo. Thẻ ngày chưa ghi tiến độ không hiển thị 0% mặc định.

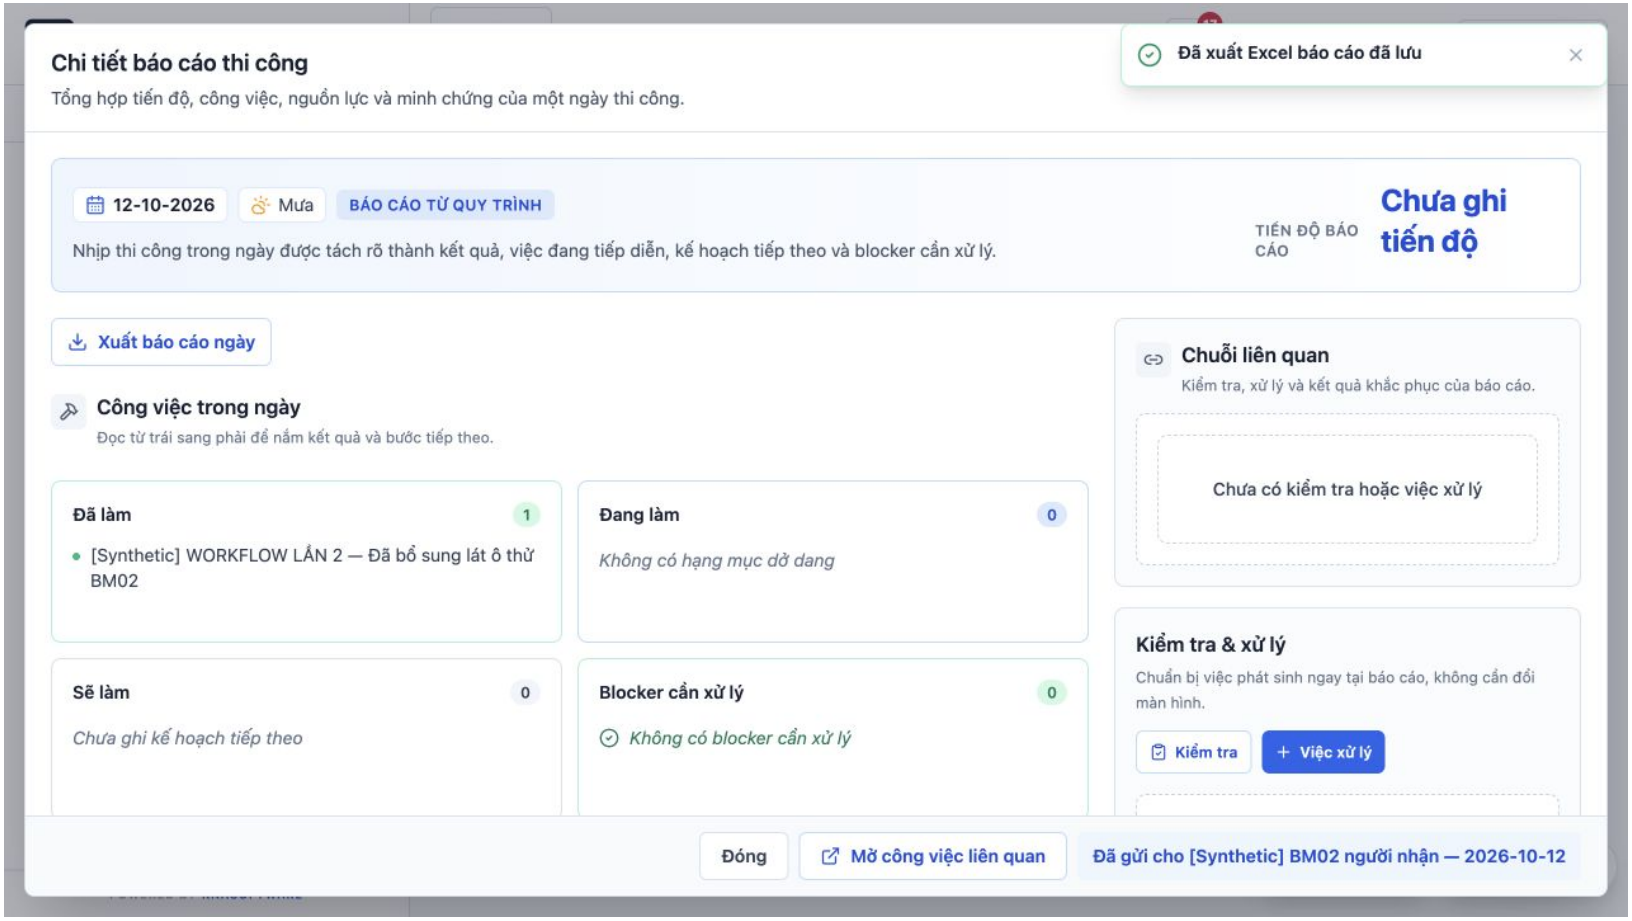


BM02-B · Xuất báo cáo ngày nằm trước Công việc trong ngày. Đây là nội dung ngày đang xem, khác việc chọn một lần gửi cũ trong Báo cáo.

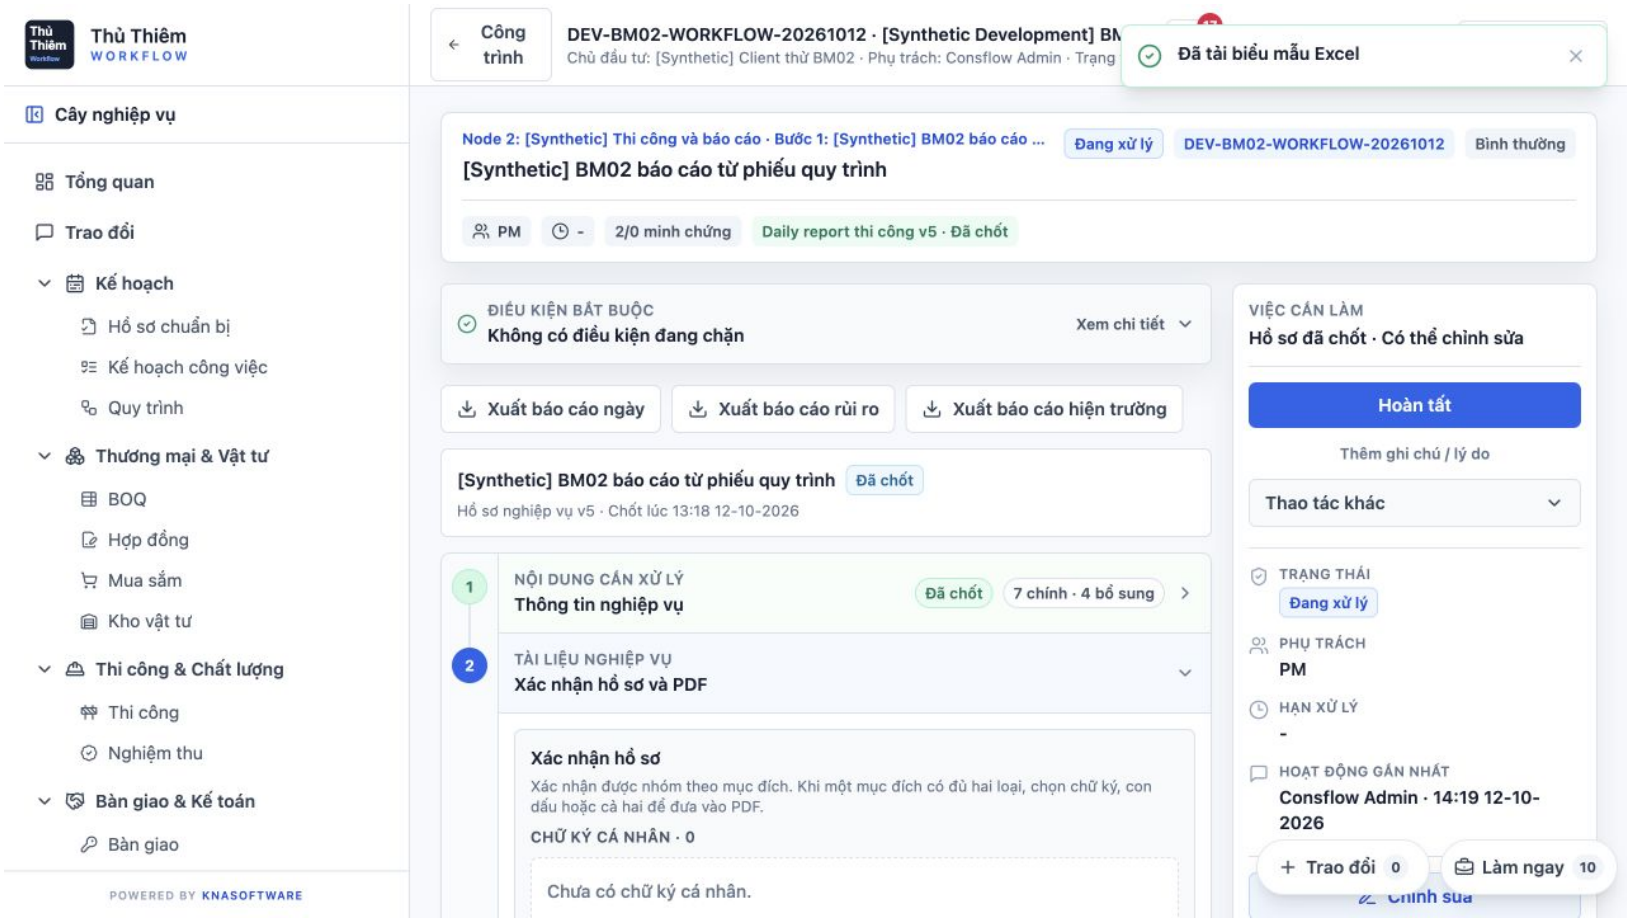

BM02-C · Đầu phiếu đã chốt có Xuất báo cáo ngày (BM02), Xuất báo cáo rủi ro (BM05) và Xuất báo cáo hiện trường (BM06). Người dùng chọn theo nhu cầu, không xuất cả tám mẫu cùng lúc.

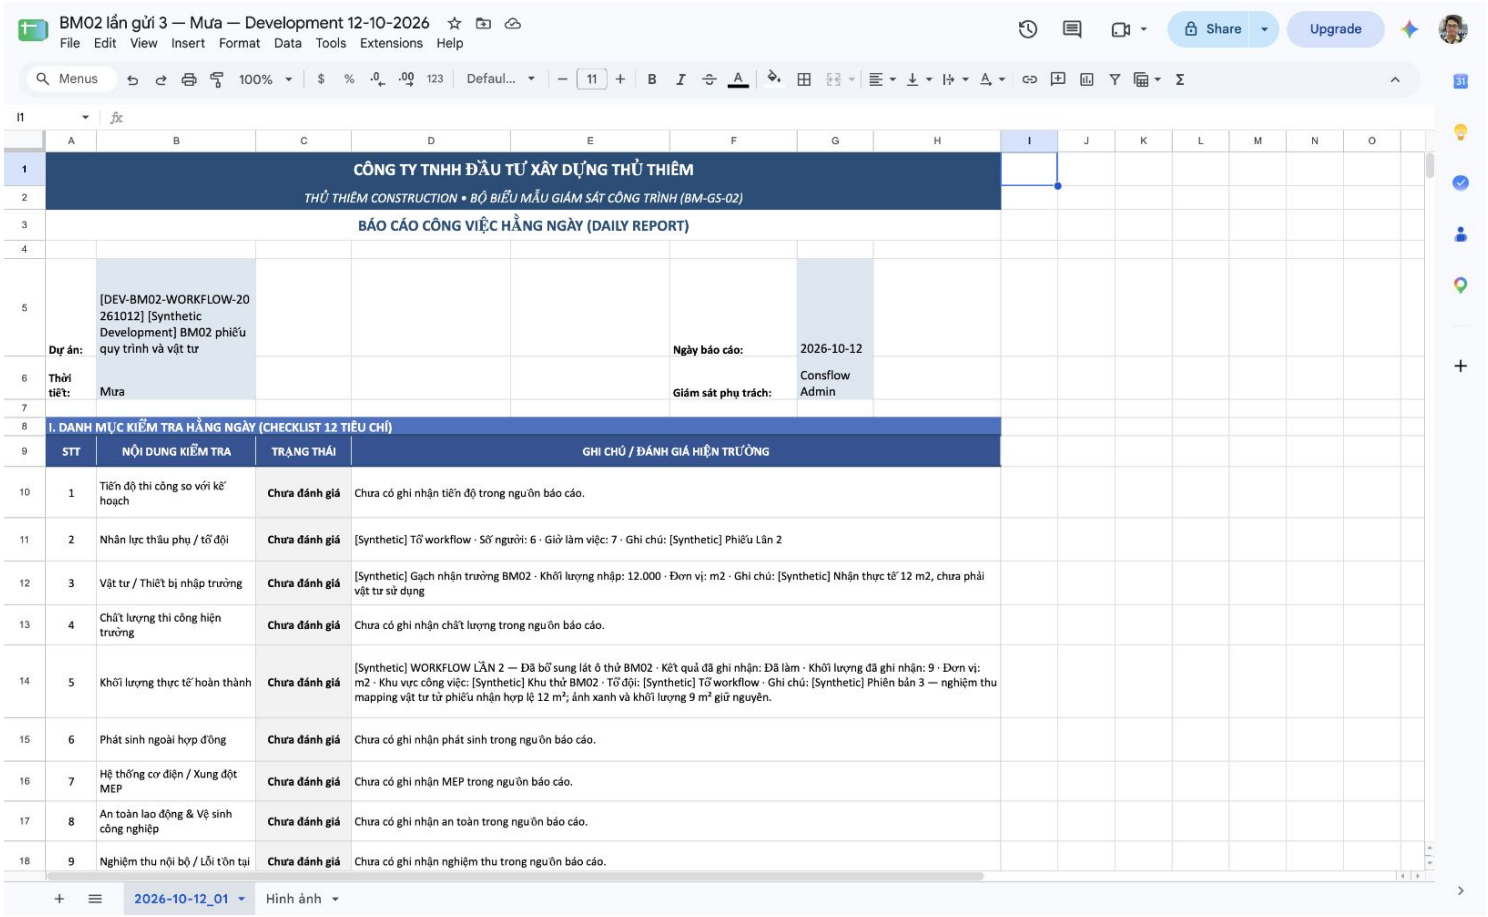

BM02-D · File lần gửi 3 đã nghiệm thu hiển thị Mưa và checklist theo nội dung đã lưu. Chưa đánh giá là chưa có kết luận đánh giá, không phải tự động Không đạt.

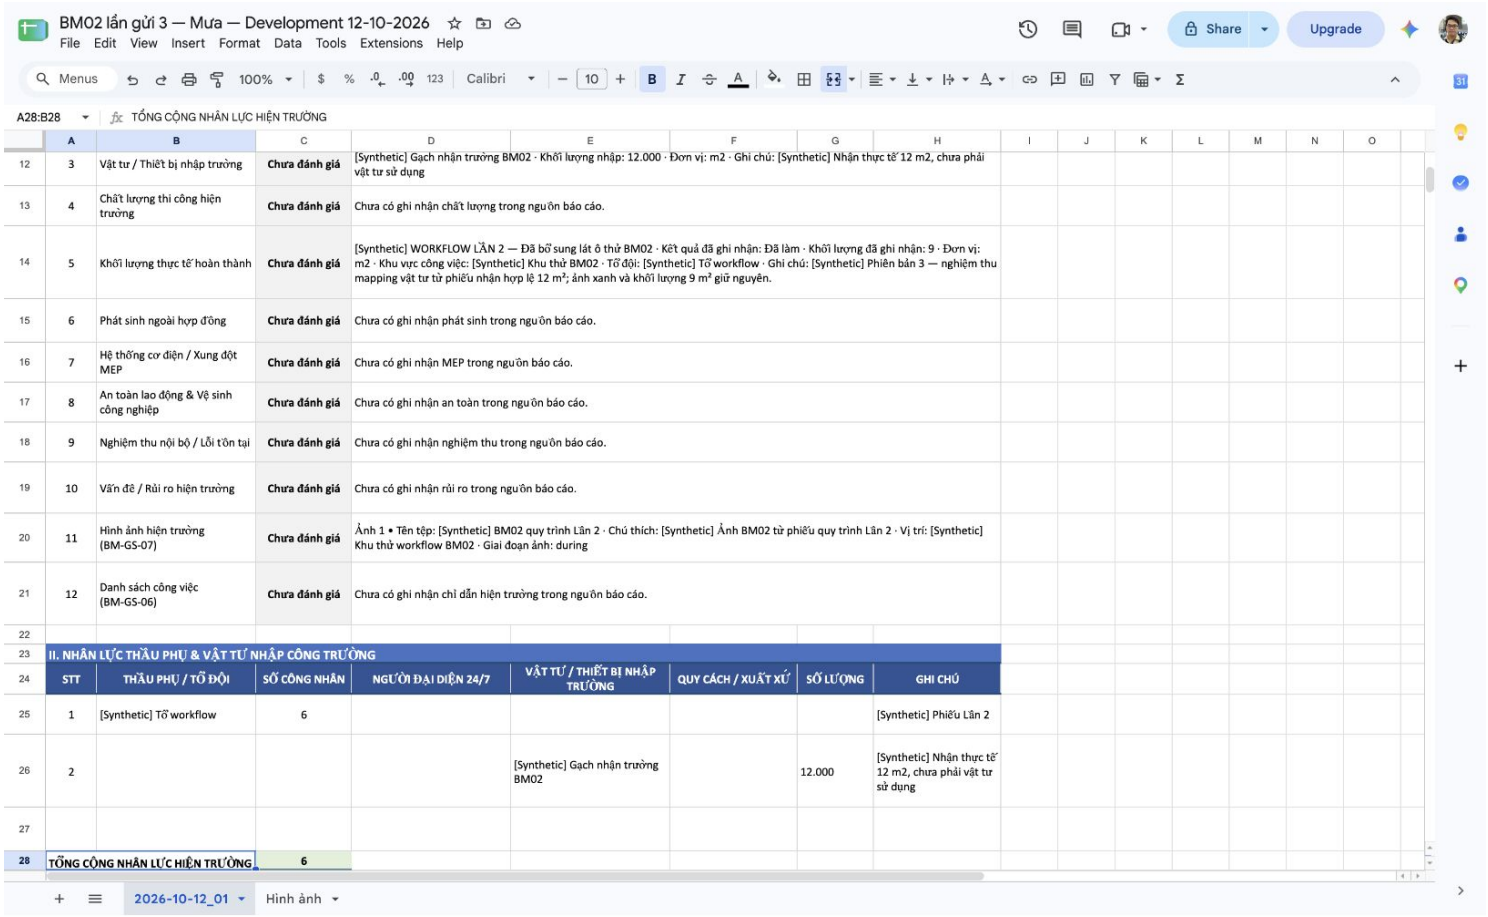


BM02-E · Cùng file lần gửi 3: nhận trường 12 m2, khối lượng công việc 9 m2 và 6 nhân sự được giữ đúng nguồn. Có ghi nhận vật tư/công việc không tự đổi trạng thái checklist sang Đạt.

Checklist và đánh giá hiện trường: bộ xuất tận dụng dữ liệu đã có để ghi chú vào tiêu chí tương ứng. Đánh giá người dùng đã ghi là căn cứ kết luận; chỉ có nội dung công việc, ảnh hay trạng thái hoàn tất Đầu việc không đủ để tự kết luận Đạt. Nếu cần cập nhật kết luận, người có trách nhiệm ghi tại nguồn theo quy trình đang áp dụng.


8.2. Báo cáo đã gửi: xuất đúng lần gửi cũ của BM-GS-02

Mục đích chính: đối chiếu nội dung đã gửi cho người nhận tại một thời điểm, kể cả khi nguồn hiện tại đã thay đổi. Người lập/người nhận có quyền xem và xuất báo cáo thao tác tại **Báo cáo**.

1. Mở báo cáo đã gửi, chọn đúng **Lần gửi** và kiểm tra ngày gửi, người nhận, số lần gửi đang xem.
2. Cuộn kiểm tra nội dung và ảnh của lần đó. Chọn **Xuất báo cáo** tại thanh hành động dưới cùng. Không chọn **Về bản hiện tại** hoặc xuất lại từ Nhật ký nếu cần bản cũ.
3. Mở file; đối chiếu thời tiết, công việc, nhân lực, vật tư và ảnh với chính lần gửi đang xem. Nguồn hiện tại có nội dung mới không được dùng để lấp phần thiếu của lần gửi cũ.

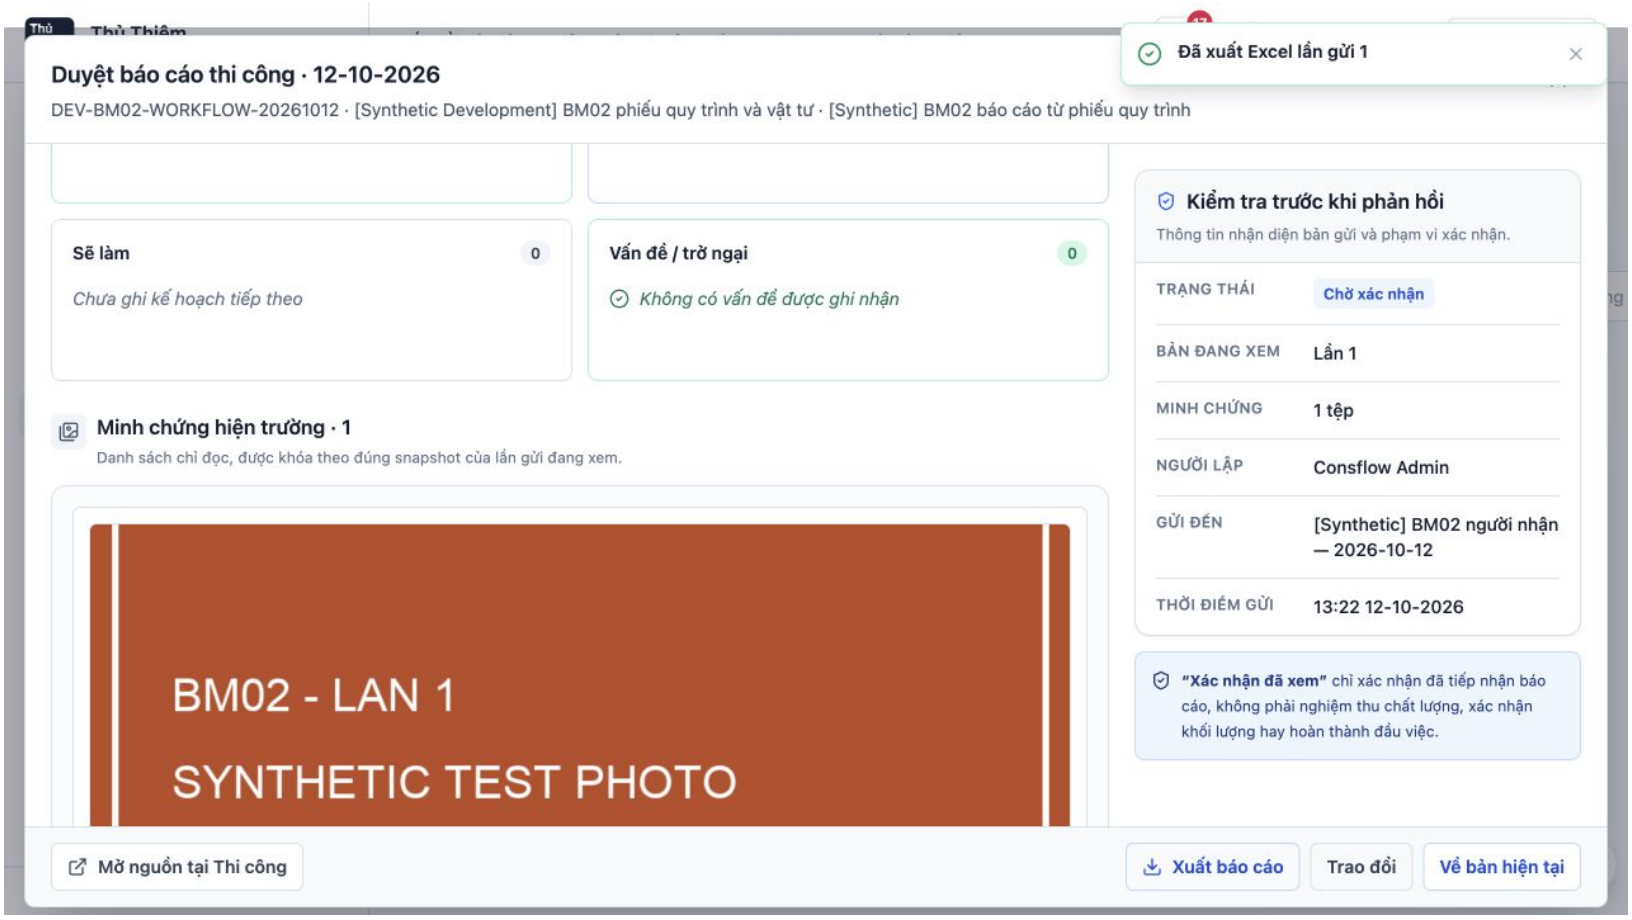

BM02-F · Chi tiết đang xem Lần 1, có ảnh BM02 - LẦN 1 và nút Xuất báo cáo ở cuối. Trạng thái đã đọc là xác nhận tiếp nhận báo cáo, không phải nghiệm thu chất lượng.

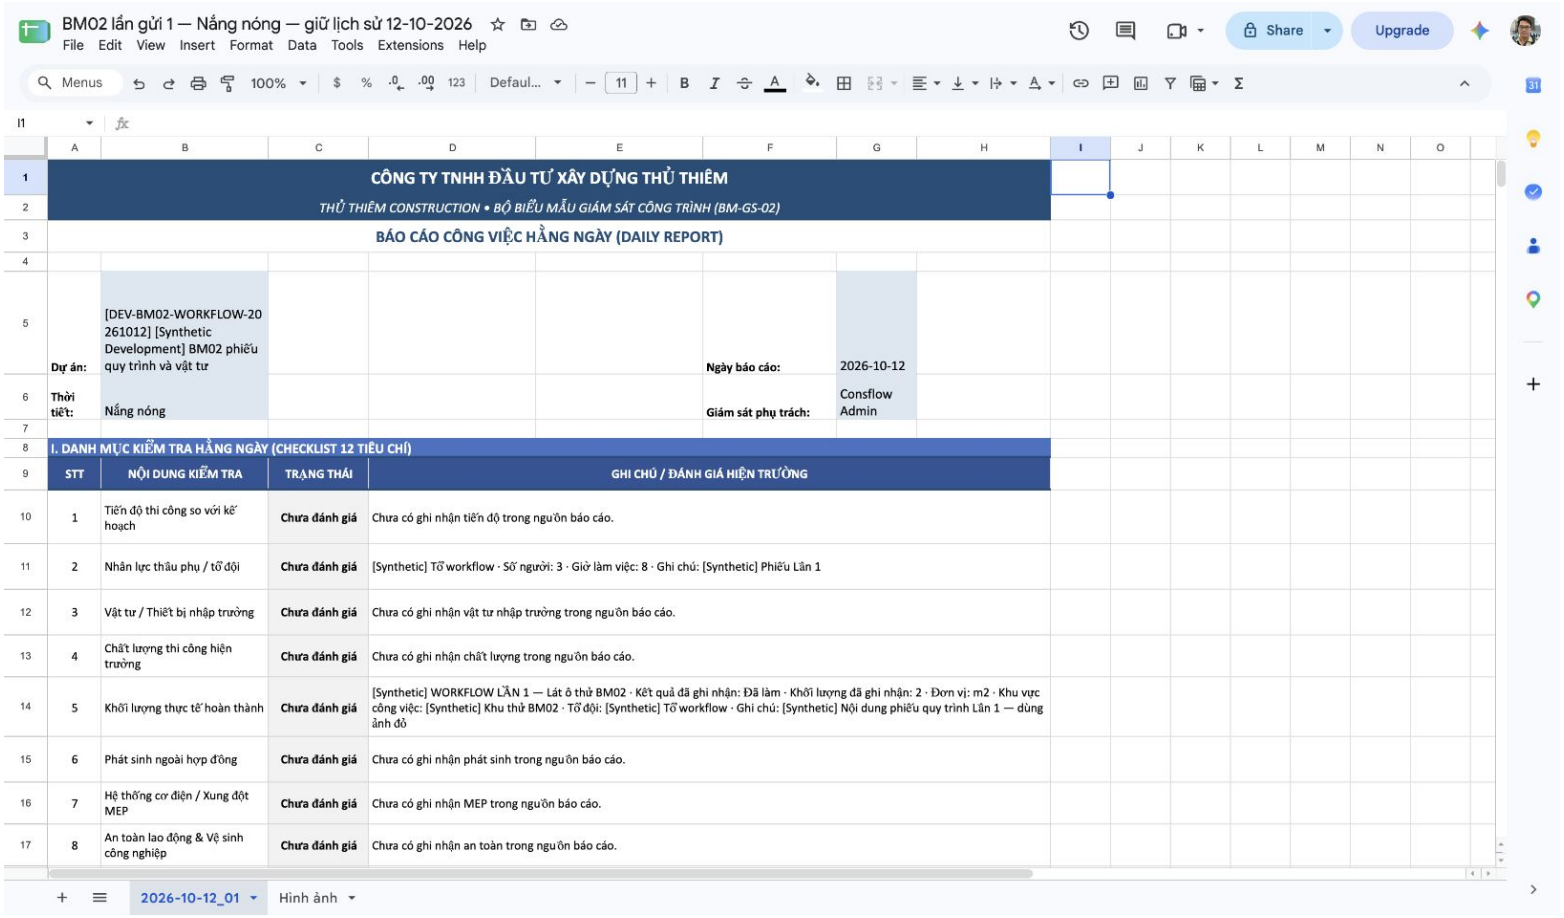

BM02 lần gửi 1 — Nắng nóng — giữ lịch sử 12-10-2026


File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share Upgrade

1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM							
2	*THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-02)*							
3	BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY (DAILY REPORT)							
4								
5	**Dự án:**	[DEV-BM02-WORKFLOW-20261012] [Synthetic Development] BM02 phiếu quy trình và vật tư			**Ngày báo cáo:**	2026-10-12		
6	**Thời tiết:**	Nắng nóng			**Giám sát phụ trách:**	Consflow Admin		
7								
8	**I. DANH MỤC KIỂM TRA HẰNG NGÀY (CHECKLIST 12 TIÊU CHÍ)**							
9	**STT**	**NỘI DUNG KIỂM TRA**	**TRẠNG THÁI**	**GHI CHÚ / ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG**				
10	1	Tiến độ thi công so với kế hoạch	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận tiến độ trong nguồn báo cáo.				
11	2	Nhân lực thầu phụ / tổ đội	**Chưa đánh giá**	[Synthetic] Tổ workflow · Số người: 3 · Giờ làm việc: 8 · Ghi chú: [Synthetic] Phiếu Lần 1				
12	3	Vật tư / Thiết bị nhập trường	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận vật tư nhập trường trong nguồn báo cáo.				
13	4	Chất lượng thi công hiện trường	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận chất lượng trong nguồn báo cáo.				
14	5	Khối lượng thực tế hoàn thành	**Chưa đánh giá**	[Synthetic] WORKFLOW LẦN 1 — Lát ô thử BM02 · Kết quả đã ghi nhận: Đã làm · Khối lượng đã ghi nhận: 2 · Đơn vị: m2 · Khu vực công việc: [Synthetic] Khu thử BM02 · Tổ đội: [Synthetic] Tổ workflow · Ghi chú: [Synthetic] Nội dung phiếu quy trình Lần 1 — dùng ảnh đỏ				
15	6	Phát sinh ngoài hợp đồng	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận phát sinh trong nguồn báo cáo.				
16	7	Hệ thống cơ điện / Xung đột MEP	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận MEP trong nguồn báo cáo.				
17	8	An toàn lao động & Vệ sinh công nghiệp	**Chưa đánh giá**	Chưa có ghi nhận an toàn trong nguồn báo cáo.				

2026-10-12_01 Hình ảnh

BM02-G · File lần gửi 1 giữ Nắng nóng và công việc lần 1; không đổi thành Mưa hoặc nội dung lần 3. Ảnh tham chiếu Development 12/10/2026.

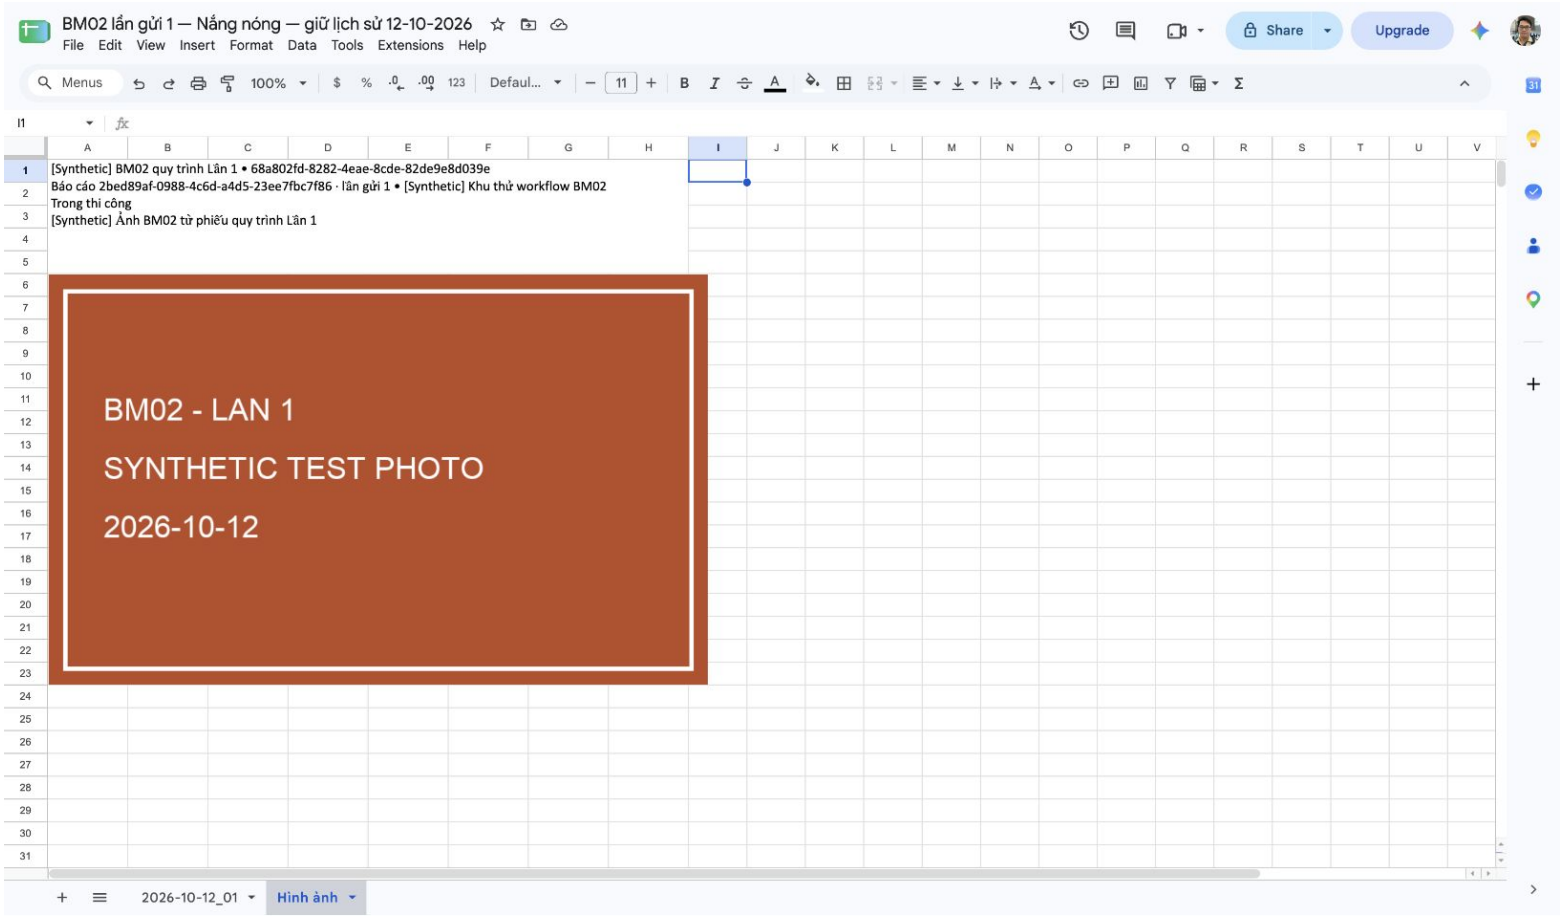


BM02-H · Sheet Hình ảnh giữ đúng ảnh của lần 1. Mẫu chính BM02 không có ô ảnh; sheet phụ này là phần đi kèm báo cáo, khác BM07 đặt ảnh trong ô bảng chính.

Khi cần sửa báo cáo: sửa nguồn và gửi lại bằng luồng hiện có để tạo lần gửi mới. Không sửa file hoặc nội dung lịch sử rồi gọi đó là bản đã gửi ban đầu. Lịch sử lần gửi chỉ xuất BM02; các nút BM05/BM06 ở chi tiết ngày hiện tại không thay thế báo cáo lịch sử.


8.3. Cần xử lý: xuất BM-GS-04 từ danh sách và chi tiết

Mục đích chính: xuất danh mục tồn tại đúng phạm vi cần theo dõi. Giám sát/PM/QA/QC hoặc người được giao có quyền xem hồ sơ thao tác; đội thi công/thầu phụ tiếp tục khắc phục và gửi minh chứng theo luồng hiện có.


1. Vào **Thi công > Cần xử lý**. Chọn nhóm **Cần xử lý**, **Chờ xác nhận**, **Đã xong** hoặc **Tất cả**; kiểm tra tìm kiếm, người xử lý, ưu tiên và ảnh hưởng đang lọc.
2. Xuất danh sách bằng **Xuất báo cáo** bên phải bộ lọc, phía trên danh sách. Nếu chỉ cần một việc, mở chi tiết rồi chọn **Xuất báo cáo** trước **Mô tả hiện trạng**.
3. Mở file, đối chiếu vị trí, mô tả, thời hạn, tình trạng từng dòng và dòng tổng số lỗi. Trong mẫu thử có một lỗi chưa ghi mã, tổng vẫn phải là **1**; ô mã lỗi trống không làm mất dòng.
4. Nếu việc phát sinh từ Kiểm tra, đối chiếu vị trí với kiểm tra nguồn; vị trí đã ghi riêng trên việc cần xử lý được giữ theo hồ sơ đó. Phân biệt mức độ lỗi với ưu tiên xử lý.

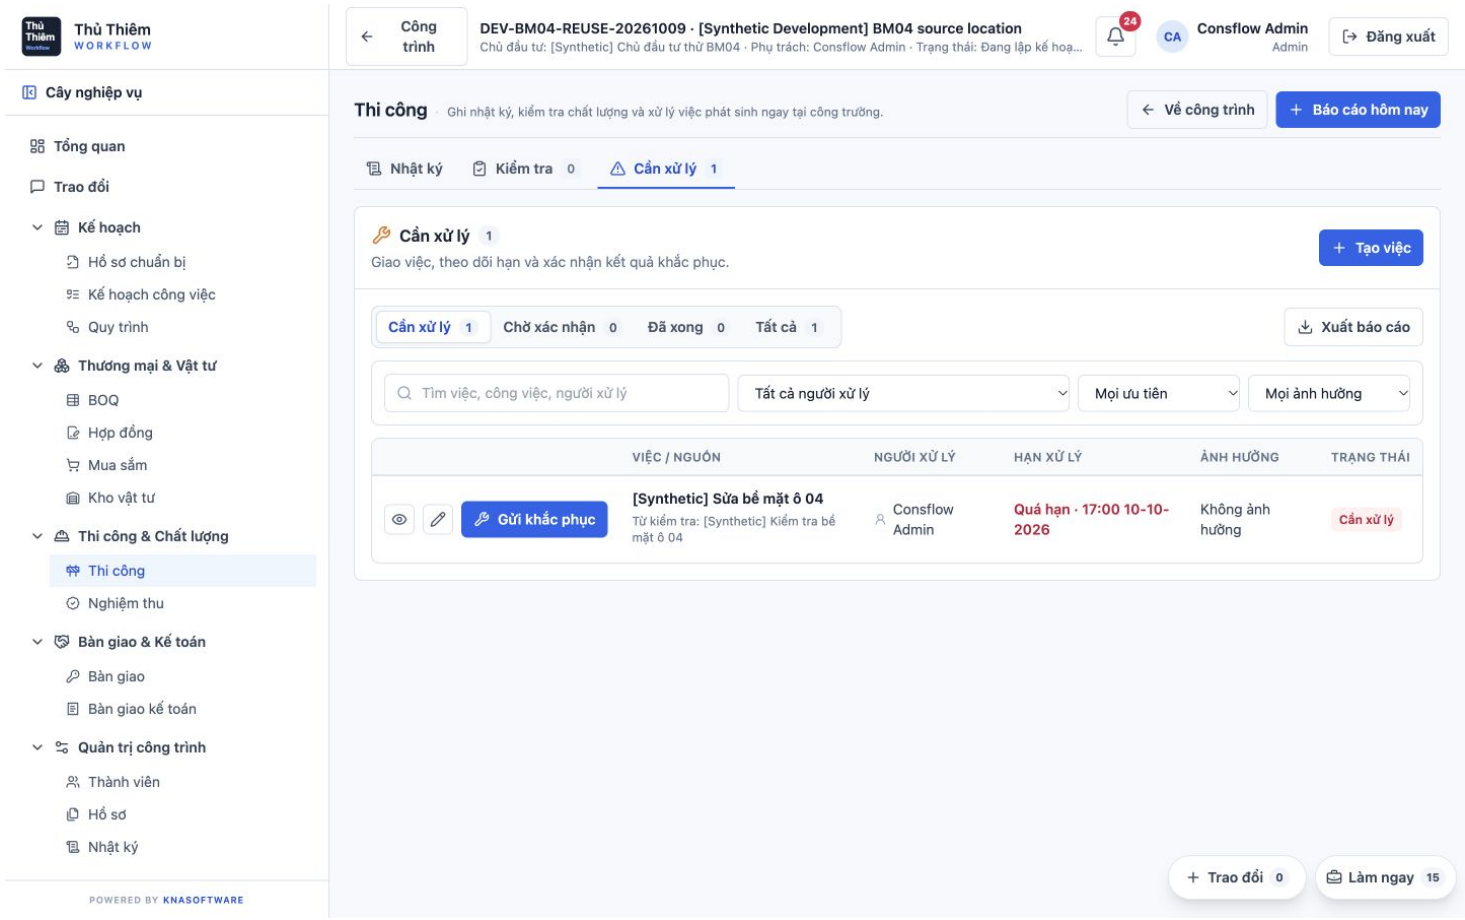

BM04-A · Danh sách Cần xử lý trên Development 13/10/2026 sau sửa cột thao tác desktop. Xuất báo cáo ở trên danh sách; Gửi khắc phục là thao tác xử lý riêng.

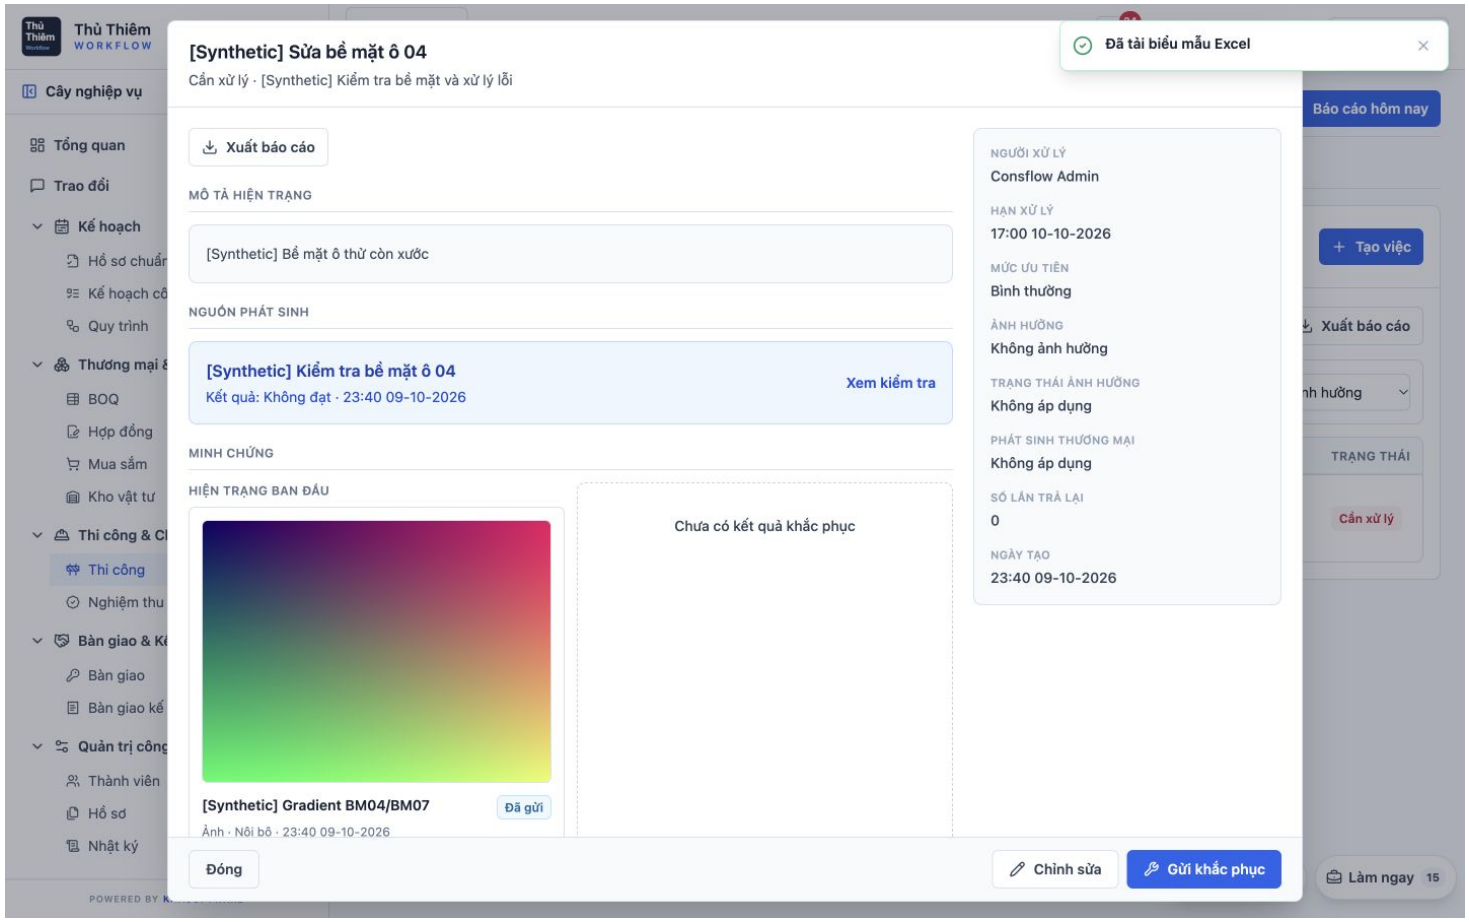

BM04-B · Nút Xuất báo cáo trước Mô tả hiện trạng. Xuất từ chi tiết lấy đúng việc đang mở; không xuất toàn danh sách.

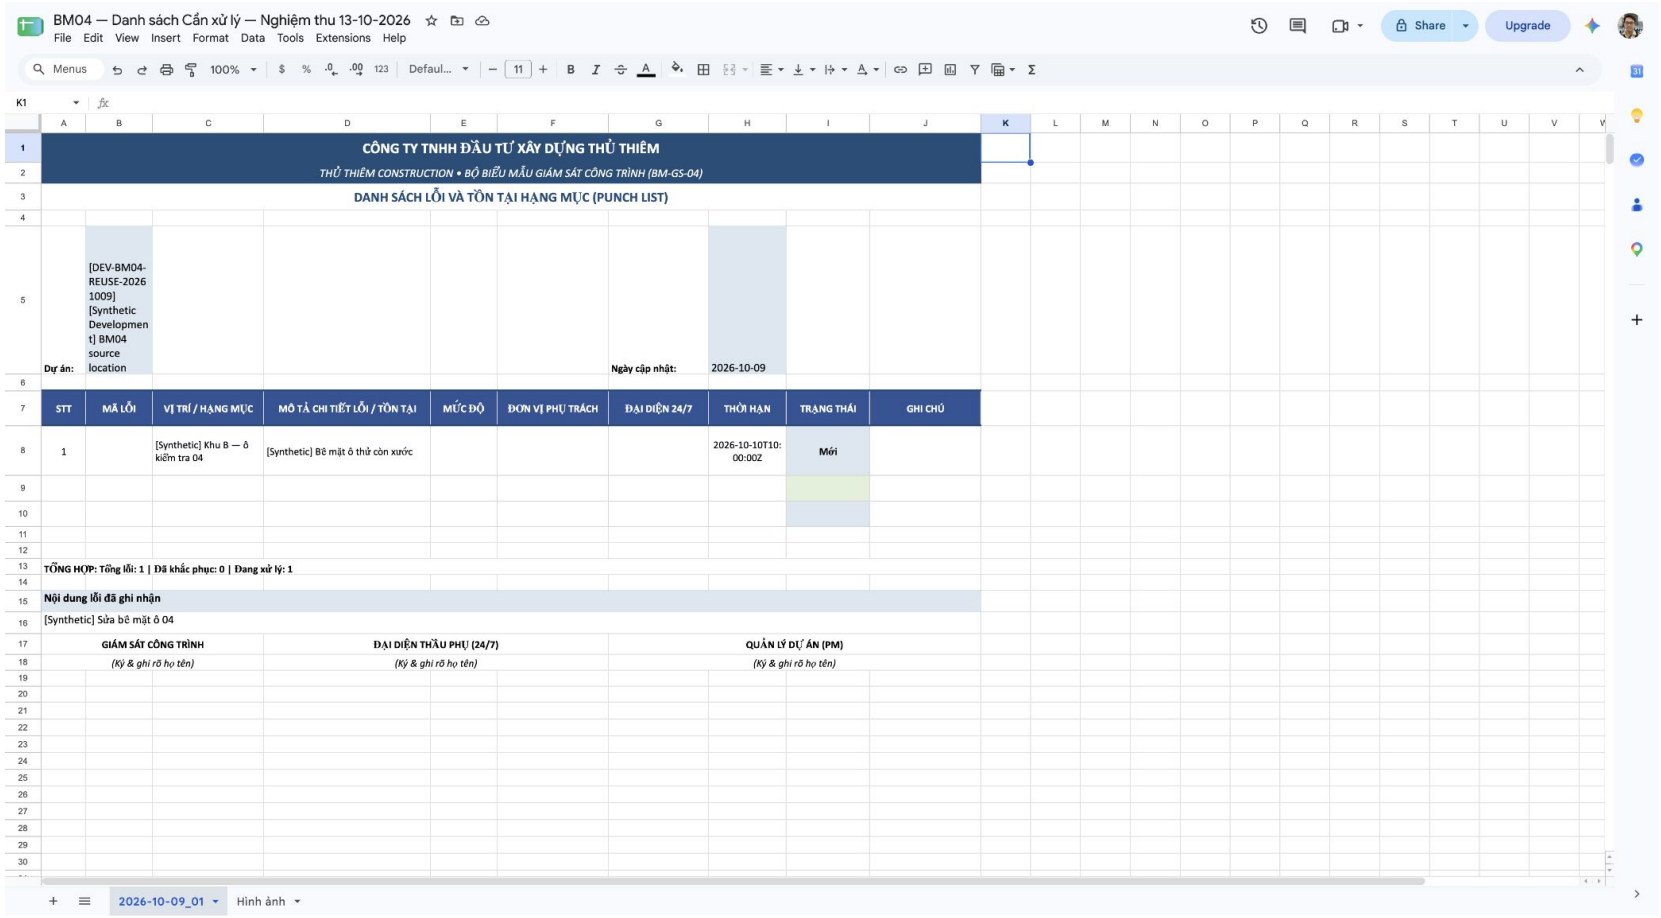


BM04-C · File danh sách đã mở trên Google Sheets: một lỗi, đúng vị trí và tổng số lỗi bằng 1. Nhãn Mới trong mẫu xuất tương ứng việc còn cần xử lý; chưa xác nhận xong thì không tính đã khắc phục.

Trên màn hình nhỏ: giữ nguyên cách chọn hồ sơ và nút. Nếu bảng rộng, cuộn trong bảng để xem đủ cột; các tiện ích nổi không thay cho nút Gửi khắc phục hoặc Xuất báo cáo. Xuất file không thay trạng thái xử lý; cần gửi khắc phục/xác nhận tại hồ sơ.


8.4. Kế hoạch/chỉ dẫn hiện trường: xuất BM-GS-06

Mục đích chính: chuyển các công việc/chỉ dẫn đã ghi trong báo cáo ngày thành danh sách phân công của client. Giám sát/người lập báo cáo kiểm tra kế hoạch; PM/người nhận đối chiếu phạm vi và trách nhiệm.


1. Mở **Đầu việc > phiếu báo cáo thi công**; lưu thay đổi rồi chọn **Xuất báo cáo hiện trường** ở đầu phiếu. Hoặc mở chi tiết báo cáo ngày hiện tại tại **Thi công > Nhật ký**, chọn cùng nút trong phần **Công việc trong ngày** khi có kế hoạch.
2. Mở file, đối chiếu mã chỉ dẫn, công việc, vị trí, thầu phụ, người nhận/liên hệ, ngày giao, hạn, tiến độ và trạng thái đã ghi. Không tự lấy người được giao Đầu việc nội bộ làm đại diện thầu phụ.
3. Với ví dụ đã nghiệm thu, tiến độ công việc ghi **0%** vẫn giữ 0%; thầu phụ và ngày giao để trống vì nguồn chưa ghi. Không lấy ngày báo cáo thay cho ngày giao, hoặc tiến độ tổng thay cho tiến độ từng công việc.

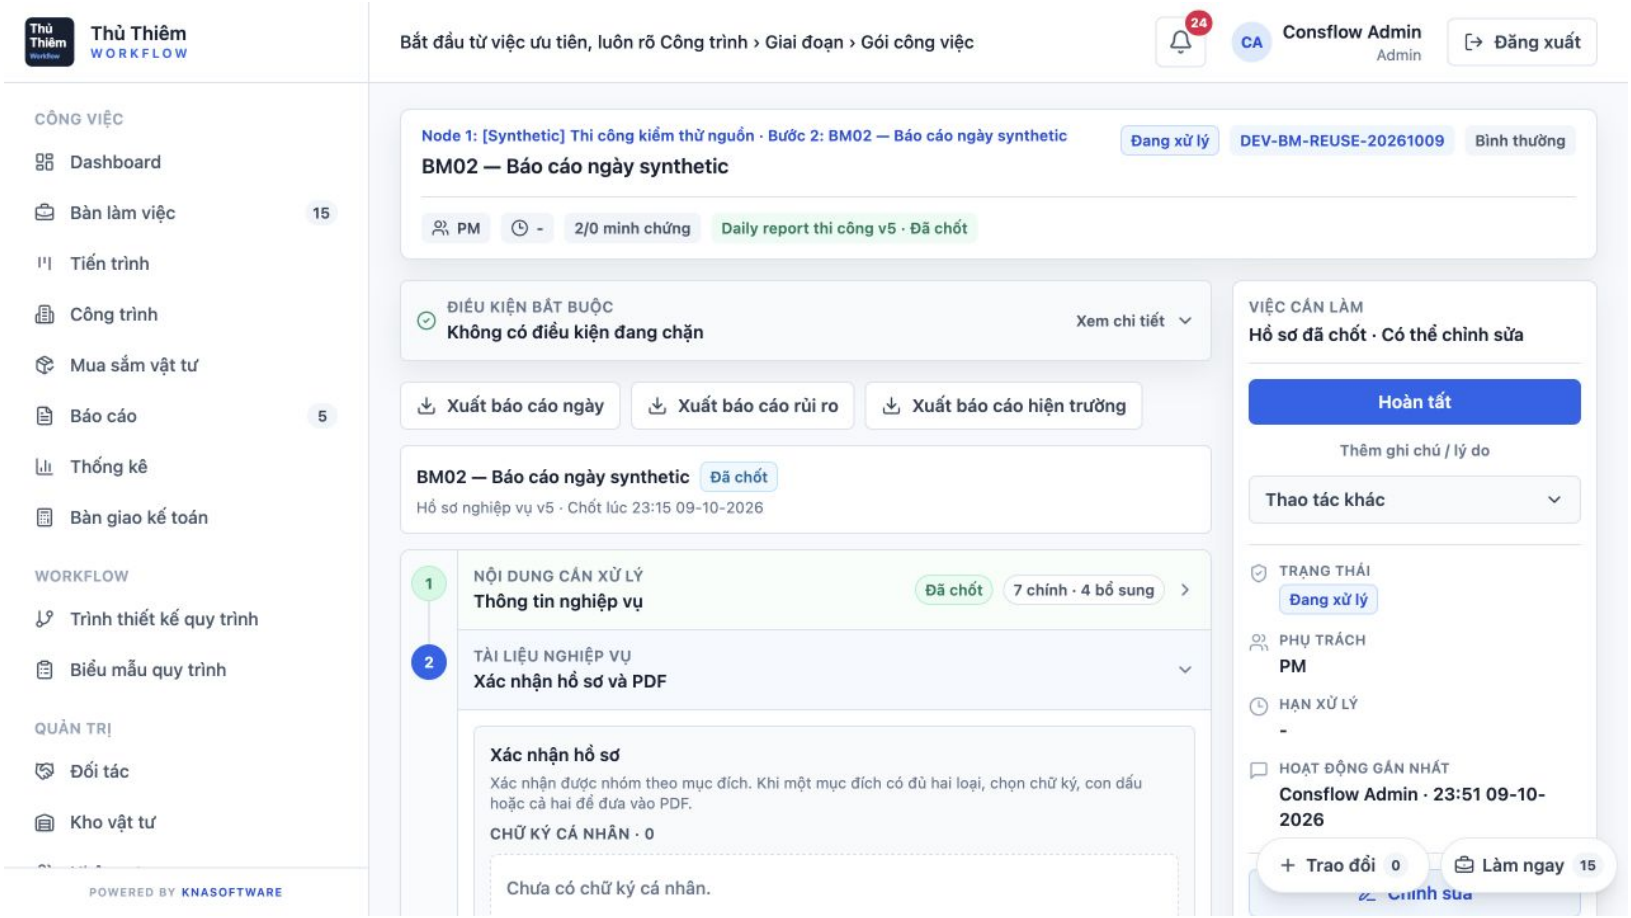

BM06-A · Xuất báo cáo hiện trường tại phiếu thi công đã chốt R2 của công trình thử DEV-BM-REUSE-20261009; không phải ảnh đi xuyên toàn bộ Rev10.

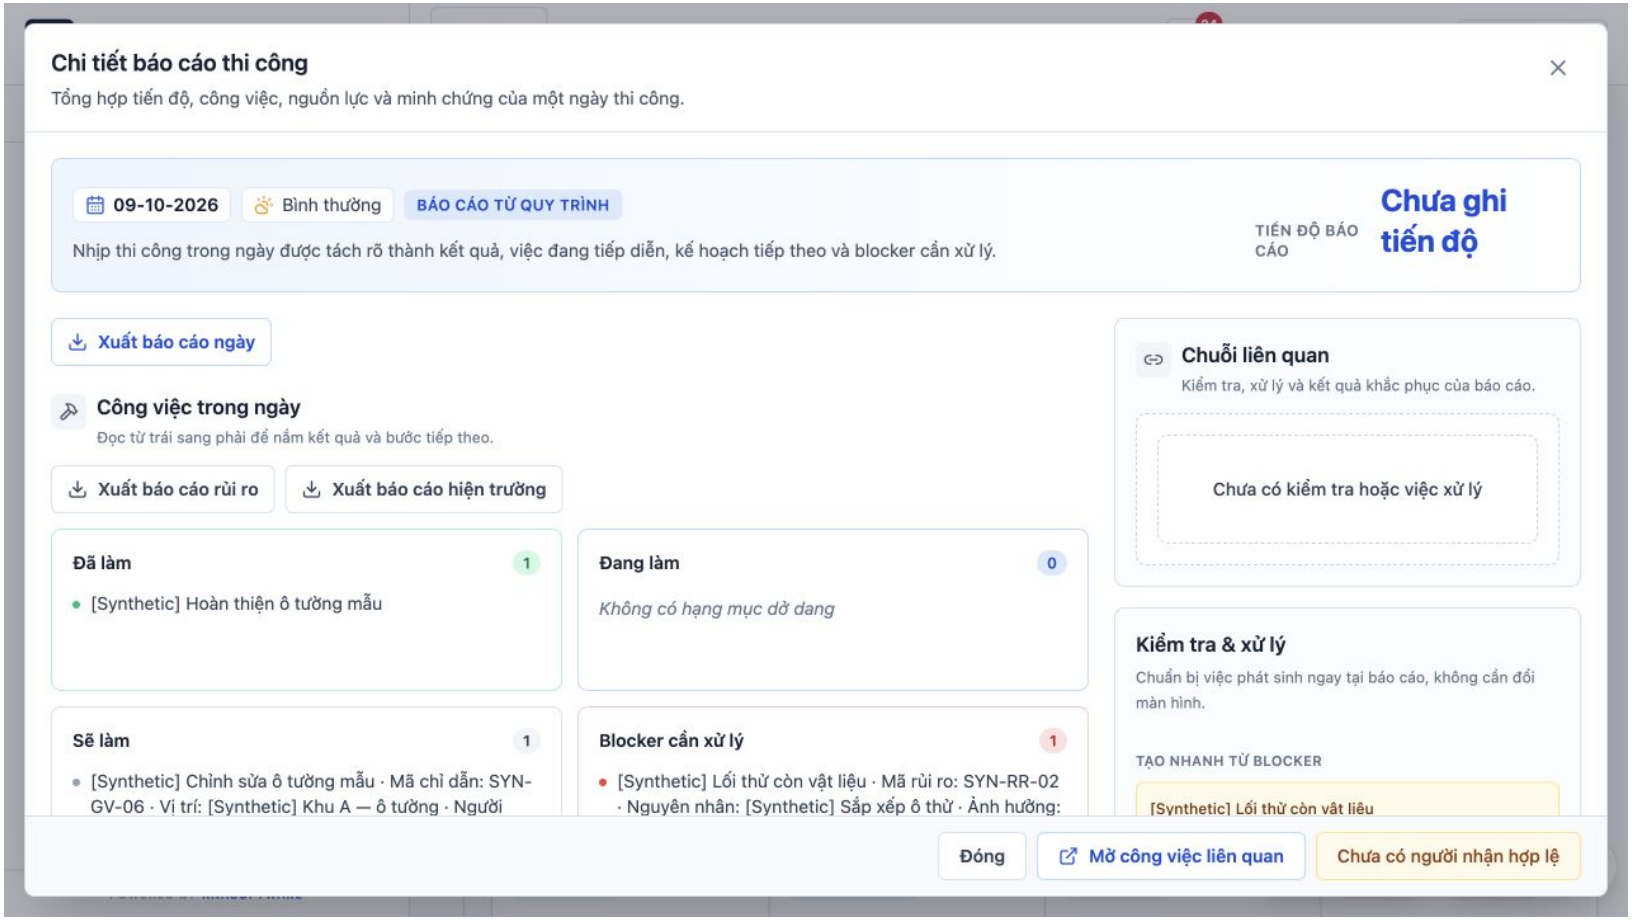

BM06-B · Cùng nút tại chi tiết ngày; báo cáo rủi ro và báo cáo hiện trường là hai nội dung riêng trong ngữ cảnh đang xem.

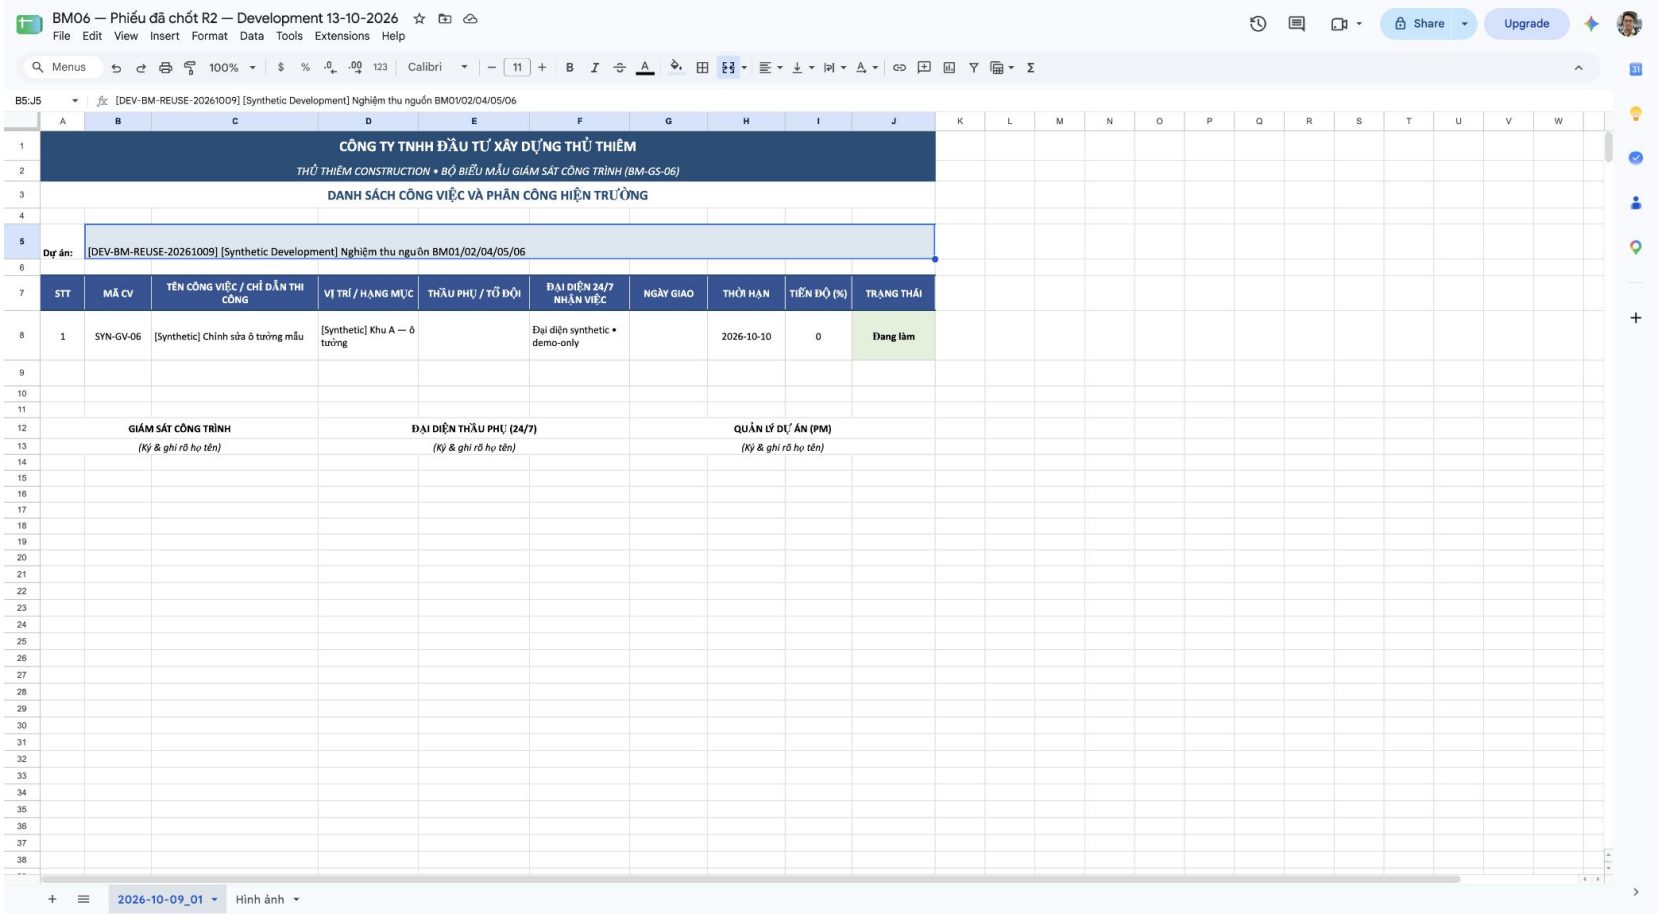


BM06-C · File từ phiếu đã nghiệm thu: tên công trình đủ rộng, tiến độ 0, trạng thái Đang làm; thầu phụ và ngày giao không bị tự điền. Development 13/10/2026.

Ảnh và lịch sử: BM06 có thể kèm sheet Hình ảnh từ nguồn đã liên kết; bảng chính giữ cấu trúc client. Để xem thông tin đã gửi trước đây, dùng lần gửi BM02 tại mục 8.2; không xem xuất kế hoạch hiện tại là ảnh chụp lịch sử của lần gửi đó.

9. Nghiệm thu: từ kết quả hiện trường đến biên bản

Mục đích chính: ghi tiêu chí, minh chứng và kết luận đạt/không đạt cho đúng hạng mục. Nhật ký thi công và Kiểm tra là căn cứ tham chiếu; **biên bản nghiệm thu** là hồ sơ kết luận riêng. Nghiệm thu vật tư đầu vào không tự nhập kho; Thủ kho phải lập phiếu nhập riêng theo lượng được chấp nhận.

Hồ sơ/hành động	Ai tạo hoặc ghi	Ai kiểm tra/kết luận	Kết quả cần chỉ ra
Biên bản nghiệm thu và danh mục kiểm tra	QA/QC hoặc PM có quyền tạo; QA/QC chịu trách nhiệm chính ở Giai đoạn đầu ra	Người có quyền kết luận nghiệm thu (QA/QC/PM/Giám đốc theo phân quyền; nên khác người lập)	Từng tiêu chí, ảnh/hồ sơ nguồn, kết luận và thời điểm
Nghiệm thu vật tư đầu vào	QA/QC lập/kết luận hồ sơ chất lượng; Mua hàng/Thủ kho cung cấp chứng từ giao hàng	Người có quyền quyết định chất lượng	Lượng đạt tách khỏi lượng đã nhập kho; Thủ kho ghi phiếu nhập sau đó
Không đạt hoặc có điều kiện	Người kết luận ghi rõ tồn tại; giao việc sửa	Đội thi công/Thầu phụ sửa; QA/QC kiểm tra lại	Giữ biên bản cũ, việc sửa và lần nghiệm thu lại; không xóa lịch sử không đạt
Nhật ký hồ sơ	Hệ thống ghi từ thao tác lập, gửi, kết luận và sửa	PM/QA/QC tra lại khi đối chiếu	Ai làm, lúc nào, nội dung/trạng thái trước sau

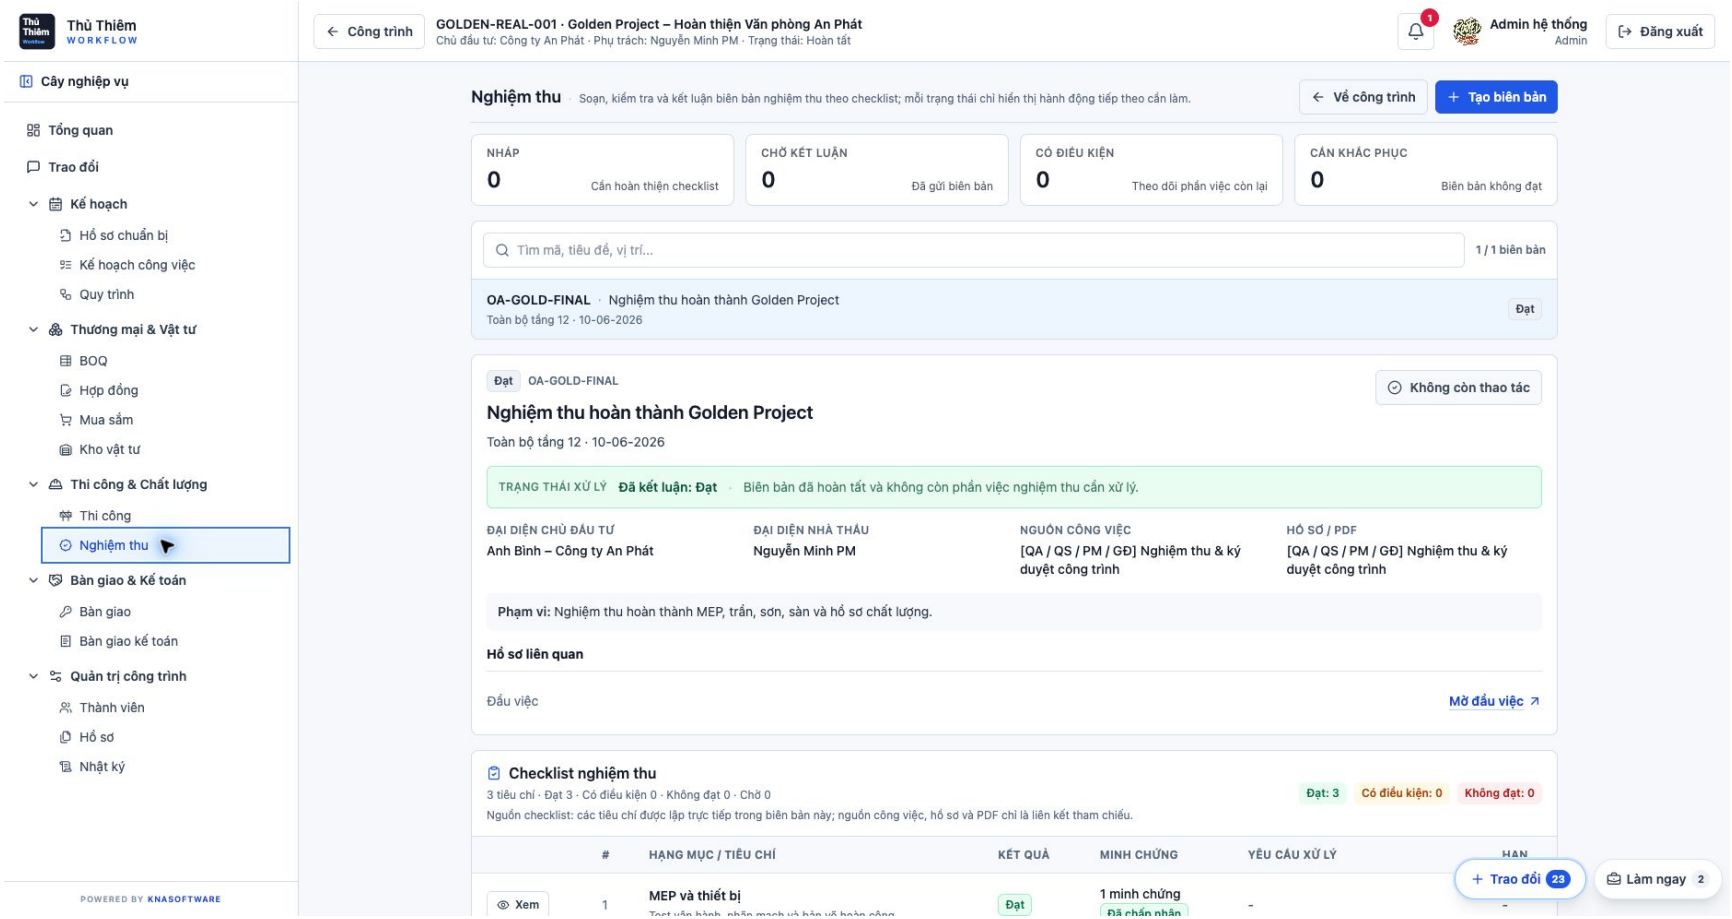


Ảnh 25 · Biên bản mẫu đã đạt và minh chứng của từng tiêu chí. Trong công trình mới, trạng thái phụ thuộc hồ sơ thực tế.


9.1. Gói nghiệm thu thầu phụ: xuất BM-GS-03

Mục đích chính: xuất kết quả kiểm tra chất lượng đã lưu của gói thầu phụ vào biên bản client. QS/QA/QC hoặc người được giao lập phiếu kiểm tra dữ liệu; người có thẩm quyền ghi kết luận nghiệm thu theo hồ sơ và phân quyền.


1. Vào **Quy trình > Giai đoạn Nghiệm thu đầu vào > Gói công việc nghiệm thu thầu phụ > Mở Đầu việc**. Mở phiếu checklist/gói nghiệm thu thầu phụ đang áp dụng. **Nút BM03 nằm ở đầu phiếu này**, không phải nút xuất chung của trang Nghiệm thu vật tư hoặc nghiệm thu đầu ra.
2. Đối chiếu số biên bản, ngày, hạng mục, tiêu chuẩn/bản vẽ tham chiếu, yêu cầu kỹ thuật, khối lượng thiết kế và thực đo, kết quả/nhận xét từng dòng, kết luận chung. Khối lượng đối soát thương mại không thay cho khối lượng đo hoặc đánh giá chất lượng.
3. Lưu nội dung phiếu trước khi chọn **Xuất báo cáo**. Với gói client cần hoàn tất Đầu việc, gửi đối soát của chính phiên bản phiếu đang xử lý bằng luồng hiện có; đối soát của phiên bản cũ không thay cho bản đã chỉnh sửa. Điều kiện hoàn tất Đầu việc độc lập với thao tác tải file.
4. Mở file; kiểm tra đúng số biên bản, ba dòng của ví dụ, kết quả từng dòng và kết luận được đánh dấu. Trạng thái Đầu việc đã hoàn tất không được dùng để tự điền Đạt cho dòng chưa có đánh giá.

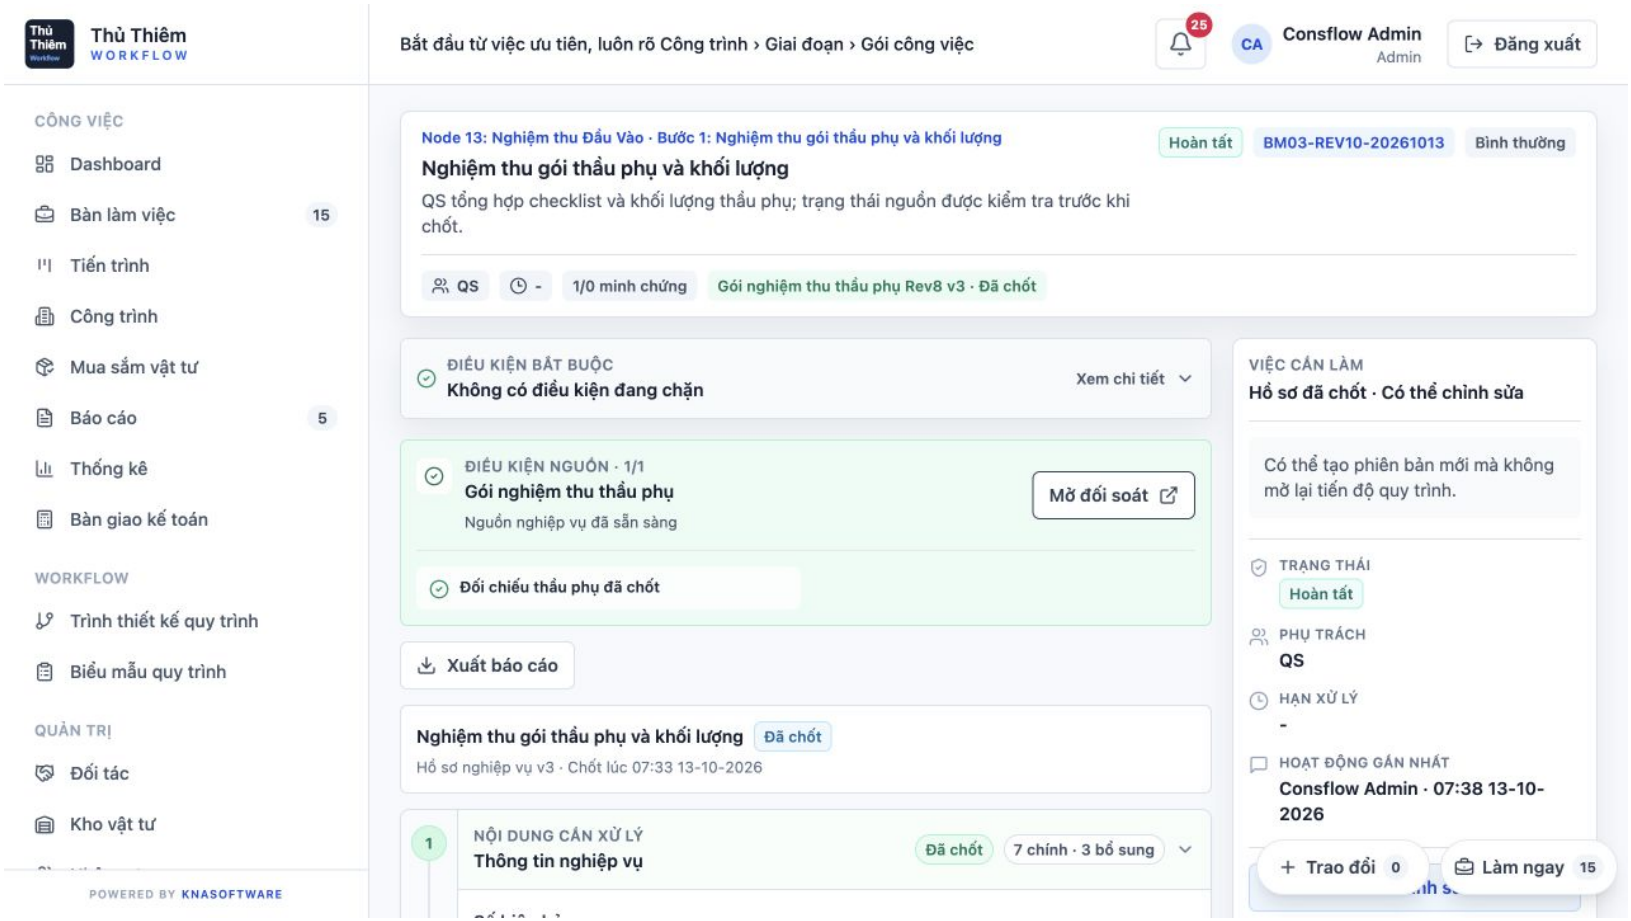

BM03-A · Công trình thử BM03-REV10-20261013: Đầu việc thầu phụ đã hoàn tất, nút Xuất báo cáo ở đầu phiếu. Ảnh Development 13/10/2026, không thuộc công trình Rev9 ở đầu tài liệu.

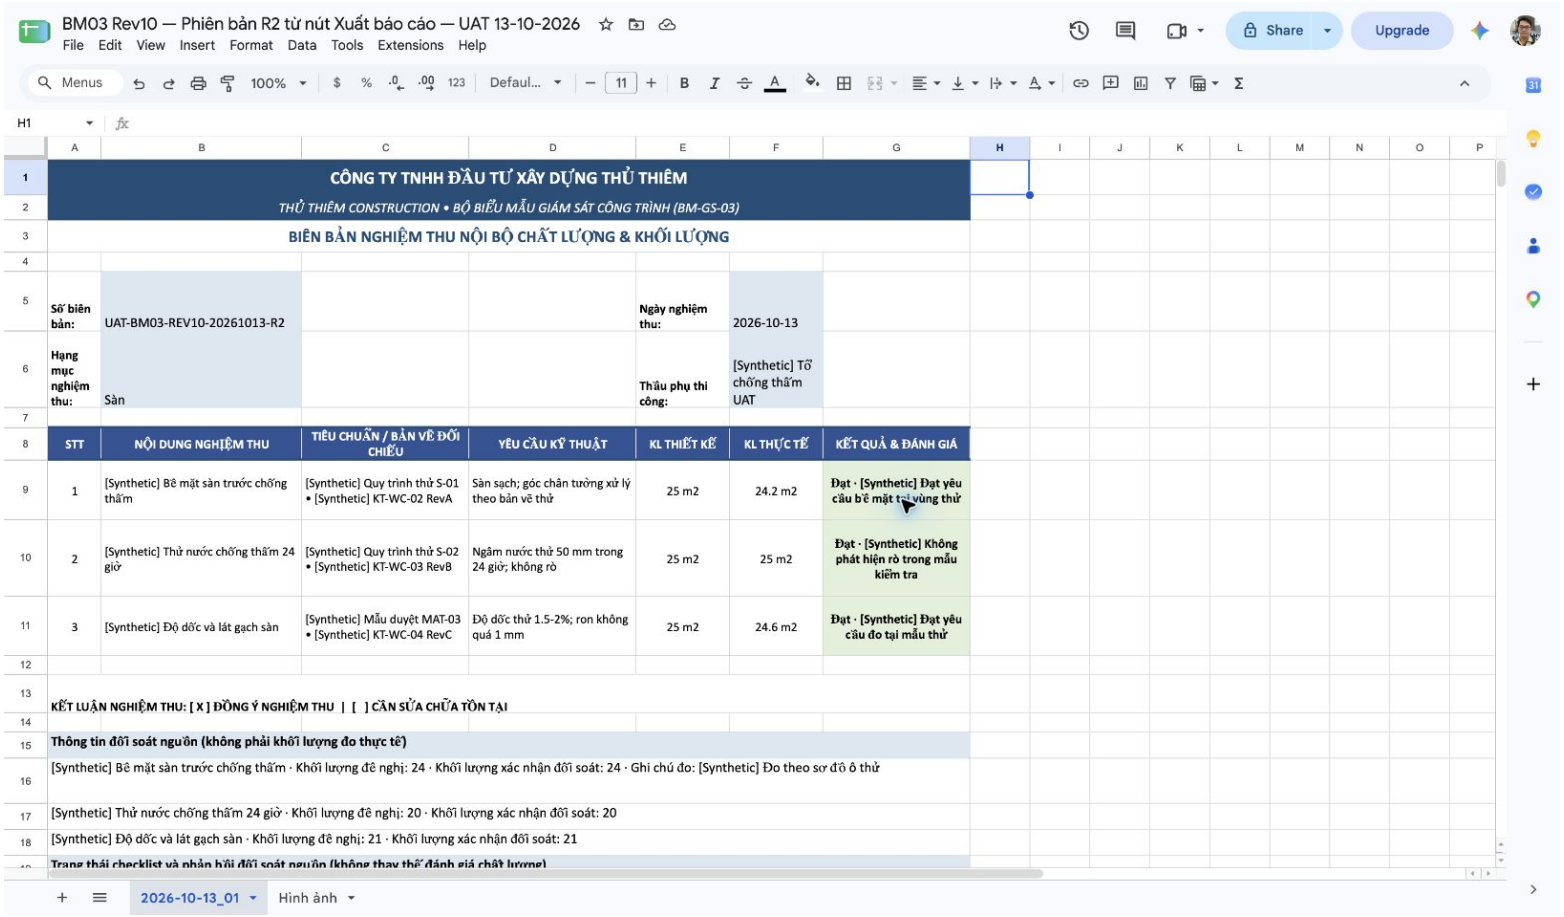

BM03-B · File xuất phiên bản R2: ba dòng checklist có khối lượng thiết kế, thực đo và kết quả chất lượng riêng. Số liệu đối soát thương mại được ghi ở phần thông tin bổ sung, không thay dữ liệu thực đo.

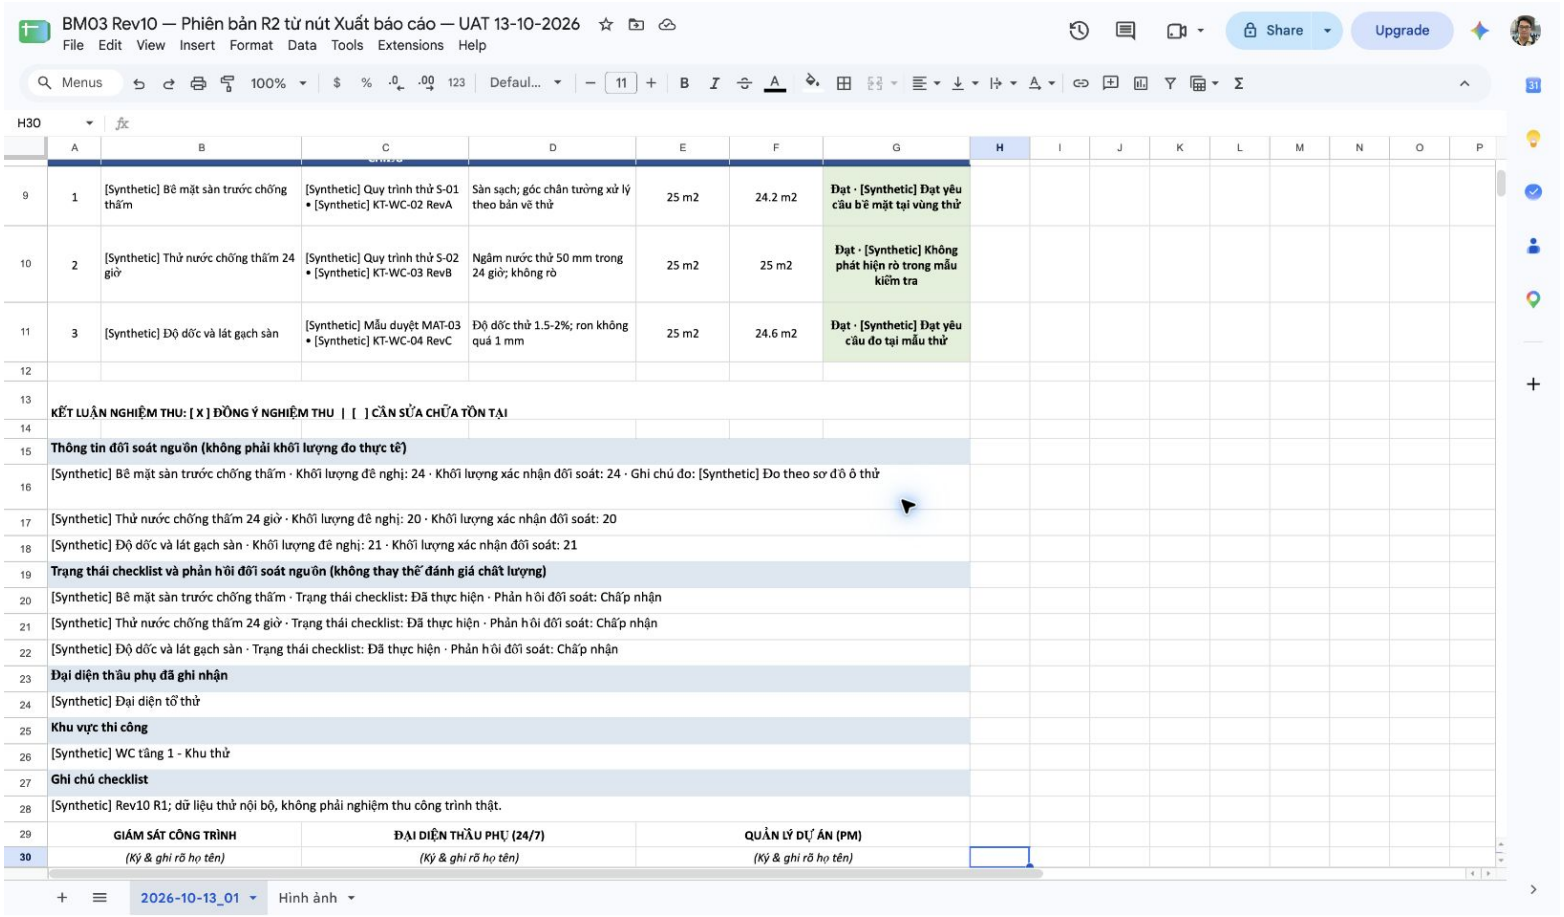

9	1	[Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm	[Synthetic] Quy trình thử S-01 • [Synthetic] KT-WC-02 RevA	Sàn sạch; góc chân tường xử lý theo bản vẽ thử	25 m2	24.2 m2	Đạt · [Synthetic] Đạt yêu cầu bề mặt tại vùng thử
10	2	[Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ	[Synthetic] Quy trình thử S-02 • [Synthetic] KT-WC-03 RevB	Ngâm nước thử 50 mm trong 24 giờ; không rò	25 m2	25 m2	Đạt · [Synthetic] Không phát hiện rò trong mẫu kiểm tra
11	3	[Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn	[Synthetic] Mẫu duyệt MAT-03 • [Synthetic] KT-WC-04 RevC	Độ dốc thử 1.5-2%; ron không quá 1 mm	25 m2	24.6 m2	Đạt · [Synthetic] Đạt yêu cầu đo tại mẫu thử

12	
13	**KẾT LUẬN NGHIỆM THU: [X] ĐỒNG Ý NGHIỆM THU | [ ] CẦN SỬA CHỮA TỒN TẠI**
14	
15	**Thông tin đối soát nguồn (không phải khối lượng đo thực tế)**
16	[Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm · Khối lượng đề nghị: 24 · Khối lượng xác nhận đối soát: 24 · Ghi chú đo: [Synthetic] Đo theo sơ đồ ô thử
17	[Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ · Khối lượng đề nghị: 20 · Khối lượng xác nhận đối soát: 20
18	[Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn · Khối lượng đề nghị: 21 · Khối lượng xác nhận đối soát: 21
19	**Trạng thái checklist và phản hồi đối soát nguồn (không thay thế đánh giá chất lượng)**
20	[Synthetic] Bề mặt sàn trước chống thấm · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
21	[Synthetic] Thử nước chống thấm 24 giờ · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
22	[Synthetic] Độ dốc và lát gạch sàn · Trạng thái checklist: Đã thực hiện · Phản hồi đối soát: Chấp nhận
23	**Đại diện thầu phụ đã ghi nhận**
24	[Synthetic] Đại diện tổ thử
25	**Khu vực thi công**
26	[Synthetic] WC tầng 1 - Khu thử
27	**Ghi chú checklist**
28	[Synthetic] Rev10 R1; dữ liệu thử nội bộ, không phải nghiệm thu công trình thật.

29	**GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH**	**ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ (24/7)**	**QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)**
30	*(Ký & ghi rõ họ tên)*	*(Ký & ghi rõ họ tên)*	*(Ký & ghi rõ họ tên)*

BM03-C · Kiểm tra kết luận nghiệm thu, ghi chú và phần ký. File đã tải của R1 được giữ riêng; ảnh R2 không chứng minh đã chạy lại mọi đường xuất lịch sử của BM03.


Khi cần sửa: thực hiện điều chỉnh/phiên bản mới theo hồ sơ nguồn, giữ bản đã chốt và các file đã gửi. Xuất báo cáo không thay thế chữ ký, kết luận nghiệm thu hoặc bước đối soát.

10. Bàn giao: xác nhận công trình đã đủ điều kiện

Mục đích chính: giao công trình và bộ hồ sơ cho chủ đầu tư trên căn cứ nghiệm thu cuối, hồ sơ hoàn công, bảo hành, tồn tại và vật tư dư. Vào **Bàn giao › Tạo hồ sơ** khi đã có nghiệm thu cuối phù hợp. Chọn đúng nghiệm thu nguồn; phần mềm khóa mối liên hệ này trong hồ sơ bàn giao.

Hành động	Người làm	Người kiểm tra/quyết định	Quan hệ giữa hồ sơ
Lập hồ sơ bàn giao	PM hoặc người có quyền tạo	QA/QC đối chiếu nghiệm thu cuối	Hồ sơ Bàn giao dẫn về đúng biên bản nghiệm thu cuối, không tự tạo nghiệm thu mới
Kiểm tra danh mục hồ sơ	PM/QA/QC hoặc người có quyền xác minh	Người có quyền xác minh, căn cứ hồ sơ/ảnh đã chấp nhận	Mỗi mục phải có căn cứ; mục thiếu vẫn là điểm chặn
Gửi, kiểm tra điều kiện và hoàn tất	PM gửi; PM/Giám đốc hoặc người có quyền hoàn tất	Người có quyền quyết định trên trạng thái đủ điều kiện	Chỉ hoàn tất khi nghiệm thu cuối đạt, danh mục hồ sơ đủ, không còn tồn tại/vật tư dư/hồ sơ bắt buộc đang chặn
Nhật ký bàn giao	Hệ thống ghi từ từng thao tác trên hồ sơ	PM và người đối chiếu đọc lịch sử	Biết ai gửi, ai xác minh, ai hoàn tất; đại diện chủ đầu tư được ghi bằng hồ sơ/xác nhận, không dùng tài khoản phần mềm của chủ đầu tư

Nếu màn hình chỉ **4/8 mục hồ sơ** hoặc còn "điểm chặn", mở liên kết về hồ sơ nguồn, xử lý xong rồi quay lại **Kiểm tra lại**. Không đánh dấu đủ điều kiện bằng lời nói hoặc tin trao đổi.

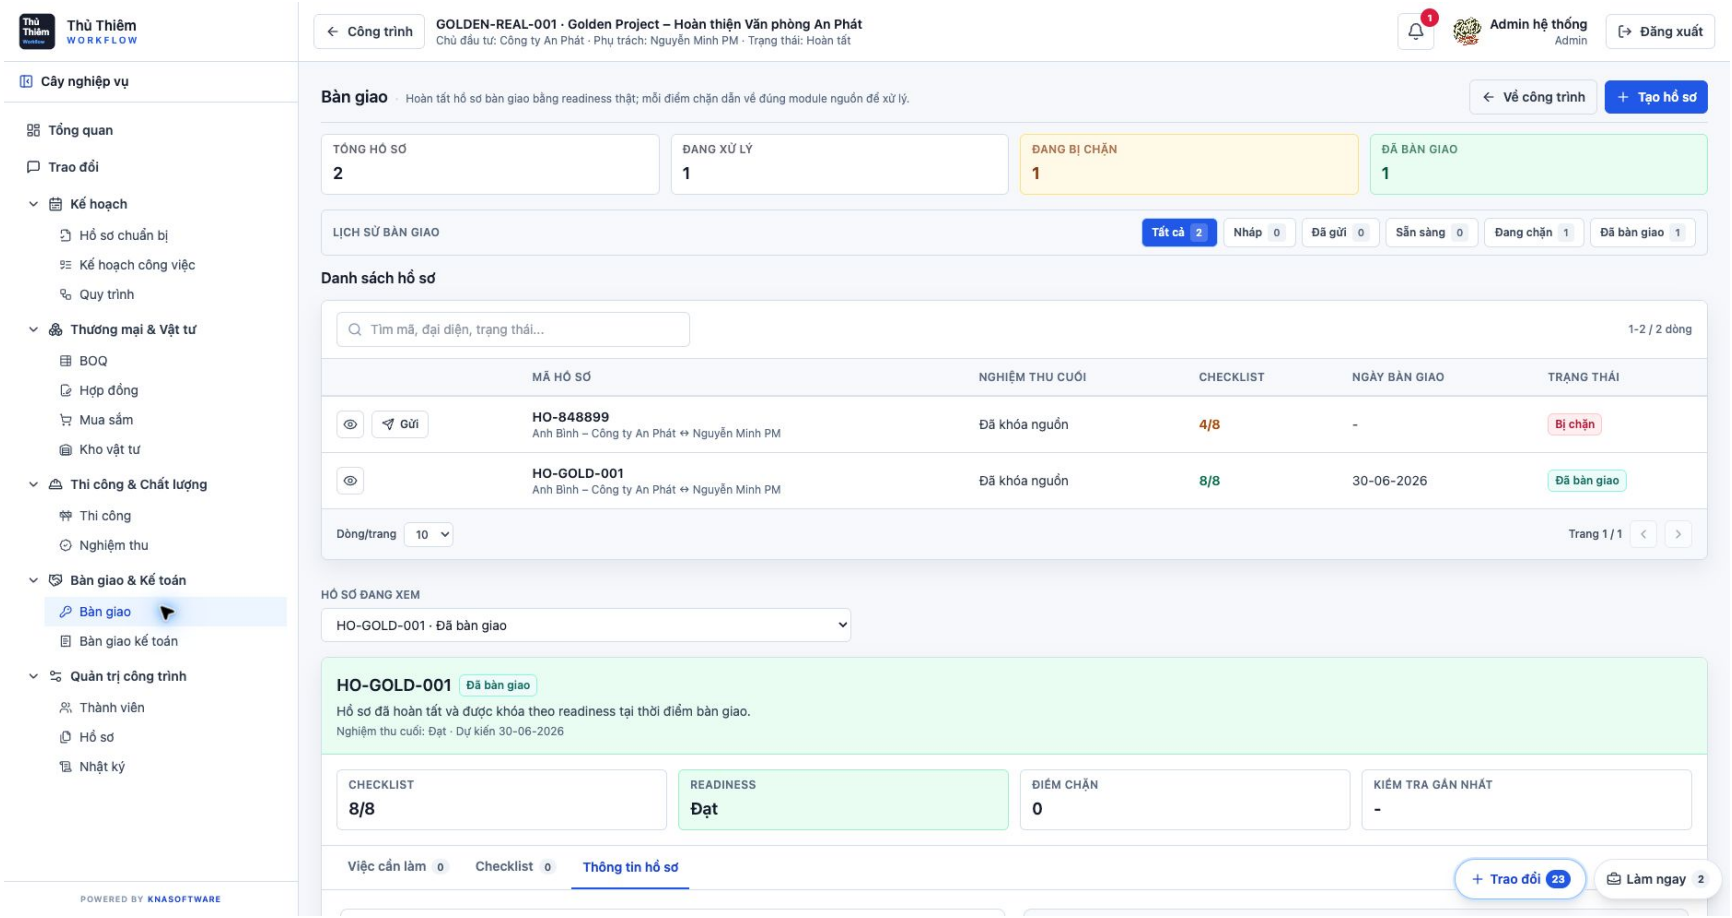


Ảnh 26 · Hồ sơ mẫu hiển thị 8/8 mục và trạng thái đã bàn giao; đây là lịch sử của công trình mẫu khác.


10.1. Hồ sơ bàn giao: xuất BM-GS-08

Mục đích chính: xuất danh mục và kết quả bàn giao của đúng hồ sơ đang xem. PM/người lập và người có quyền xem Bàn giao thao tác; QA/QC cùng người có thẩm quyền đối chiếu hồ sơ, đánh giá và kết luận.

1. Vào **Bàn giao**, mở đúng hồ sơ gắn nghiệm thu cuối của công trình. Kiểm tra **ngày bàn giao đã lưu**, giai đoạn bàn giao và các hạng mục. Khi lập hồ sơ mới, nhập ngày theo nghiệp vụ; lưu rồi mở lại để kiểm tra ngày vẫn đúng.
2. Nếu cần ghi nhận hiện trạng, dùng **Cập nhật đánh giá** cho giai đoạn/kết luận chung và **Đánh giá** ở từng hạng mục theo quyền hiện có. Đánh giá vật lý và xác minh đủ hồ sơ là hai việc khác nhau; không dùng tình trạng đã xác minh để tự kết luận Đạt vật lý.
3. Chọn **Xuất báo cáo** phía trên chi tiết hồ sơ. Không cần chọn lại nghiệm thu nguồn, mẫu hoặc ảnh. Mở file, kiểm tra công trình, giai đoạn, danh mục, yêu cầu, kết quả, tồn tại cần xử lý, thời hạn và kết luận.
4. Đối chiếu ngày bàn giao tại phần thông tin/ghi chú nguồn trong file. Cột **Thời hạn xử lý** dành cho tồn tại cần sửa; không phải ô ghi ngày bàn giao. Ví dụ đã nghiệm thu lưu ngày **14-10-2026**, khác ngày kiểm tra gần nhất **13-10-2026**; file không được thay hai mốc cho nhau.

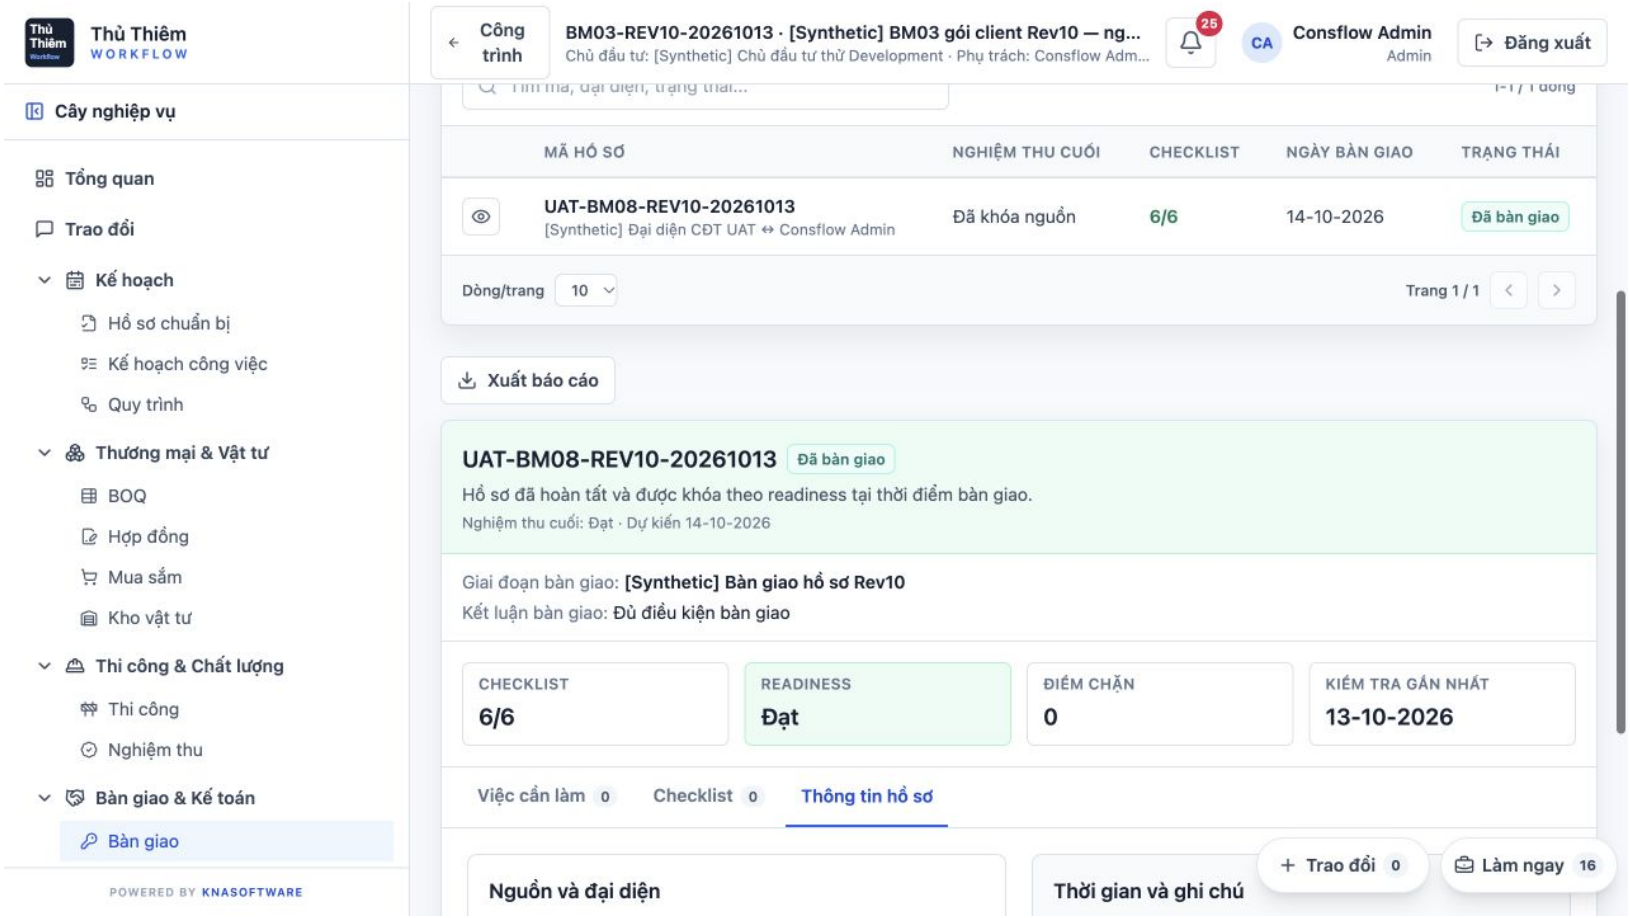

BM08-A · Hồ sơ UAT-BM08-REV10-20261013 đã bàn giao, đủ 6/6 danh mục và không còn điểm chặn trong công trình thử Rev10. Xuất báo cáo nằm phía trên chi tiết. Đây là ảnh Development 13/10/2026.

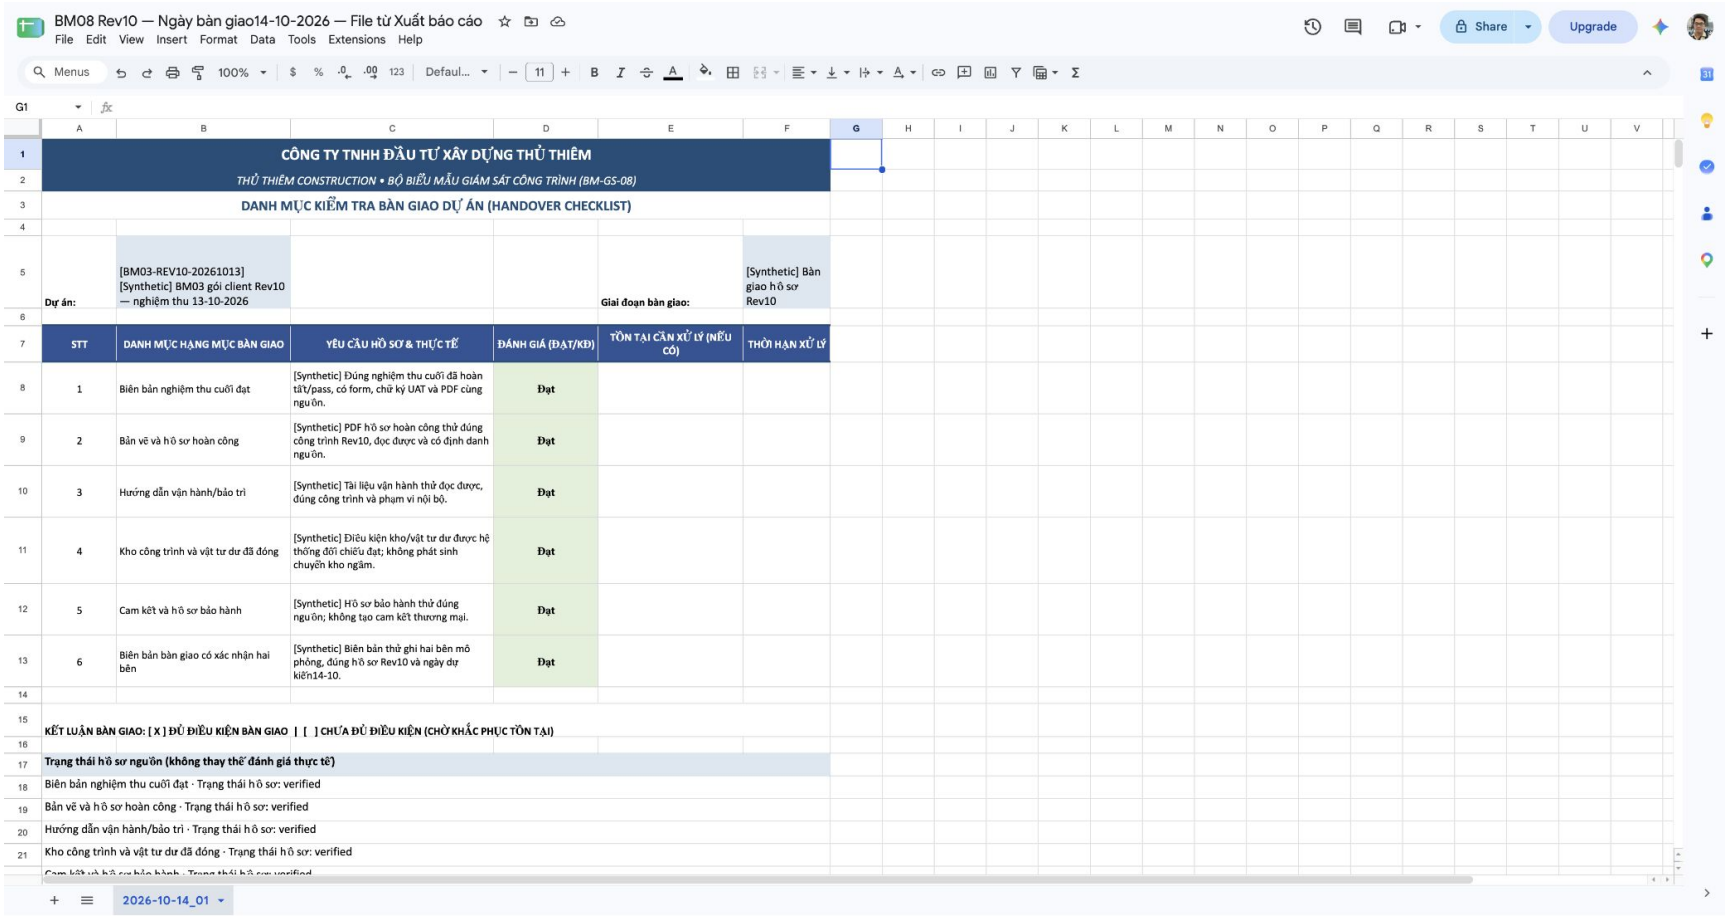

BM08 Rev10 — Ngày bàn giao14-10-2026 — File từ Xuất báo cáo

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share Upgrade

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦ THIÊM

THỦ THIÊM CONSTRUCTION • BỘ BIỂU MẪU GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH (BM-GS-08)

DANH MỤC KIỂM TRA BÀN GIAO DỰ ÁN (HANDOVER CHECKLIST)

Dự án:	[BM03-REV10-20261013] [Synthetic] BM03 gói client Rev10 — nghiệm thu 13-10-2026	**Giai đoạn bàn giao:**	[Synthetic] Bàn giao hồ sơ Rev10	

STT	DANH MỤC HẠNG MỤC BÀN GIAO	YÊU CẦU HỒ SƠ & THỰC TẾ	ĐÁNH GIÁ (ĐẠT/KĐ)	TỒN TẠI CẦN XỬ LÝ (NẾU CÓ)	THỜI HẠN XỬ LÝ
1	Biên bản nghiệm thu cuối đạt	[Synthetic] Đúng nghiệm thu cuối đã hoàn tất/pass, có form, chữ ký UAT và PDF cùng ngu ồn.	Đạt		
2	Bản vẽ và hồ sơ hoàn công	[Synthetic] PDF hồ sơ hoàn công thử đúng công trình Rev10, đọc được và có định danh ngu ồn.	Đạt		
3	Hướng dẫn vận hành/bảo trì	[Synthetic] Tài liệu vận hành thử đọc được, đúng công trình và phạm vi nội bộ.	Đạt		
4	Kho công trình và vật tư dư đã đóng	[Synthetic] Điều kiện kho/vật tư dư được hệ thống đối chiếu đạt; không phát sinh chuyển kho ngầm.	Đạt		
5	Cam kết và hồ sơ bảo hành	[Synthetic] Hồ sơ bảo hành thử đúng ngu ồn; không tạo cam kết thương mại.	Đạt		
6	Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên	[Synthetic] Biên bản thử ghi hai bên mô phỏng, đúng hồ sơ Rev10 và ngày dự kiến14-10.	Đạt		

KẾT LUẬN BÀN GIAO: [X] ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO | [ ] CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN (CHỜ KHẮC PHỤC TỒN TẠI)

Trạng thái hồ sơ ngu ồn (không thay thế đánh giá thực tế)

Biên bản nghiệm thu cuối đạt · Trạng thái hồ sơ: verified


Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Trạng thái hồ sơ: verified

Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Trạng thái hồ sơ: verified

Kho công trình và vật tư dư đã đóng · Trạng thái hồ sơ: verified

2026-10-14_01

BM08-B · File tải nguyên trạng đã mở trên Google Sheets: danh mục, yêu cầu và đánh giá đúng hồ sơ; kết luận được đánh dấu từ nội dung đã ghi.

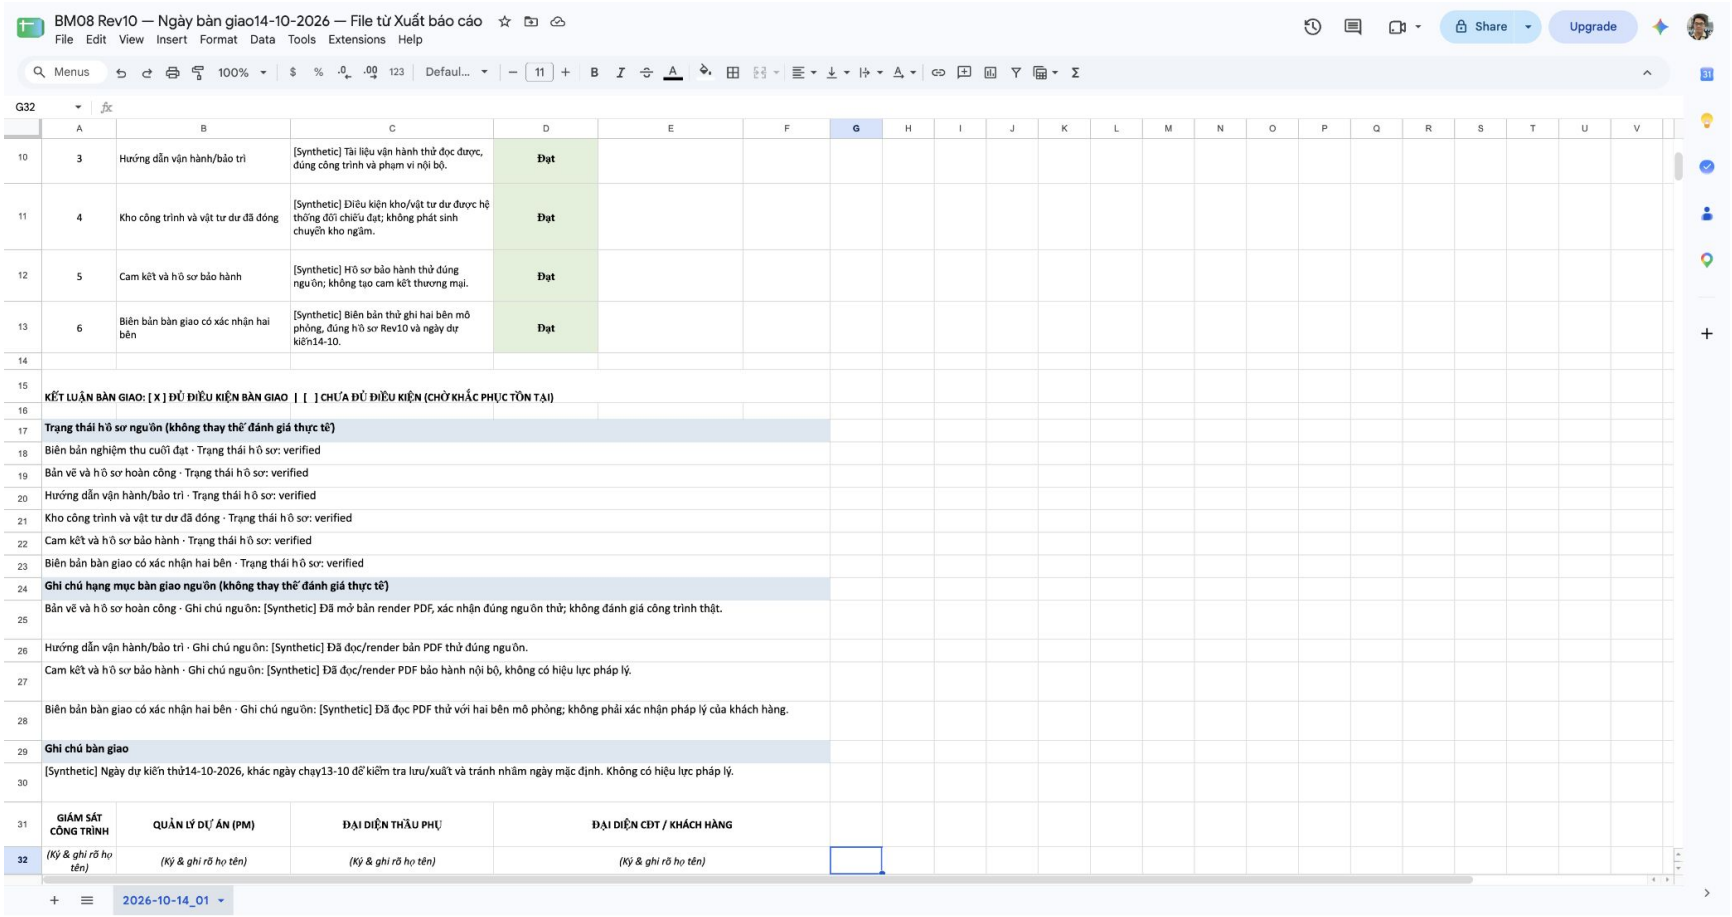

3	Hướng dẫn vận hành/bảo trì	[Synthetic] Tài liệu vận hành thử đọc được, đúng công trình và phạm vi nội bộ.	Đạt	
4	Kho công trình và vật tư dư đã đóng	[Synthetic] Điều kiện kho/vật tư dư được hệ thống đối chiếu đạt; không phát sinh chuyển kho ngầm.	Đạt	
5	Cam kết và hồ sơ bảo hành	[Synthetic] Hồ sơ bảo hành thử đúng nguồn; không tạo cam kết thương mại.	Đạt	
6	Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên	[Synthetic] Biên bản thử ghi hai bên mô phỏng, đúng hồ sơ Rev10 và ngày dự kiến14-10.	Đạt	

KẾT LUẬN BÀN GIAO: [X] ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÀN GIAO | [ ] CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN (CHỜ KHẮC PHỤC TỒN TẠI)

Trạng thái hồ sơ nguồn (không thay thế đánh giá thực tế)

Biên bản nghiệm thu cuối đạt · Trạng thái hồ sơ: verified

Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Trạng thái hồ sơ: verified

Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Trạng thái hồ sơ: verified

Kho công trình và vật tư dư đã đóng · Trạng thái hồ sơ: verified

Cam kết và hồ sơ bảo hành · Trạng thái hồ sơ: verified

Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên · Trạng thái hồ sơ: verified

Ghi chú hạng mục bàn giao nguồn (không thay thế đánh giá thực tế)

Bản vẽ và hồ sơ hoàn công · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã mở bản render PDF, xác nhận đúng nguồn thử; không đánh giá công trình thật.

Hướng dẫn vận hành/bảo trì · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã đọc/render bản PDF thử đúng nguồn.

Cam kết và hồ sơ bảo hành · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã đọc/render PDF bảo hành nội bộ, không có hiệu lực pháp lý.

Biên bản bàn giao có xác nhận hai bên · Ghi chú nguồn: [Synthetic] Đã đọc PDF thử với hai bên mô phỏng; không phải xác nhận pháp lý của khách hàng.

Ghi chú bàn giao

[Synthetic] Ngày dự kiến thử14-10-2026, khác ngày chạy13-10 để kiểm tra lưu/xuất và tránh nhầm ngày mặc định. Không có hiệu lực pháp lý.

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH	QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)	ĐẠI DIỆN THẦU PHỤ	ĐẠI DIỆN CĐT / KHÁCH HÀNG
(Ký & ghi rõ họ tên)	*(Ký & ghi rõ họ tên)*	*(Ký & ghi rõ họ tên)*	*(Ký & ghi rõ họ tên)*


BM08-C · Phần ghi chú giữ ngày bàn giao 14-10-2026 và ngày kiểm tra 13-10-2026. Phần ký và thời hạn xử lý giữ ý nghĩa riêng của mẫu client.

Sau khi xuất: tiếp tục kiểm tra điều kiện, gửi và hoàn tất bàn giao bằng thao tác được phân quyền. Trong công trình thử, Đầu việc bàn giao vật lý đã chốt riêng; bước kế toán còn chưa chốt theo chủ ý. File BM08 không chứng minh đã tiếp nhận kế toán, thanh toán hoặc hoàn tất toàn bộ Giai đoạn cuối.

11. Bàn giao kế toán: chuyển hồ sơ nguồn và xác nhận tiếp nhận

Mục đích chính: bàn giao đủ hồ sơ mua sắm và mốc thu từ hợp đồng để Kế toán tiếp nhận hoặc trả bổ sung. Đây là **cách làm của công trình mới dùng mẫu bản 9**. Ảnh minh họa bên dưới lấy từ một công trình mẫu đã có hồ sơ; công trình vừa tạo chưa đến chặng kế toán.

Hồ sơ/hành động	Người làm	Người kiểm tra/tiếp nhận	Điều cần kiểm tra
Hồ sơ mua sắm đủ điều kiện	Mua hàng/PM hoàn tất nguồn mua và gửi bàn giao	Kế toán xem hồ sơ nguồn, nhà cung cấp, đơn đặt hàng và giá trị tham chiếu	Một hồ sơ bàn giao gắn một nguồn; không tự phát sinh thanh toán
Mốc thu theo hợp đồng chủ đầu tư	PM/Bộ phận HĐ chuẩn bị căn cứ hợp đồng và nghiệm thu nếu mốc yêu cầu	Kế toán kiểm tra và tiếp nhận	Chưa đủ nghiệm thu/căn cứ thì chưa coi là sẵn sàng
Tiếp nhận hoặc trả bổ sung	Kế toán quyết định trên hồ sơ đã gửi	PM/Mua hàng nhận lý do trả, bổ sung trên nguồn và gửi lại	Ghi lý do, người thao tác và thời điểm; lần gửi lại không xóa lịch sử cũ
Nhật ký hồ sơ kế toán	Hệ thống ghi gửi, trả, gửi lại, tiếp nhận	Kế toán/PM đối chiếu	"Đã tiếp nhận" là trạng thái bàn giao hồ sơ, **không phải** đã hạch toán, xuất hóa đơn hay thanh toán

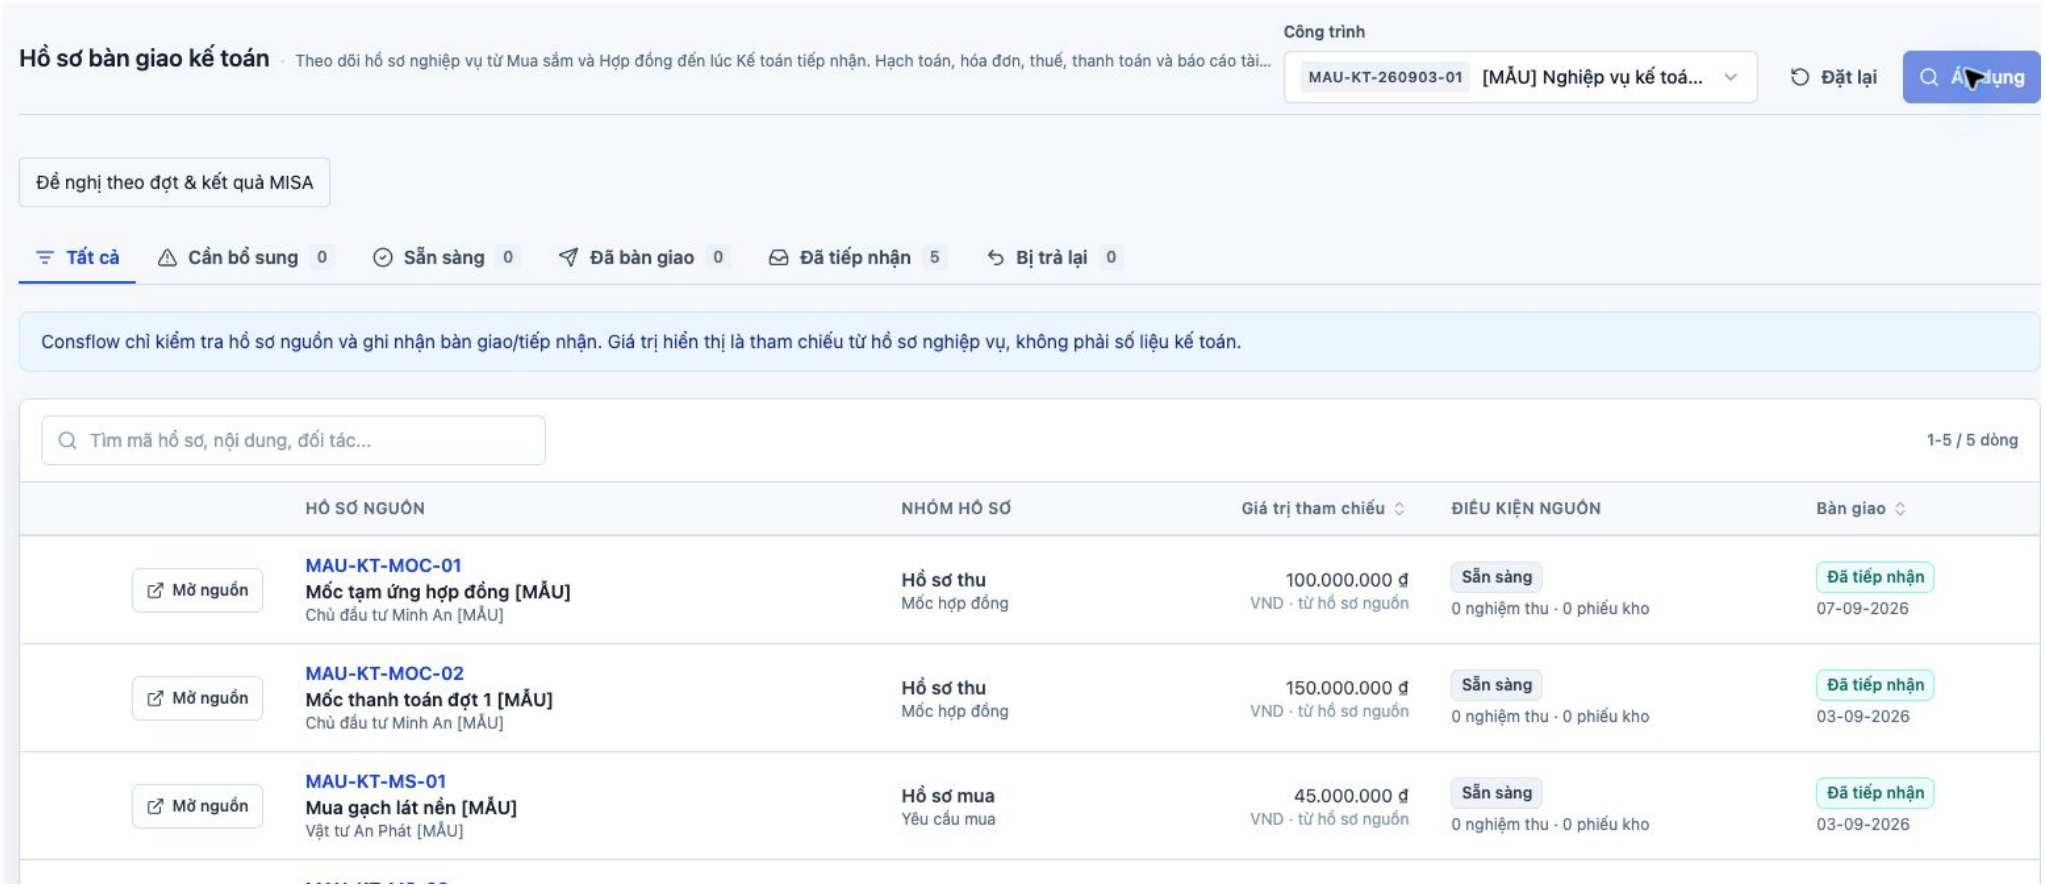

Ảnh 27 · Công trình mẫu nghiệp vụ kế toán hiển thị hồ sơ mua, giá trị tham chiếu và trạng thái tiếp nhận. Phần mềm không thực hiện sổ sách, hóa đơn, thuế hoặc thanh toán thay MISA.

12. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi	Trả lời ngắn
"Ai làm tiếp?"	"Xem thẻ Bước tiếp theo trong Trao đổi hoặc việc ưu tiên trong Tổng quan; mở Đầu việc để thấy người phụ trách và hồ sơ cần hoàn thành."
"Chat có thay cho duyệt không?"	"Không. Chat để hỏi, giao và làm rõ; quyết định được ghi tại đúng Đầu việc, Giai đoạn hoặc hồ sơ nghiệp vụ."
"Vì sao chưa chuyển bước?"	"Mở điều kiện đang chặn; xử lý tại hồ sơ nguồn, rồi quay lại kiểm tra và hoàn tất."
"Ai tạo nhật ký, ai phê duyệt?"	"Nhật ký thi công do người hiện trường lập. Lịch sử của Nghiệm thu, Bàn giao và Kế toán do hệ thống ghi từ người thao tác; người có quyền kết luận/tiếp nhận được nêu ngay trên từng hồ sơ."
"Chủ đầu tư vào phần mềm để duyệt à?"	"Trong công trình tham chiếu, xác nhận của chủ đầu tư được lưu bằng hồ sơ và tài liệu liên quan; chưa có thao tác duyệt bằng tài khoản phần mềm của chủ đầu tư."
"Đã bàn giao kế toán là đã chi tiền?"	"Chưa. Kế toán mới xác nhận nhận đủ hồ sơ; nghiệp vụ hạch toán, hóa đơn, thuế và thanh toán tiếp tục ở hệ thống kế toán."
"Vào đâu để chọn tám mẫu BMGS?"	"Mở hồ sơ đang làm và dùng nút xuất ngay tại đó; bảng tra cứu ở mục 1.1 chỉ đúng đường dẫn. Không có bước chọn lại mẫu/ảnh khi xuất."
"Nút xuất trên phiếu bị khóa?"	"Kiểm tra thay đổi chưa lưu và thao tác đang chạy. Lưu trước rồi xuất; nếu vẫn không được, đối chiếu quyền và thông báo lỗi của hồ sơ."
"BM02 có việc rồi sao vẫn Chưa đánh giá?"	"Nội dung công việc được dùng làm ghi chú; chỉ kết luận đã ghi tại nguồn mới quyết định Đạt/Không đạt. Không tự suy Đạt từ công việc hoàn tất hoặc ảnh."
"BM02 xuất bản hiện tại hay bản đã gửi?"	"Nhật ký/phiếu xuất nguồn đang xem; Báo cáo > chọn Lần gửi > Xuất báo cáo xuất đúng lần đó. Xuất sổ đăng ký là file danh sách riêng."
"Vì sao BM02 có sheet Hình ảnh, BM07 thì không?"	"Mẫu chính BM02 không có ô ảnh nên ảnh đi kèm ở sheet phụ. BM07 có cột ảnh trong bảng chính; ảnh nằm trong ô của từng dòng. BM01/BM05 không yêu cầu ô ảnh trong mẫu gốc."
"File trống dữ liệu, lỗi ảnh hoặc quá nhiều hồ sơ?"	"Kiểm tra nguồn đã lưu, ảnh liên kết và quyền xem; nếu báo vượt giới hạn thì thu hẹp bộ lọc rồi xuất lại. Không tự điền dữ kiện thiếu hoặc coi file thiếu ảnh là kết quả đạt."

Điều kiện hoàn tất: ở mỗi công trình, chỉ gọi một chặng là hoàn tất khi hồ sơ nguồn, quyết định đúng người và trạng thái Quy trình cùng khớp. Nếu thiếu vai trò, minh chứng hoặc điều kiện, để trạng thái chờ/bị chặn và ghi rõ ai sẽ xử lý tiếp.
