THỦ THIÊM WORKFLOW

MÔ TẢ WORKFLOW TEMPLATE


[Client] Workflow hoàn thiện công trình chính thức

Revision: 4 Trạng thái: Đã phát hành Tổng số node: 15 Xuất lúc: 05/08/2026 10:53 +07

Mô tả: Revision 4: bổ sung Mua hàng ở bước lập giá, tách QA/QC khỏi báo cáo Giám sát, bắt buộc hồ sơ/hình ảnh đúng trách nhiệm và hoàn thiện báo cáo định nghĩa workflow.

1. SƠ ĐỒ

Bố cục: Theo luồng workflow | 15 node | 16 connector

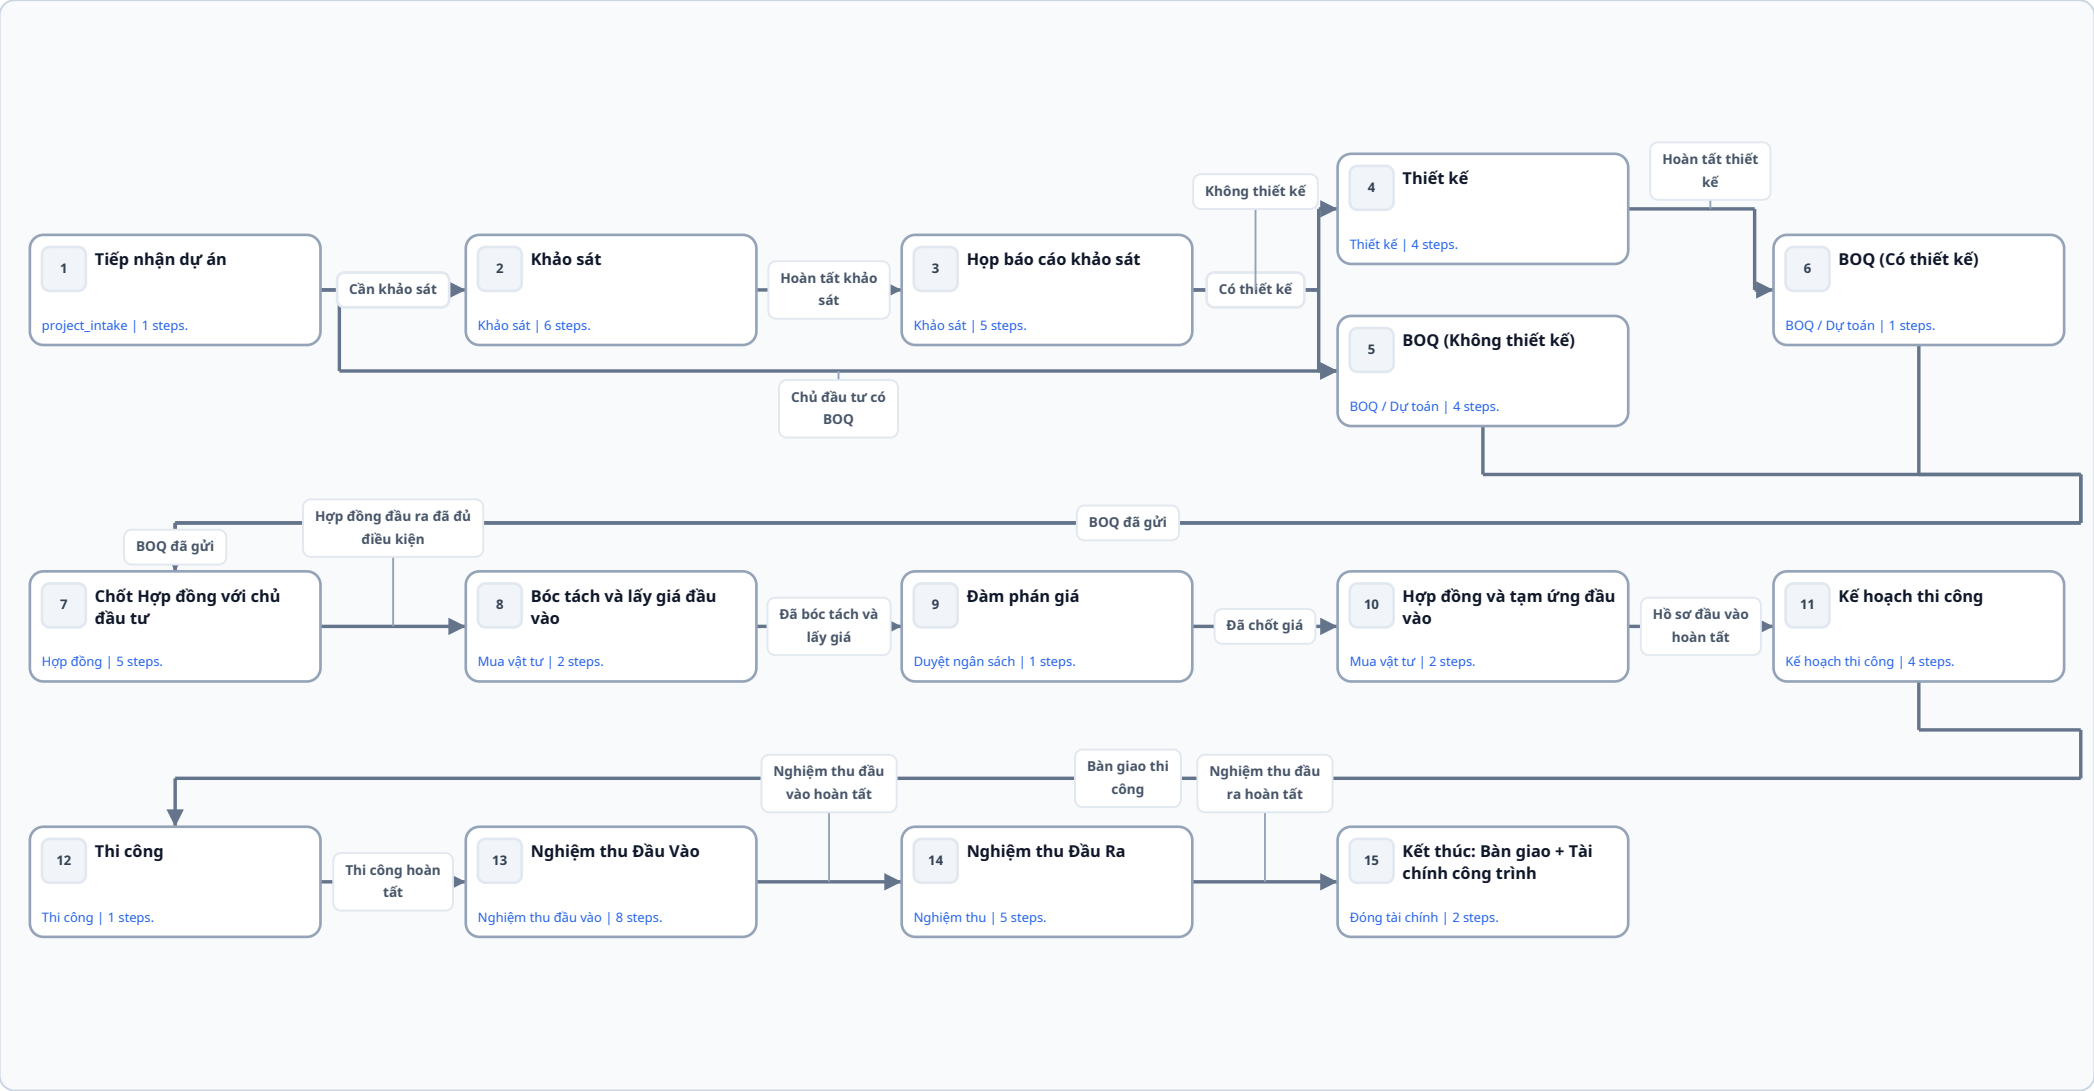

2. DANH SÁCH NODE

STT	Business code	Tên node	Mô tả	Loại	Phân quyền	Role được duyệt	Bắt buộc nhập ý kiến duyệt	Người gửi không được tự duyệt
1	project_intake	Tiếp nhận dự án	Xác nhận hồ sơ đầu vào và dùng lựa chọn đã chốt khi tạo công trình để vào nhánh Khảo sát hoặc BOQ có sẵn.	project_intake	Xem công trình (project.view) Cập nhật công trình (project.update) Xem pipeline (pipeline.view)	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
2	survey	Khảo sát	Ghi nhận hiện trạng, kích thước và rủi ro ban đầu. Đầu ra là biên bản khảo sát.	Khảo sát (survey)	Sửa planning (planning.edit)	Một trong: PM, Giám sát, QS	Có	Có
3	survey_review	Họp báo cáo khảo sát	Họp thống nhất vấn đề, lên báo giá, phân việc và chốt nhánh có thiết kế hay không thiết kế.	Khảo sát (survey)	Sửa planning (planning.edit) Xem BOQ (boq.view)	Một trong: PM, QS, Giám sát	Có	Có
4	design	Thiết kế	Chuẩn bị bản vẽ, phương án thiết kế và xác nhận với khách hàng.	Thiết kế (design)	Sửa planning (planning.edit)	Một trong: PM, Chủ đầu tư	Có	Có
5	boq_without_design	BOQ (Không thiết kế)	Bóc tách, lấy giá và gửi BOQ khi công trình không cần thiết kế.	BOQ / Dự toán (boq)	Xem BOQ (boq.view) Sửa BOQ (boq.update) Duyệt BOQ (boq.approve)	Một trong: QS, PM, Giám đốc	Có	Có
6	boq_with_design	BOQ (Có thiết kế)	Gửi BOQ qua chủ đầu tư sau khi hoàn tất thiết kế.	BOQ / Dự toán (boq)	Xem BOQ (boq.view) Sửa BOQ (boq.update)	Một trong: QS, PM	Có	Có
7	outbound_contract	Chốt Hợp đồng với chủ đầu tư	Lên báo giá, hợp đồng, pháp lý, ký duyệt và gửi bản cứng cho chủ đầu tư.	Hợp đồng (contract)	Xem hợp đồng (contract.view) Tạo và sửa hợp đồng (contract.create) Review hợp đồng (contract.review) Duyệt hợp đồng (contract.approve) Ký và kích hoạt hợp đồng (contract.sign) Gửi hồ sơ hợp đồng giấy (contract.dispatch) Quản lý bản scan hợp đồng (contract.scan_manage)	Theo thứ tự: QS > Bộ phận HĐ > Kế toán > Pháp lý > Mua hàng > PM > Giám đốc	Có	Có
8	input_takeoff_purchase	Bóc tách và lấy giá đầu vào	Bóc khối lượng và lấy giá tổ đội, thầu phụ, nhà cung cấp sau khi hợp đồng đầu ra đã chốt.	Mua vật tư (procurement)	Xem BOQ (boq.view) Sửa BOQ (boq.update) Xem mua sắm (procurement.view) Tạo yêu cầu mua (procurement.create)	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng
9	price_negotiation	Đàm phán giá	Đàm phán và chốt đơn giá đầu vào trong một bước duy nhất.	Duyệt ngân sách (budget_approval)	Xem BOQ (boq.view) Duyệt BOQ (boq.approve) Xem ngân sách (accounting.budget_view)	Một trong: PM, QS, Giám đốc, Kế toán	Có	Có
10	input_contract_advance	Hợp đồng và tạm ứng đầu vào	Ký hợp đồng, lập hồ sơ tạm ứng và rà soát đầu vào sau khi đã chốt giá.	Mua vật tư (procurement)	Xem hợp đồng (contract.view) Tạo và sửa hợp đồng (contract.create) Review hợp đồng (contract.review) Xem mua sắm (procurement.view) Duyệt mua (procurement.approve)	Một trong: QS, Mua hàng, PM, Giám đốc	Có	Có

2. DANH SÁCH NODE (tiếp theo)

STT	Business code	Tên node	Mô tả	Loại	Phân quyền	Role được duyệt	Bắt buộc nhập ý kiến duyệt	Người gửi không được tự duyệt
11	construction_planning	Kế hoạch thi công	Phân công thi công, lập hồ sơ chất lượng với chủ đầu tư và bàn giao danh sách hạng mục giám sát.	Kế hoạch thi công (construction_planning)	Xem thi công (operation.view) Tạo daily report (operation.report) Tạo issue (operation.issue_create)	Một trong: PM, QS, Giám sát, QA/QC	Có	Có
12	construction_execution	Thi công	Giám sát báo cáo theo hạng mục bằng checklist, hình ảnh và tiếp nhận phát sinh ngoài kế hoạch.	Thi công (construction)	Xem thi công (operation.view) Tạo daily report (operation.report) Tạo issue (operation.issue_create)	Một trong: PM, QS, Giám sát, QA/QC	Có	Có
13	incoming_acceptance	Nghiệm thu Đầu Vào	Nghiệm thu thầu phụ, tổ đội và vật tư; tập hợp hồ sơ nguồn cho đề nghị chi và ghi nhận chi phí mua vật tư.	Nghiệm thu đầu vào (incoming_acceptance)	Xem nghiệm thu (acceptance.view) Tạo nghiệm thu (acceptance.create) Duyệt nghiệm thu (acceptance.approve) Xem tài chính công trình (project_finance.view) Ghi nhận chi phí vật tư (project_finance.cost_create) Lập đề nghị thu/chi (project_finance.request_create)	Một trong: QA/QC, QS, Kế toán, Giám đốc	Có	Có
14	outgoing_acceptance	Nghiệm thu Đầu Ra	Nghiệm thu công trình, tập hợp hồ sơ quyết toán và lập đề nghị thu nội bộ theo mốc hợp đồng.	Nghiệm thu (acceptance)	Xem nghiệm thu (acceptance.view) Tạo nghiệm thu (acceptance.create) Duyệt nghiệm thu (acceptance.approve) Xem tài chính công trình (project_finance.view) Lập đề nghị thu/chi (project_finance.request_create)	Một trong: QA/QC, QS, PM, Giám đốc, Kế toán	Có	Có
15	handover_finance	Kết thúc: Bàn giao + Tài chính công trình	Bàn giao công trình và xác nhận hồ sơ tài chính quản trị đã hoàn tất; nghiệp vụ kế toán chuyên môn thực hiện ngoài Consflow.	Đóng tài chính (financial_closure)	Xem bàn giao (handover.view) Duyệt bàn giao (handover.approve) Xem tài chính công trình (project_finance.view) Xem báo cáo quản trị công trình (project_finance.report_view)	Một trong: Kế toán, PM, Giám đốc	Có	Có

3. CHECKLIST / STEP THEO NODE

NODE 01 - Tiếp nhận dự án

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	project_intake.confirm	Xác nhận điểm bắt đầu và hồ sơ đầu vào	Công việc (task)	Không	Không	Không	PM, QS, Giám sát, Thiết kế

NODE 02 - Khảo sát

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	survey.client_requirements	Khảo sát yêu cầu của chủ đầu tư	Công việc (task)	Có	Không	Không	PM, Giám đốc, QS, Sale, Đội thi công, Giám sát, Thiết kế

NODE 02 - Khảo sát (tiếp theo)

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
2	survey.site_photos	Chụp và tải ảnh hiện trạng	Tải ảnh (photo_upload)	Không	Không	Có	Giám sát
3	survey.design_style	Nắm phong cách thiết kế	Công việc (task)	Có	Không	Không	Thiết kế
4	survey.dimensions	Ghi nhận kích thước chính	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, Thiết kế
5	survey.risks	Xác định rủi ro mặt bằng	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, Đội thi công
6	survey.minutes	Hoàn tất biên bản khảo sát	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	PM, Giám sát

NODE 03 - Họp báo cáo khảo sát

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	survey_review.takeoff	Bóc khối lượng cho nhánh không thiết kế	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS
2	survey_review.layout	Lên bản vẽ bố trí mặt bằng	Công việc (task)	Có	Không	Không	Thiết kế
3	survey_review.3d	Lên bản vẽ 3D	Công việc (task)	Có	Không	Không	Thiết kế
4	survey_review.construction_drawing	Lên bản vẽ thi công	Công việc (task)	Có	Không	Không	Thiết kế
5	survey_review.branch_decision	Chốt biên bản cuộc họp và nhánh xử lý	Biên bản họp (meeting_minutes)	Có	Không	Không	PM, QS, Giám sát

NODE 04 - Thiết kế

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	design.layout_3d_review	Trao đổi và hoàn thiện bản vẽ mặt bằng + 3D	Rà soát thiết kế (design_review)	Có	Không	Không	PM
2	design.construction_drawing	Trao đổi và hoàn thiện bản vẽ thi công	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	PM
3	design.client_approval	Chốt phương án với Sale và chủ đầu tư	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	PM, Chủ đầu tư
4	design.handover_to_qs	Bàn giao bản vẽ cho QS	Công việc (task)	Có	Không	Không	PM, QS

NODE 05 - BOQ (Không thiết kế)

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	boq_without_design.pricing	Lấy giá đầu vào	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, Mua hàng
2	boq_without_design.price_check	Kiểm tra đơn giá và tính hợp lý của đầu vào	Kiểm tra ngân sách (budget_check)	Có	Không	Không	QS, PM, Giám đốc
3	boq_without_design.management_norm	Review định mức quản lý	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	Giám đốc
4	boq_without_design.client_send	Gửi BOQ cho chủ đầu tư	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, PM, Giám đốc

NODE 06 - BOQ (Có thiết kế)

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	boq_with_design.client_send	Gửi BOQ cho chủ đầu tư	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, Sale, PM

NODE 07 - Chốt Hợp đồng với chủ đầu tư

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	outbound_contract.prepare	Lập báo giá và hợp đồng	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, Kế toán, Pháp lý, Mua hàng, Bộ phận HĐ, PM, Giám đốc
2	outbound_contract.review	Rà soát hợp đồng liên phòng ban	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, Kế toán, Pháp lý, Mua hàng, Bộ phận HĐ, PM, Giám đốc
3	outbound_contract.app_sign	Ký duyệt nội bộ trên App	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	QS, Kế toán, Pháp lý, Mua hàng, Bộ phận HĐ, PM, Giám đốc
4	outbound_contract.paper_dispatch	In và gửi hồ sơ giấy cho chủ đầu tư	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, Kế toán, Pháp lý, Mua hàng, Bộ phận HĐ, PM, Giám đốc
5	outbound_contract.returned_scan	Nhận lại và scan hợp đồng đã ký	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, Kế toán, Pháp lý, Mua hàng, Bộ phận HĐ, PM, Giám đốc

NODE 08 - Bóc tách và lấy giá đầu vào

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	input.takeoff	Bóc khối lượng đầu vào	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, Giám sát
2	input.price_sourcing	Mua hàng đầu vào	Kiểm tra vật tư (material_check)	Có	Không	Không	Mua hàng, QS

NODE 09 - Đàm phán giá

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	price_negotiation.complete	Đàm phán và chốt giá đầu vào	Kiểm tra ngân sách (budget_check)	Có	Không	Không	Sale, QS, PM, Giám đốc, Kế toán, Mua hàng

NODE 10 - Hợp đồng và tạm ứng đầu vào

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	input.contract_advance	Ký hợp đồng và lập hồ sơ tạm ứng đầu vào	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	Mua hàng, QS, Kế toán
2	input.review	Rà soát và kiểm tra đầu vào	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	PM, Giám đốc

NODE 11 - Kế hoạch thi công

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	planning.assignment_meeting	Họp và phân công thi công	Công việc (task)	Có	Không	Không	QS, PM, Thiết kế, QA/QC, Giám sát
2	planning.assignment_minutes	Chốt biên bản cuộc họp	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	PM, QA/QC

NODE 11 - Kế hoạch thi công (tiếp theo)

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
3	planning.client_quality_file	Lập hồ sơ chất lượng với chủ đầu tư	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QA/QC
4	planning.construction_handoff	Chốt hạng mục giám sát và bàn giao thi công	Checklist (checklist)	Có	Không	Không	PM, QA/QC, Giám sát

NODE 12 - Thi công

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	construction.item_reporting	Báo cáo liên tục trong quá trình thi công	Nhật ký thi công (daily_report)	Có	Không	Có	Giám sát

NODE 13 - Nghiệm thu Đầu Vào

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	incoming.subcontractor_acceptance	Nghiệm thu thầu phụ và tổ đội	Kiểm tra nghiệm thu (acceptance_check)	Có	Không	Không	QA/QC, QS, Giám sát
2	incoming.material_acceptance	Nghiệm thu vật tư đầu vào và đầu ra	Kiểm tra nghiệm thu (acceptance_check)	Có	Không	Không	QA/QC, QS
3	incoming.quantity_file	Lập hồ sơ kiểm tra khối lượng thầu phụ	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS
4	incoming.quantity_review	Rà soát và kiểm tra hồ sơ khối lượng thầu phụ	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	Giám đốc
5	incoming.payment_request	Lập hồ sơ đề nghị chi thầu phụ	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	QS, Kế toán
6	incoming.payment_approval	Duyệt đề nghị chi	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	Giám đốc
7	incoming.payment_check	Kiểm tra hồ sơ đề nghị chi	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán
8	incoming.accounting_handover	Bàn giao hồ sơ chi cho Kế toán	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán

NODE 14 - Nghiệm thu Đầu Ra

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	outgoing.acceptance_signoff	Nghiệm thu và ký duyệt công trình	Kiểm tra nghiệm thu (acceptance_check)	Có	Không	Không	QA/QC, QS, PM, Giám đốc
2	outgoing.file_signoff	Ký duyệt hồ sơ nghiệm thu	Phê duyệt (approval)	Có	Không	Không	Giám đốc
3	outgoing.collection_request	Lập hồ sơ đề nghị thu từ chủ đầu tư	Tải tài liệu (document_upload)	Có	Có	Không	Kế toán, QS, PM, Giám đốc
4	outgoing.invoice_handover	Bàn giao hồ sơ phát hành hóa đơn đầu ra	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán
5	outgoing.collection_tracking	Theo dõi hồ sơ thu theo kỳ	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán

NODE 15 - Kết thúc: Bàn giao + Tài chính công trình

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
1	closure.material_cost	Ghi nhận chi phí mua vật tư công trình	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán

NODE 15 - Kết thúc: Bàn giao + Tài chính công trình (tiếp theo)

STT	Business code	Tên	Loại	Checklist	Tài liệu	Hình ảnh	Role phụ trách
2	closure.finance_confirm	Xác nhận hoàn tất hồ sơ tài chính quản trị	Kiểm tra kế toán (accounting_check)	Có	Không	Không	Kế toán, Giám đốc

PHỤ LỤC A - ĐỐI CHIẾU ĐÁNH SỐ CLIENT -> REV4

Client	Rev4	Business code	Node hiện tại	Ghi chú
Node 1	02	survey	Khảo sát	Khảo sát
Node 2	03	survey_review	Họp báo cáo khảo sát	Họp báo cáo khảo sát
Node 3	04	design	Thiết kế	Thiết kế
Node 4	05	boq_without_design	BOQ (Không thiết kế)	BOQ không thiết kế
Node 5	06	boq_with_design	BOQ (Có thiết kế)	BOQ có thiết kế
Node 6	08	input_takeoff_purchase	Bóc tách và lấy giá đầu vào	Bóc tách và lấy giá đầu vào
Node 6	10	input_contract_advance	Hợp đồng và tạm ứng đầu vào	Hợp đồng và tạm ứng đầu vào
Node 7	09	price_negotiation	Đàm phán giá	Đàm phán giá
Node 8	07	outbound_contract	Chốt Hợp đồng với chủ đầu tư	Chốt hợp đồng với chủ đầu tư
Node 9	11	construction_planning	Kế hoạch thi công	Kế hoạch thi công
Node 10	12	construction_execution	Thi công	Thi công
Node 11	13	incoming_acceptance	Nghiệm thu Đầu Vào	Nghiệm thu đầu vào
Node 12	14	outgoing_acceptance	Nghiệm thu Đầu Ra	Nghiệm thu đầu ra
Node 13	15	handover_finance	Kết thúc: Bàn giao + Tài chính công trình	Bàn giao và tài chính công trình
